Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
25	**OGRZEWANIE**	**21 175,56 zł**	**pon, 03.12.18**	**pią, 29.03.19**
28	**WOD-KAN**	**61 379,70 zł**	**pon, 03.12.18**	**pią, 08.02.19**
29	Wod-Kan Skrzydło A	21 482,90 zł	pon, 03.12.18	pią, 08.02.19
30	Wod-Kan Skrzydło B	39 896,80 zł	pon, 03.12.18	pią, 18.01.19
31	**WENTYLACJA**	**343 244,51 zł**	**pon, 17.12.18**	**wto, 30.04.19**
32	Przewody wentylacyjne Skrzydło A	116 235,48 zł	pon, 17.12.18	czw, 31.01.19
33	Przewody wentylacyjne Skrzydło B	116 235,48 zł	pon, 24.12.18	czw, 07.02.19
34	Anemostaty, kratki wentylacyjne	21 774,96 zł	pon, 25.02.19	pią, 15.03.19
35	Klapa ogniowe, przepustnice, tłumiki, nawiewniki okienne, klapy ogniowe wraz z próbami szczelności	88 998,59 zł	pon, 21.01.19	wto, 30.04.19
36	**KLIMATYZACJA**	**469 876,80 zł**	**pon, 17.12.18**	**czw, 30.05.19**
37	Montaż jednostek wew i zewnętrznych klimatyzatorów, klimakonwektorów wraz z uruchomieniem	320 109,97 zł	pon, 18.02.19	czw, 30.05.19
38	dostawa Agregat chłodniczy zewnętrzny + Klimatyzator wewnętrzny	48 830,07 zł	pon, 25.02.19	śro, 22.05.19
39	Orurowanie wraz z izolacją	100 936,76 zł	pon, 17.12.18	pon, 25.02.19
40	**BRANŻA ELEKTRYCZNA**	**255 501,27 zł**	**pon, 19.11.18**	**pią, 17.05.19**
41	Rozbudowa istniejącej TG	1 795,69 zł	pon, 04.02.19	śro, 27.03.19
43	**Tablice bezpiecznikowe lokalne**	**19 701,46 zł**	**pon, 17.12.18**	**czw, 28.03.19**
44	Tablice bezpiecznikowe lokalne - Skrzydło A	7 880,59 zł	pon, 17.12.18	czw, 28.03.19
45	Tablice bezpiecznikowe lokalne - Skrzydło B	11 820,87 zł	pon, 17.12.18	czw, 28.03.19
46	**Instalacja oświetleniowa**	**176 228,45 zł**	**pon, 19.11.18**	**pią, 17.05.19**
47	Ułożenie przewodów w wykutych bruzdach, montaż puszek-Skrzydło A	13 675,73 zł	pon, 19.11.18	czw, 28.02.19
48	Ułożenie przewodów w wykutych bruzdach, montaż puszek-Skrzydło B	25 397,80 zł	pon, 26.11.18	sob, 22.12.18
49	Montaż opraw oświetleniowych Skrzydło A	54 861,97 zł	pon, 19.11.18	pią, 19.04.19
50	Montaż opraw oświetleniowych Skrzydło B	82 292,95 zł	pon, 04.03.19	pią, 17.05.19
51	**Instalacja siły + WLZ tablic lokalnych**	**48 586,35 zł**	**pon, 19.11.18**	**pią, 29.03.19**
52	Przewody wtynkowe układane w bruzdach, montaż puszek	35 864,51 zł	pon, 26.11.18	pią, 28.12.18
53	Montaż instalacji do paneli przyłużkowych	12 721,84 zł	śro, 27.02.19	śro, 27.02.19
54	**Pomiary**	**9 189,32 zł**	**pon, 25.02.19**	**wto, 30.04.19**
56	**WYPOSAŻENIE STAŁE**	**37 733,18 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 24.05.19**
57	1. BIAŁY MONTAŻ	11 147,93 zł	pon, 04.03.19	pią, 26.04.19
59	2. AKCESORIA SANITARNE	16 445,25 zł	pon, 11.03.19	pią, 26.04.19
61	3. ROLETY WEWNĘTRZNE	10 140,00 zł	pon, 01.04.19	pią, 24.05.19

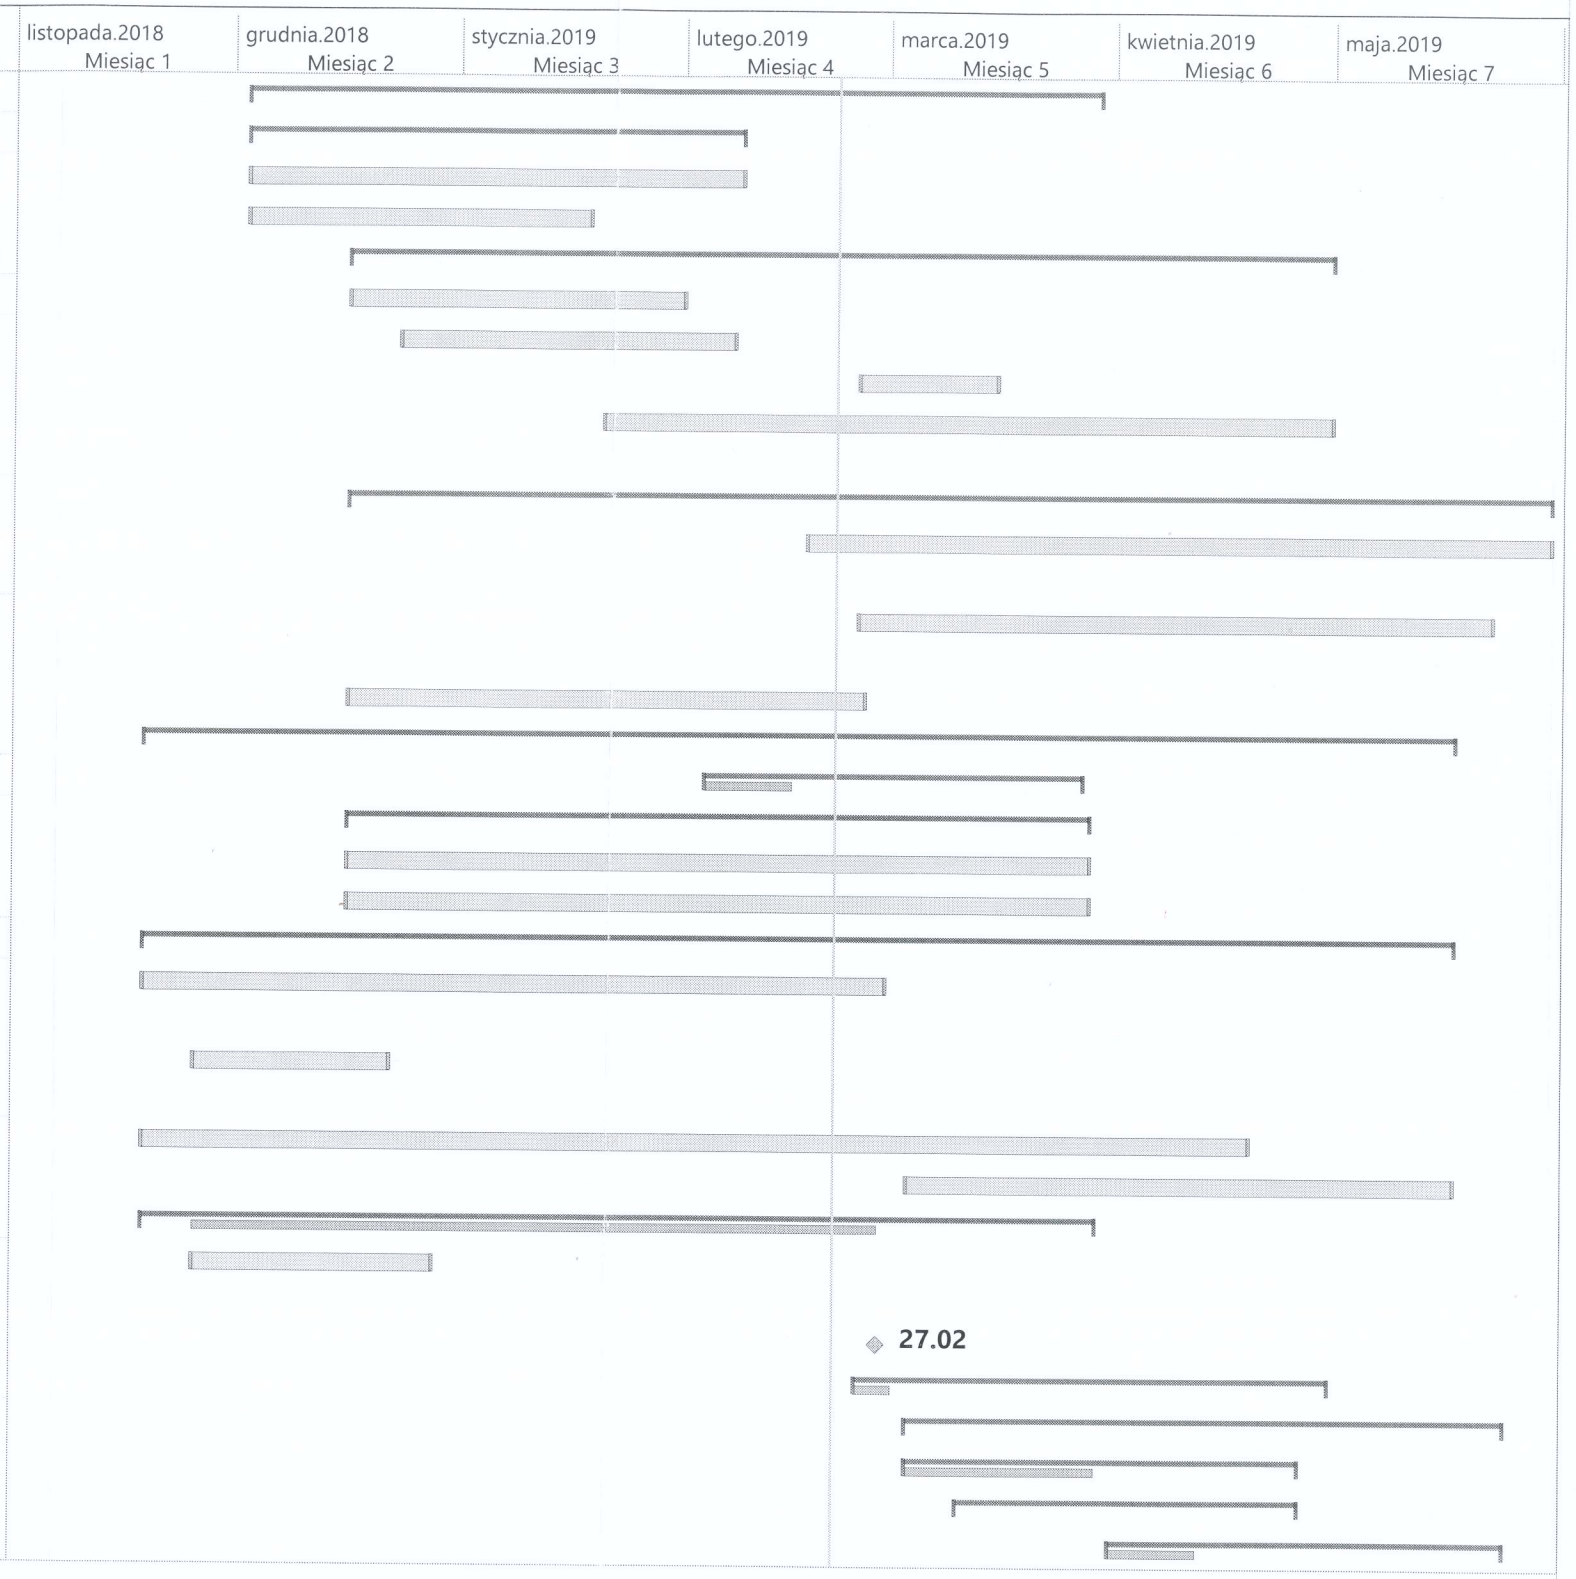

Projekt: Etap I - NETTO

Zadanie
Podział
Punkt kontrolny
Podsumowanie
Podsumowanie projektu
Zadanie nieaktywne
Nieaktywny punkt kontrolny
Podsumowanie nieaktywne
Zadanie ręczne
Tylko z czasem trwania
Rzutowanie podsumowania ręcznego
Podsumowanie ręczne
Tylko z rozpoczęciem
Tylko z zakończeniem
Zadania zewnętrzne
Zewnętrzne punkty kontrolne
Termin ostateczny
Postęp
Ręczne (postęp)

Wicepre arządu
Dyrektor arządzający
Jolanta Mitręga

SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji
inż. Wojciech Kandera
upr. bud. KL-105/86

PROJEKTOR
ds. instalacyjnych

ZAŁĄCZNIK NR. 3 - TABELA RYCZAŁTOWA ROBÓT ETAP II

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY ROBÓT

„ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGOWYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU UJK W KIELCACH"

Lp.	Wyszczególnienie robót	wartość wg umowy netto (zł)	wartość wg umowy brutto (zł)	lis.18	gru.18	sty.19	lut.19	mar.19	kwi.19	maj.19	cze.19	lip.19	sie.19	wrz.19	paź.19	lis.19	gru.19	sty.20	lut.20	mar.20	kwi.20	maj.20	cze.20
	ETAP II - SUMA	**18 976 602,47 zł**	**23 341 221,04 zł**																				
I	**BRANŻA BUDOWLANA**																						
I.1	**PLAC BUDOWY**																						
I.1.1	Organizacja placu budowy	15 000,00 zł	18 450,00 zł		7 500,00 zł																		
I.1.2	Monitronig drgań	35 000,00 zł	43 050,00 zł			7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł												7 500,00 zł	
I.1.3	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy	480 388,50 zł	590 877,86 zł		26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	
I.1.4	Dzierżawa, montaż i praca żurawia wieżowego	450 000,00 zł	553 500,00 zł			75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł												
I.2	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO (SALA GIMNASTYCZNA, MAGAZYN, SZATNIE, WC I ŁAZIENKA)**																						
I.2.1	Rozbiórka wraz z utylizacją gruzu budynku Sali gimnastycznej oraz wiaty śmietnikowej	76 693,85 zł	94 333,44 zł	76 693,85 zł																			
I.2.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KANAŁ WENTYLACYJNY WRAZ Z CZERPNIĄ TERENOWĄ	7 801,51 zł	9 595,86 zł		7 801,51 zł																		
I.2.3	ROZBIÓRKA ISTNIEJACEGO DACHU W SKRZYDLE B	137 128,16 zł	168 667,64 zł					137 128,16 zł															
I.2.4	ROZBIÓRKA ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ SKRZYDŁA B	4 626,36 zł	5 690,42 zł					4 626,36 zł															
I.3	**ROBOTY ZIEMNE**																						
I.3.1	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW I KRZEWÓW	8 000,00 zł	9 840,00 zł		8 000,00 zł																		
I.3.2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 8 cm. krawężników, murów ogrodzeniowych	46 525,36 zł	57 226,19 zł		46 525,36 zł																		
I.3.3	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś A-D/1-do skrzydła A i B	154 316,88 zł	189 809,76 zł		154 316,88 zł																		
I.3.4	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś D-H/1- 4	154 616,88 zł	190 178,76 zł			154 616,88 zł																	
I.3.5	Zasypywanie wykopów w gruncie kat. IV	33 192,56 zł	40 826,85 zł				33 192,56 zł																
I.4	**FUNDAMENTY**																						
I.4.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10	41 987,45 zł	51 644,56 zł			41 987,45 zł																	
I.4.2	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, Skrzydło C	360 987,45 zł	444 014,56 zł			360 987,45 zł																	
I.4.3	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PŁYTA ŁĄCZNIKA	577 000,00 zł	709 710,00 zł			577 000,00 zł																	
I.4.4	Ściany żelbetowe piwnic	550 000,00 zł	676 500,00 zł				550 000,00 zł																
I.4.5	Płyta stropowa nad piwnicą Łącznika	256 111,97 zł	315 017,72 zł				256 111,97 zł																
I.4.6	IZOLACJE FUNDAMNETÓW I SCIAN PODZIEMIA	223 342,95 zł	274 711,83 zł				223 342,95 zł																
I.5	**Ściany murowane - ZEWNĘTRZNE BUDYNKU**																						
I.5.1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 0	35 007,16 zł	43 058,81 zł					35 007,16 zł															
I.5.2	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 1	35 007,16 zł	43 058,81 zł						35 007,16 zł														
I.5.3	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 2	35 007,16 zł	43 058,81 zł							35 007,16 zł													
I.5.4	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 3	35 007,17 zł	43 058,82 zł								35 007,17 zł												
I.5.5	Ściany murowane ZEWNĘTRZNE - NADBUDOWY BUDYNKU B	63 666,25 zł	78 309,49 zł								63 666,25 zł												
I.6	**Konstrukcje żelbetowe monolityczne**																						
I.6.1	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 0	165 462,42 zł	203 518,78 zł					165 462,42 zł															
I.6.2	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 1	165 462,43 zł	203 518,79 zł						165 462,43 zł														
I.6.3	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 2	165 462,43 zł	203 518,79 zł							165 462,43 zł													
I.6.4	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 3	165 462,43 zł	203 518,79 zł								165 462,43 zł												
I.6.5	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Nadbudowa B	165 462,43 zł	203 518,79 zł																				
I.6.6	Płyta stropowa nad kondygnacją 0	126 813,80 zł	155 980,97 zł					126 813,80 zł															
I.6.7	Płyta stropowa nad kondygnacją 1	126 813,80 zł	155 980,97 zł						126 813,80 zł														
I.6.8	Płyta stropowa nad kondygnacją 2	126 813,80 zł	155 980,97 zł							126 813,80 zł													
I.6.9	Płyta stropowa nad kondygnacją 3	126 813,80 zł	155 980,97 zł								126 813,80 zł												
I.6.10	Płyta stropowa nad kondygnacją nadbudowy - budynek B	126 813,43 zł	155 980,52 zł																				
I.7	**ŚCIANY DZIAŁOWE**																						
I.7.1	Ścianki działowe Poziom 0	64 952,50 zł	79 891,58 zł							64 952,50 zł													
I.7.2	Ścianki działowe Poziom 1	64 952,50 zł	79 891,58 zł							64 952,50 zł													
I.7.3	Ścianki działowe Poziom 2	64 952,50 zł	79 891,58 zł								64 952,50 zł												
I.7.4	Ścianki działowe Poziom 3	64 952,47 zł	79 891,54 zł																				
I.7.5	Ścianki działowe - BUDYNEK B NADBUDOWA	100 681,95 zł	123 838,80 zł																				
I.8	**OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE**																						
I.8.1	Poziom 0	196 000,00 zł	241 080,00 zł																				
I.8.2	Poziom 1	196 000,00 zł	241 080,00 zł																				
I.8.3	Poziom 2	196 000,00 zł	241 080,00 zł																				
I.8.4	Poziom 3	196 000,00 zł	241 080,00 zł																				
I.8.5	Poziom Nadbudowa B	198 000,00 zł	243 540,00 zł																				
I.9	**OKNA I DRZWI WEWNĘTRZNE**																						
I.9.1	Poziom -1	11 447,11 zł	14 079,95 zł																				
I.9.2	Poziom 0	58 018,20 zł	71 362,39 zł																				
I.9.3	Poziom 1	58 018,20 zł	71 362,39 zł																				
I.9.4	Poziom 2	58 018,20 zł	71 362,39 zł																				
I.9.5	Poziom 3	58 018,20 zł	71 362,39 zł																				
I.9.6	Poziom Nadbudowa B	65 049,00 zł	80 010,27 zł																				
I.10	**DACH - POKRYCIE Budynek B**																						
I.10.1	Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	111 354,07 zł	136 965,51 zł																				
I.10.2	Wykonanie papy nawierzchniowej	47 000,00 zł	57 810,00 zł																				
I.10.3	Obróbka papą kominków i attyk	13 000,00 zł	15 990,00 zł																				
I.10.4	Obróbki stalowe attyk i kominków	8 000,00 zł	9 840,00 zł																				
I.11	**DACH - POKRYCIE Budynek C**																						
I.11.1	Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	96 619,98 zł	118 842,58 zł																				
I.11.2	Wykonanie papy nawierzchniowej	32 000,00 zł	39 360,00 zł																				
I.11.3	Obróbka papą kominków i attyk	9 000,00 zł	11 070,00 zł																				
I.11.4	Obróbki stalowe attyk i kominków	6 000,00 zł	7 380,00 zł																				
I.12	**REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU A**																						
I.12.1	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie dachu wodą zimną - silne zanieczyszczenie	7 119,95 zł	8 757,54 zł					7 119,95 zł															
I.12.2	Dwukrotne malowanie grunto-emalią akrylową uprzednio oczyszczonej powierzchni	29 602,35 zł	36 410,89 zł						29 602,35 zł														
I.12.3	ZADASZENIE AGREGATU PRADOTWÓRCZEGO	11 000,00 zł	13 530,00 zł																				
I.12.4	OBRÓBKA ZADASZENIA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ	17 529,70 zł	21 561,53 zł																				
I.13	**Elewacja - Skrzydło A**																						
I.13.1	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja południowa	155 000,00 zł	190 650,00 zł					155 000,00 zł															
I.13.2	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja północna	155 000,00 zł	190 650,00 zł						155 000,00 zł														
I.13.3	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja zachodnia	40 000,00 zł	49 200,00 zł						40 000,00 zł														
I.13.4	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja wschodnia	40 000,00 zł	49 200,00 zł					40 000,00 zł															
I.13.5	Wykonanie tynku strukturalnego	45 000,00 zł	55 350,00 zł						45 000,00 zł														
I.13.6	Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, zadaszenia nad wejściem do Skrzydła A	169 620,13 zł	208 632,76 zł					169 620,13 zł															
I.14	**Elewacja - SKRZYDŁO B**																						
I.14.1	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja południowa	110 000,00 zł	135 300,00 zł								110 000,00 zł												
I.14.2	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja północna	110 000,00 zł	135 300,00 zł									110 000,00 zł											
I.14.3	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja zachodnia	43 000,00 zł	52 890,00 zł									43 000,00 zł											
I.14.4	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja wschodnia	43 000,00 zł	52 890,00 zł																				
I.14.5	Wykonanie tynku strukturalnego - Segment C	63 000,00 zł	77 490,00 zł								43 000,00 zł												
I.14.6	Podkonstrukcja pod elewację z blachy panelowej	100 000,00 zł	123 000,00 zł									63 000,00 zł											
I.14.7	Elewacja z blachy panelowej	114 078,34 zł	140 316,36 zł								100 000,00 zł												
15	**Elewacja - Skrzydło C**											114 078,34 zł											
15.1	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą	350 000,00 zł	430 500,00 zł									350 000,00 zł											
15.2	Wykonanie tynku strukturalnego	50 000,00 zł	61 500,00 zł									50 000,00 zł											
15.3	Montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod blachy cięto-ciegnionej	55 000,00 zł	67 650,00 zł									55 000,00 zł											
15.4	Montaż blachy cieto-ciagnionej	115 000,00 zł	141 450,00 zł																				
16	**TYNKI WEWNĘTRZNE**																						
16.1	Tynki wewnętrzne - Poziom 0	61 885,54 zł	76 119,21 zł																				
16.2	Tynki wewnętrzne - Poziom 1	61 885,54 zł	76 119,21 zł																				
16.3	Tynki wewnętrzne - Poziom 2	61 885,54 zł	76 119,21 zł																				
16.4	Tynki wewnętrzne - Poziom 3	61 885,54 zł	76 119,21 zł																				
16.5	Tynki wewnętrzne - Nadbudowa B	61 885,54 zł	76 119,21 zł																				

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
Iolanta Mitręga

PROJEKTOR
ds. medycznych
prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

Firma Budowlana
ANNA - BUD Sp. z o. o.
Bilcza, ul. Bukowa 2 B 26-026 Morawica
tel./fax 41 311-75-50
NIP 657-291-18-69, REGON 260727798

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	**ETAP II**	**18 976 602,47 zł**	**czw, 08.11.18**	**pią, 26.06.20**
2	**BRANŻA BUDOWLANA**	**12 806 518,14 zł**	**czw, 08.11.18**	**pią, 29.05.20**
3	**PLAC BUDOWY**	**980 388,50 zł**	**czw, 08.11.18**	**pią, 29.05.20**
4	Organizacja placu budowy	15 000,00 zł	czw, 08.11.18	pią, 29.05.20
5	Monitoring drgań	35 000,00 zł	pon, 07.01.19	pią, 31.05.19
6	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy	480 388,50 zł	czw, 08.11.18	pią, 29.05.20
7	Dzierżąwa, montaż i praca żurawia wieżowego	450 000,00 zł	pon, 07.01.19	sob, 29.06.19
8	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**	**226 249,88 zł**	**śro, 21.11.18**	**pią, 22.03.19**
9	Rozbiórka wraz z utylizacją gruzu budynku Sali gimnastycznej oraz wiaty śmietnikowej	76 693,85 zł	śro, 21.11.18	pią, 30.11.18
10	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KANAŁ WENTYLACYJNY WRAZ Z CZERPNIĄ TERENOWĄ	7 801,51 zł	pon, 03.12.18	pią, 14.12.18
15	ROZBIÓRKA ISTNIEJACEGO DACHU W SKRZYDLE B	137 128,16 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19
26	ROZBIÓRKA ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ SKRZYDŁA B	4 626,36 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19
32	**ROBOTY ZIEMNE**	**396 651,68 zł**	**pon, 26.11.18**	**pią, 22.02.19**
33	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW I KRZEWÓW	8 000,00 zł	pon, 17.12.18	pią, 28.12.18
34	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 8 cm, krawężników, murów ogrodzeniowych	46 525,36 zł	pon, 03.12.18	pią, 14.12.18
35	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś A-D/1-do skrzydła A i B	154 316,88 zł	pon, 26.11.18	pią, 07.12.18
36	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś D-H/1-4	154 616,88 zł	pon, 03.12.18	pią, 11.01.19
37	Zasypywanie wykopów w gruncie kat. IV	33 192,56 zł	pon, 14.01.19	pią, 22.02.19
38	**FUNDAMENTY**	**2 009 429,82 zł**	**śro, 05.12.18**	**czw, 28.02.19**
39	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10	41 987,45 zł	śro, 05.12.18	pią, 11.01.19
40	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, Skrzydło C	360 987,45 zł	pon, 07.01.19	czw, 31.01.19
41	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PŁYTA ŁĄCZNIKA	577 000,00 zł	pon, 17.12.18	pią, 11.01.19
42	Ściany żelbetowe piwnic	550 000,00 zł	pon, 14.01.19	pią, 01.02.19
43	Płyta stropowa nad piwnicą Łącznika	256 111,97 zł	pon, 04.02.19	czw, 28.02.19
44	IZOLACJE FUNDAMNETÓW I ŚCIAN PODZIEMIA	223 342,95 zł	pon, 04.02.19	pią, 15.02.19
72	**KONSTRUKCJE NADZIEMIA WYKONYWANE KOMPLEKSOWO**	**3 316 136,50 zł**	**pon, 04.03.19**	**śro, 13.11.19**
73	**Ściany murowane - ZEWNĘTRZNE BUDYNKU**	**203 694,90 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 07.06.19**
74	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 0	35 007,16 zł	pon, 04.03.19	pią, 15.03.19
75	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 1	35 007,16 zł	pon, 01.04.19	pią, 12.04.19
76	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 2	35 007,16 zł	pon, 29.04.19	sob, 11.05.19
77	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 3	35 007,17 zł	pon, 27.05.19	pią, 07.06.19
78	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Nadbudowa B	63 666,25 zł	pon, 27.05.19	pią, 07.06.19
79	**Konstrukcje żelbetowe monolityczne**	**1 461 380,77 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.06.19**
80	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 0	165 462,42 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19
81	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 1	165 462,43 zł	pon, 01.04.19	pią, 19.04.19
82	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 2	165 462,43 zł	pon, 29.04.19	pią, 17.05.19
83	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 3	165 462,43 zł	pon, 27.05.19	pią, 14.06.19
84	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Nadbudowa B	165 462,43 zł	pon, 01.04.19	pią, 10.05.19
85	Płyta stropowa nad kondygnacją 0	126 813,80 zł	pon, 25.03.19	pią, 29.03.19
86	Płyta stropowa nad kondygnacją 1	126 813,80 zł	pon, 22.04.19	pią, 26.04.19
87	Płyta stropowa nad kondygnacją 2	126 813,80 zł	pon, 20.05.19	sob, 25.05.19
88	Płyta stropowa nad kondygnacją 3	126 813,80 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
89	Płyta stropowa nad kondygnacją nadbudowy - budynek B	126 813,43 zł	pon, 13.05.19	pią, 24.05.19
90	**ŚCIANY DZIAŁOWE**	**360 491,92 zł**	**pon, 22.04.19**	**pią, 26.07.19**
91	Ścianki działowe Poziom 0	64 952,50 zł	pon, 22.04.19	pią, 03.05.19
92	Ścianki działowe Poziom 1	64 952,50 zł	pon, 20.05.19	pią, 31.05.19
93	Ścianki działowe Poziom 2	64 952,50 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
94	Ścianki działowe Poziom 3	64 952,47 zł	pon, 15.07.19	pią, 26.07.19
95	Ścianki działowe Nadbudowa B	100 681,95 zł	pon, 15.07.19	pią, 26.07.19
96	**OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE**	**982 000,00 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 28.06.19**
97	Poziom 0	196 000,00 zł	pon, 06.05.19	pią, 17.05.19
98	Poziom 1	196 000,00 zł	śro, 08.05.19	wto, 21.05.19
99	Poziom 2	196 000,00 zł	śro, 22.05.19	wto, 04.06.19
100	Poziom 3	196 000,00 zł	pon, 03.06.19	pią, 14.06.19
101	Poziom Nadbudowa B	198 000,00 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
102	**OKNA I DRZWI WEWNĘTRZNE**	**308 568,91 zł**	**pon, 07.10.19**	**śro, 13.11.19**
103	Poziom -1	11 447,11 zł	pon, 07.10.19	pią, 11.10.19
104	Poziom 0	58 018,20 zł	śro, 09.10.19	pią, 18.10.19
105	Poziom 1	58 018,20 zł	pon, 14.10.19	śro, 23.10.19
106	Poziom 2	58 018,20 zł	pon, 21.10.19	śro, 30.10.19
107	Poziom 3	58 018,20 zł	pon, 28.10.19	śro, 06.11.19

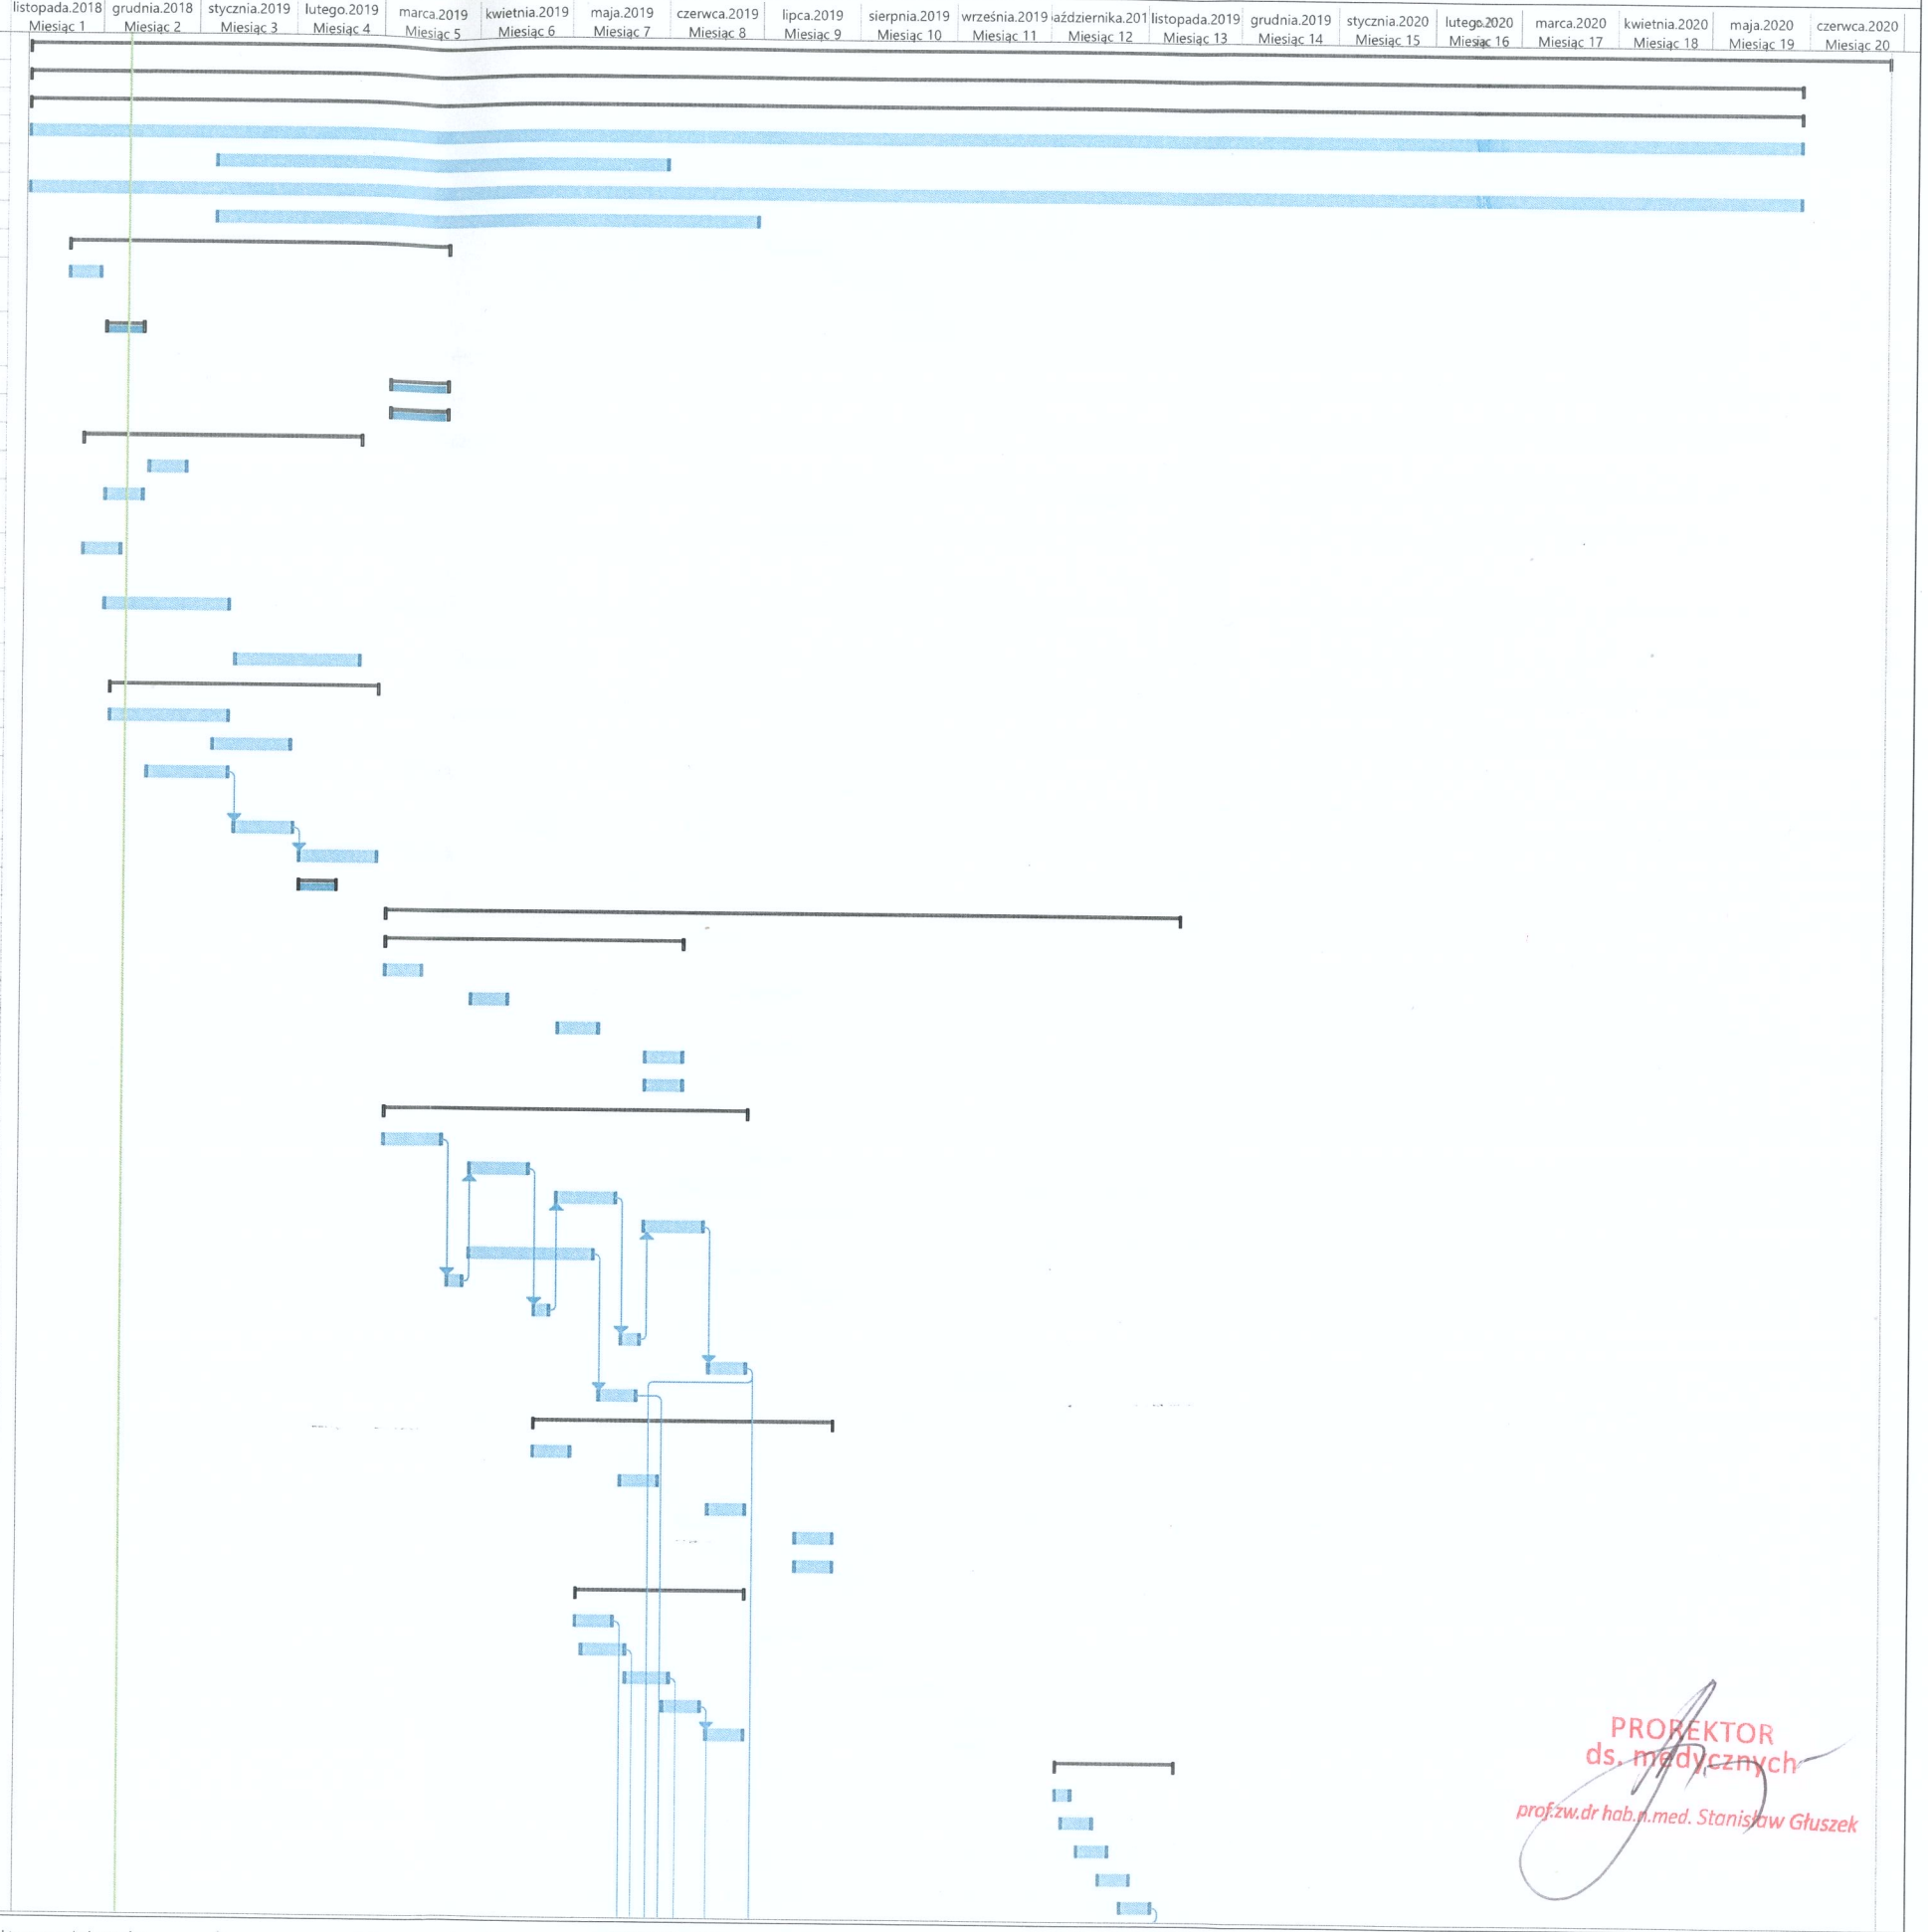

PROJEKTOR
ds. medycznych
prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

Projekt: Etap II - NETTO

Zadanie · Podział · Punkt kontrolny · Podsumowanie · Podsumowanie projektu · Zadanie nieaktywne · Nieaktywny punkt kontrolny · Podsumowanie nieaktywne · Zadanie ręczne · Tylko z czasem trwania · Rzutowanie podsumowania ręcznego · Podsumowanie ręczne · Tylko z rozpoczęciem · Tylko z zakończeniem · Zadania zewnętrzne · Zewnętrzne punkty kontrolne · Termin ostateczny · Postęp · Ręczne (postęp)

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
108	Poziom Nadbudowa B	65 049,00 zł	pon, 04.11.19	śro, 13.11.19
109	**DACH - POKRYCIE Budynek B**	**179 354,07 zł**	**pon, 03.06.19**	**pią, 02.08.19**
110	Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	111 354,07 zł	pon, 03.06.19	pią, 21.06.19
111	Wykonanie papy nawierzchniowej	47 000,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 05.07.19
112	Obróbka papą kominków i attyk	13 000,00 zł	pon, 08.07.19	pią, 19.07.19
113	Obróbki stalowe attyk i kominków	8 000,00 zł	pon, 22.07.19	pią, 02.08.19
114	**DACH - POKRYCIE Budynek C**	**143 619,98 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 30.08.19**
115	Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	96 619,98 zł	pon, 01.07.19	pią, 19.07.19
116	Wykonanie papy nawierzchniowej	32 000,00 zł	pon, 22.07.19	pią, 09.08.19
117	Obróbka papą kominków i attyk	9 000,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 23.08.19
118	Obróbki stalowe attyk i kominków	6 000,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 30.08.19
119	**REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU A**	**36 722,30 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 05.04.19**
120	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie dachu wodą zimną - silne zanieczyszczenie	7 119,95 zł	pon, 04.03.19	pią, 15.03.19
121	Dwukrotne malowanie grunto-emalią akrylową uprzednio oczyszczonej powierzchni - praca na wysokości 10-20 m	29 602,35 zł	pon, 18.03.19	pią, 05.04.19
122	ZADASZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	11 000,00 zł	pon, 07.10.19	pią, 25.10.19
124	OBRÓBKA ZADASZENIA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ SKRZYDŁA B wg. rys. A-89	17 529,70 zł	pon, 01.07.19	pią, 26.07.19
132	**Elewacja - Skrzydło A**	**604 620,13 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 26.04.19**
133	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja południowa	155 000,00 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19
134	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja północna	155 000,00 zł	pon, 25.03.19	pią, 12.04.19
135	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja zachodnia	40 000,00 zł	pon, 25.03.19	pią, 12.04.19
136	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja wschodnia	40 000,00 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19
137	Wykonanie tynku strukturalnego	45 000,00 zł	pon, 15.04.19	pią, 26.04.19
138	Konstrukcja podparć, zawieszeń i osłon zadaszenia nad wejściem do Skrzydła A	169 620,13 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19
139	**Elewacja - SKRZYDŁO B**	**583 078,34 zł**	**pon, 03.06.19**	**pią, 26.07.19**
140	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja południowa	110 000,00 zł	pon, 03.06.19	pią, 21.06.19
141	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja północna	110 000,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
142	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja zachodnia	43 000,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
143	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja wschodnia	43 000,00 zł	pon, 03.06.19	pią, 21.06.19
144	Wykonanie tynku strukturalnego - Segment C	63 000,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
145	Podkonstrukcja pod elewację z blachy panelowej	100 000,00 zł	pon, 03.06.19	pią, 28.06.19
146	Elewacja z blachy panelowej	114 078,34 zł	pon, 01.07.19	pią, 26.07.19
147	**Elewacja - Skrzydło C**	**570 000,00 zł**	**pon, 17.06.19**	**pią, 20.09.19**
148	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Segment C	350 000,00 zł	pon, 17.06.19	pią, 12.07.19
149	Wykonanie tynku strukturalnego - Segment C	50 000,00 zł	pon, 15.07.19	pią, 26.07.19
150	Montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod blachy cięto-cięgnionej	55 000,00 zł	czw, 27.06.19	śro, 03.07.19
151	Montaż blachy cieto-ciagnionej	115 000,00 zł	pon, 02.09.19	pią, 20.09.19
152	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	**3 197 431,24 zł**	**pon, 20.05.19**	**wto, 19.05.20**
153	**TYNKI WEWNĘTRZNE**	**309 427,70 zł**	**pon, 20.05.19**	**pią, 02.08.19**
154	Tynki wewnętrzne - Poziom 0	61 885,54 zł	pon, 20.05.19	pią, 31.05.19
155	Tynki wewnętrzne - Poziom 1	61 885,54 zł	śro, 22.05.19	wto, 04.06.19
156	Tynki wewnętrzne - Poziom 2	61 885,54 zł	śro, 05.06.19	wto, 18.06.19
157	Tynki wewnętrzne - Poziom 3	61 885,54 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
158	Tynki wewnętrzne - Nadbudowa B	61 885,54 zł	pon, 22.07.19	pią, 02.08.19
159	**OBLICOWANIA ŚCIAN Z PŁYTEK**	**238 306,23 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 13.09.19**
160	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Poziom 0	47 661,23 zł	pon, 01.07.19	pią, 19.07.19
161	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Poziom 1	47 661,25 zł	pon, 22.07.19	pią, 09.08.19
162	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Poziom 2	47 661,25 zł	pon, 12.08.19	pią, 30.08.19
163	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Poziom 3	47 661,25 zł	pon, 02.09.19	pią, 13.09.19
164	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Nadbudowa B	47 661,25 zł	pon, 02.09.19	pią, 13.09.19
165	**Posadzki cementowe**	**362 303,78 zł**	**pon, 03.06.19**	**pią, 30.08.19**
166	Poziom -1	15 000,00 zł	pon, 03.06.19	pią, 07.06.19
167	Poziom 0	45 620,00 zł	pon, 10.06.19	śro, 19.06.19
168	Poziom 1	45 620,00 zł	pon, 24.06.19	śro, 03.07.19
169	Poziom 2	45 620,00 zł	czw, 04.07.19	pon, 15.07.19

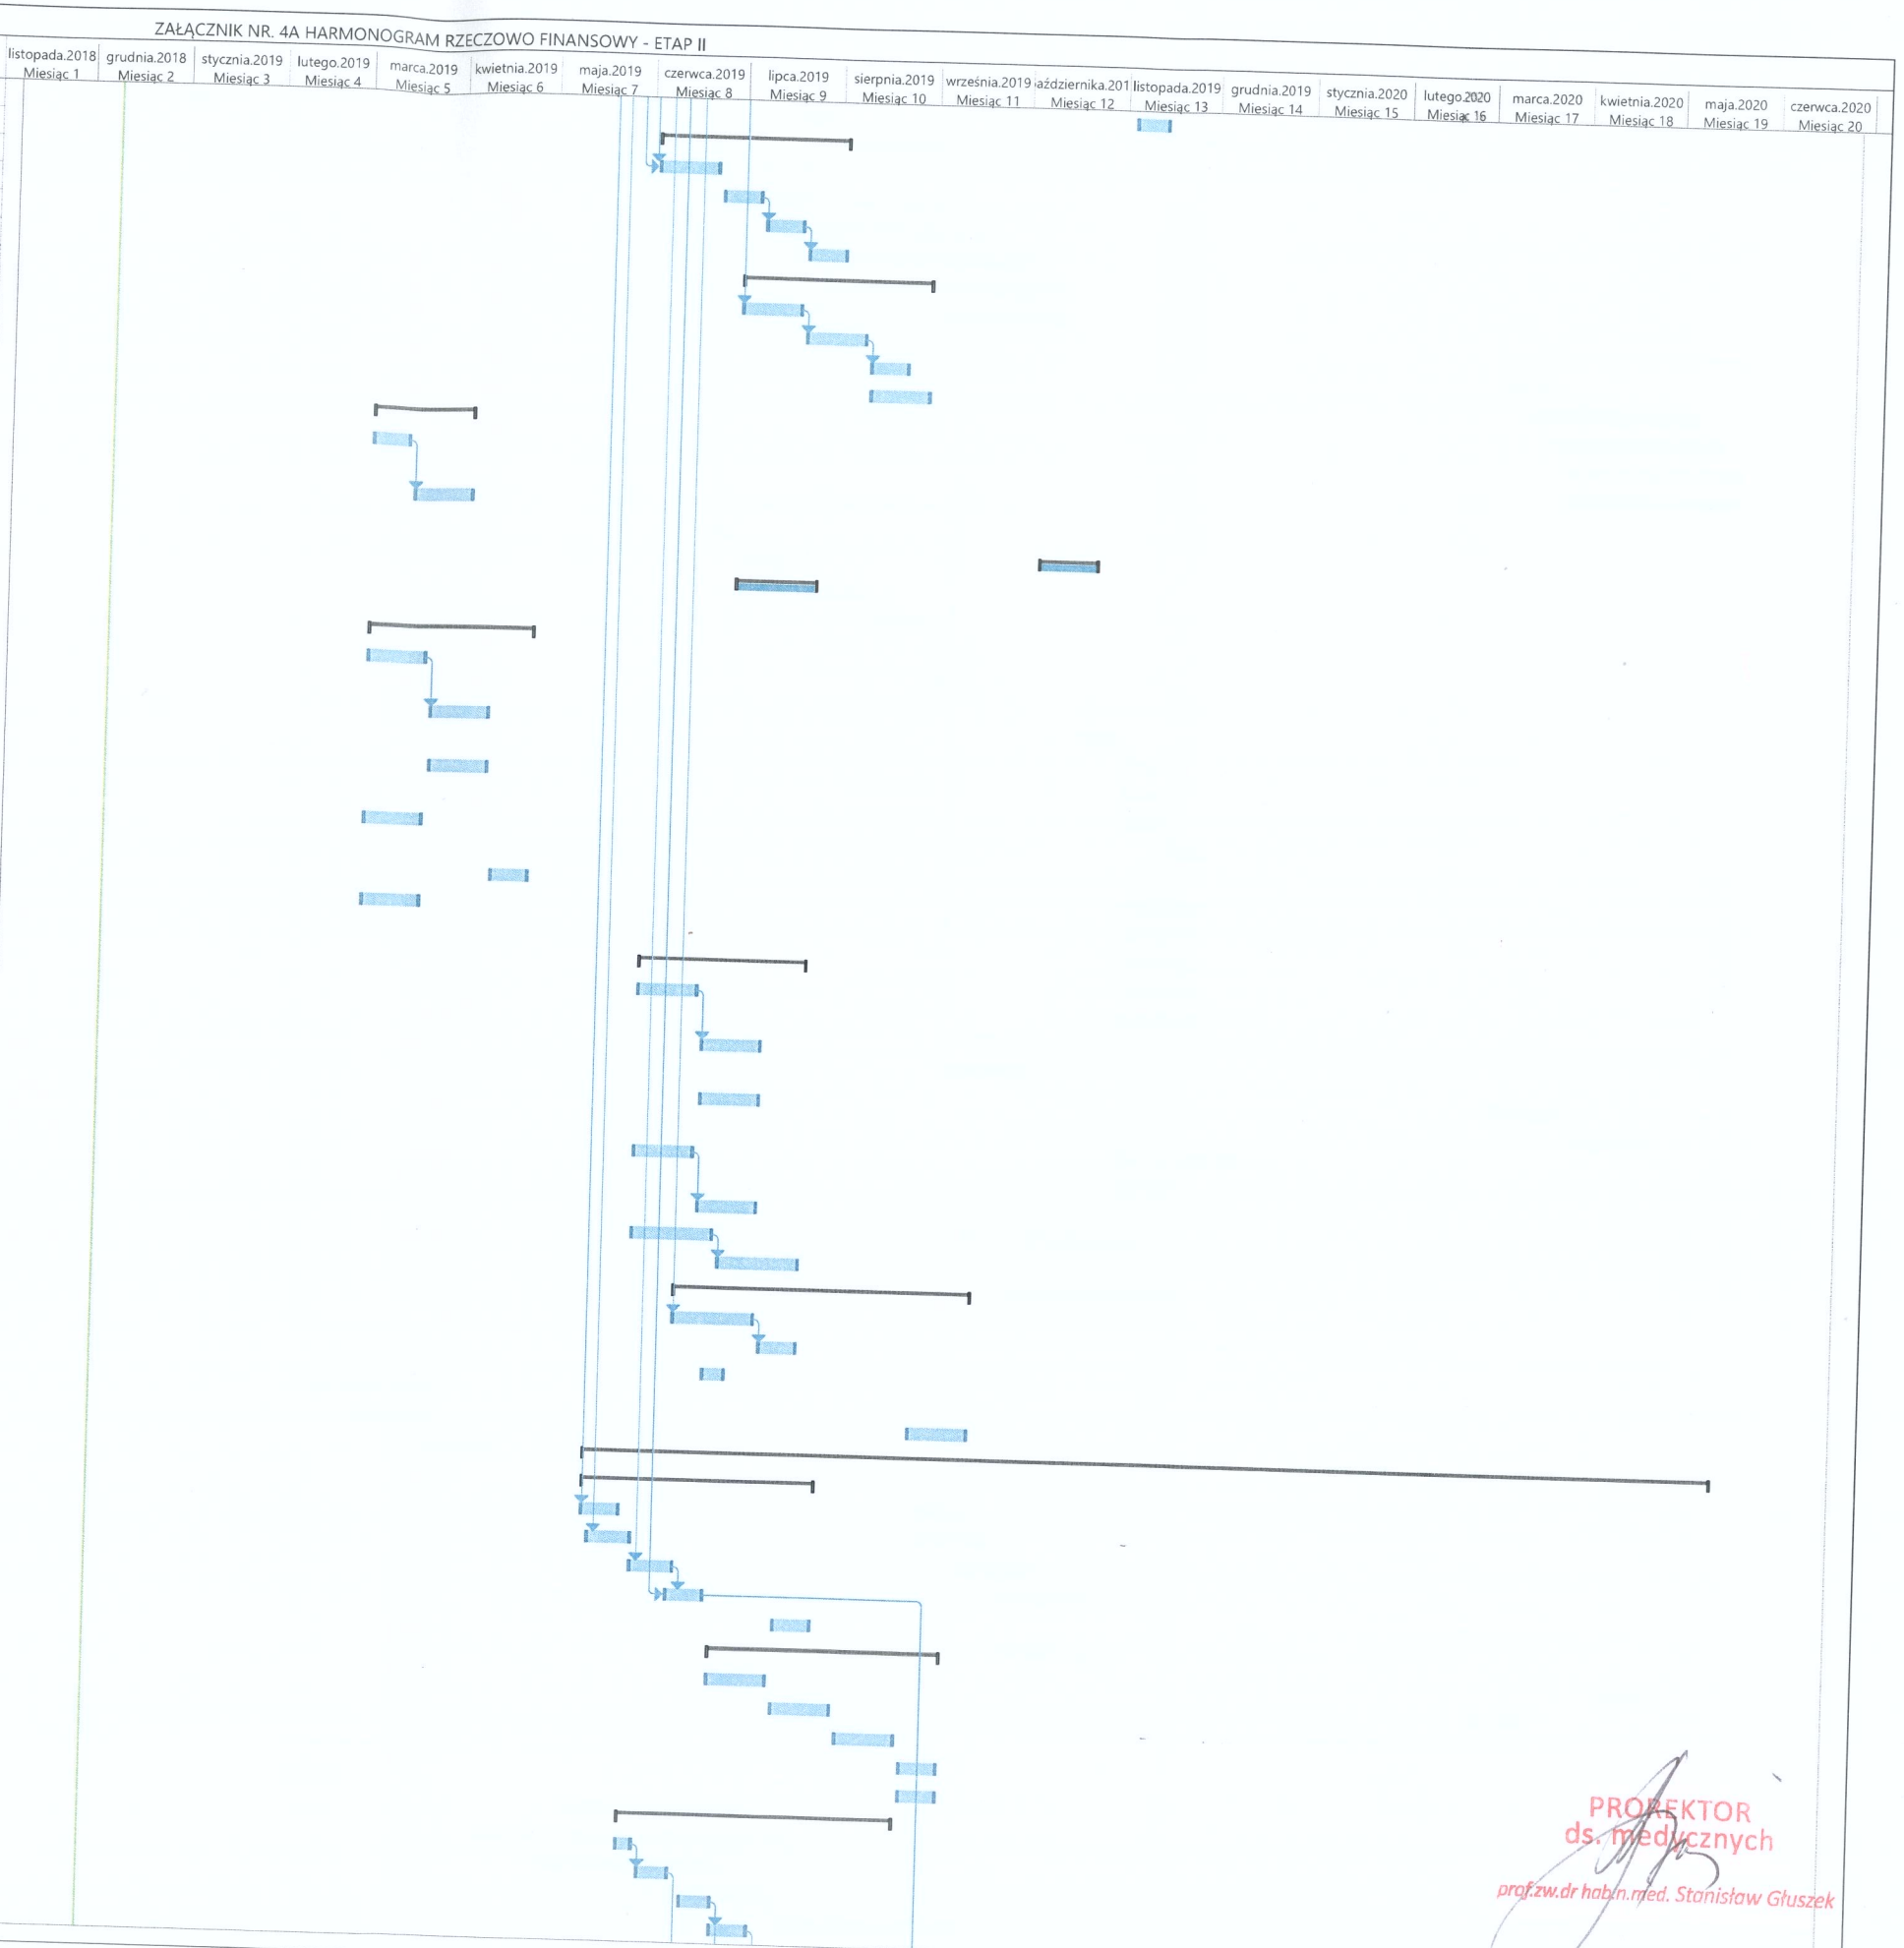

PROJEKTOR
ds. medycznych
prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

Projekt: Etap II - NETTO

Zadanie · Podział · Punkt kontrolny · Podsumowanie · Podsumowanie projektu · Zadanie nieaktywne · Nieaktywny punkt kontrolny · Podsumowanie nieaktywne · Zadanie ręczne · Tylko z czasem trwania · Rzutowanie podsumowania ręcznego · Podsumowanie ręczne · Tylko z rozpoczęciem · Tylko z zakończeniem · Zadania zewnętrzne · Zewnętrzne punkty kontrolne · Termin ostateczny · Postęp · Ręczne (postęp)

ZAŁĄCZNIK NR. 4A HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY - ETAP II

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
170	Poziom 3	45 620,06 zł	wto, 16.07.19	czw, 25.07.19
171	Podłoga techniczna Nadbudowy B	164 823,72 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
172	**ŚCIANKI DZIAŁOWE W TECHNOLOGIACH SUCHYCH**	**193 900,27 zł**	**czw, 20.06.19**	**pią, 11.10.19**
173	Poziom 0	38 780,05 zł	czw, 20.06.19	śro, 04.09.19
174	Poziom 1	38 780,05 zł	czw, 04.07.19	śro, 18.09.19
175	Poziom 2	38 780,05 zł	wto, 16.07.19	pon, 30.09.19
176	Poziom 3	38 780,05 zł	pią, 26.07.19	czw, 10.10.19
177	Poziom Nadbudowa B	38 780,07 zł	pon, 02.09.19	pią, 11.10.19
178	**ROBOTY MALARSKIE**	**327 654,17 zł**	**pon, 02.03.20**	**wto, 19.05.20**
179	Poziom 0	65 530,85 zł	pon, 02.03.20	pią, 20.03.20
180	Poziom 1	65 530,83 zł	pon, 09.03.20	wto, 05.05.20
181	Poziom 2	65 530,83 zł	pon, 16.03.20	wto, 12.05.20
182	Poziom 3	65 530,83 zł	pon, 23.03.20	wto, 19.05.20
183	Poziom Nadbudowa B	65 530,83 zł	pon, 23.03.20	wto, 19.05.20
184	**POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH**	**179 606,04 zł**	**czw, 20.06.19**	**pią, 13.09.19**
185	Poziom -1	12 600,00 zł	czw, 20.06.19	śro, 26.06.19
186	Poziom 0	33 400,00 zł	pon, 01.07.19	pią, 19.07.19
187	Poziom 1	33 400,00 zł	pon, 22.07.19	pią, 09.08.19
188	Poziom 2	33 400,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 30.08.19
189	Poziom 3	33 400,00 zł	pon, 02.09.19	pią, 13.09.19
190	Poziom Nadbudowa B	33 406,04 zł	pon, 02.09.19	pią, 13.09.19
191	**POSADZKI Z WYKŁADZINY PCV**	**220 763,39 zł**	**pon, 21.10.19**	**pią, 29.11.19**
192	Poziom 0	44 152,67 zł	pon, 21.10.19	pią, 01.11.19
193	Poziom 1	44 152,68 zł	pon, 04.11.19	pią, 15.11.19
194	Poziom 2	44 152,68 zł	pon, 04.11.19	pią, 15.11.19
195	Poziom 3	44 152,68 zł	pon, 04.11.19	pią, 15.11.19
196	Poziom Nadbudowa B	44 152,68 zł	pon, 18.11.19	pią, 29.11.19
197	**SUFITY PODWIESZANE**	**535 162,36 zł**	**pon, 04.11.19**	**pią, 29.11.19**
198	Poziom 0	107 032,47 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
199	Poziom 1	107 032,47 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
200	Poziom 2	107 032,47 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
201	Poziom 3	107 032,47 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
202	Poziom Nadbudowa B	107 032,48 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
203	**INNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE**	**290 907,30 zł**	**pon, 09.09.19**	**pią, 24.04.20**
204	Parapety wew.	32 911,94 zł	pon, 09.09.19	pią, 04.10.19
205	Balustrady wewnętrzne KS-1	128 404,83 zł	pon, 02.03.20	pią, 27.03.20
206	Wycieraczki do obuwia wewnętrzne	17 866,53 zł	pon, 30.03.20	pią, 24.04.20
207	Półki, lady i nakrywy wewnętrzne	76 307,55 zł	pon, 04.11.19	pią, 13.12.19
208	Obróbka ścian lacobelem	35 416,45 zł	pon, 04.11.19	pią, 22.11.19
209	**DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGÓW OSOBOWYCH**	**539 400,00 zł**	**pon, 16.09.19**	**pon, 25.11.19**
210	Dostawa i montaż windy o wymiarach kabiny 1500x2700x2300	300 948,00 zł	pon, 16.09.19	pon, 11.11.19
211	Dostawa i montaż windy o wymiarach kabiny 1500x2500x2300	238 452,00 zł	pon, 30.09.19	pon, 25.11.19
212	**ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	**534 306,00 zł**	**pon, 18.02.19**	**pią, 01.05.20**
213	**OGRODZENIE**	**175 588,74 zł**	**pon, 05.08.19**	**pon, 30.09.19**
214	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia	53 526,98 zł	pon, 18.02.19	pią, 29.03.19
215	Ściana żelbetowa - fundamnet ogrodzenia	94 397,50 zł	pon, 04.03.19	pią, 29.03.19
216	Ogrodzenie systemowe	27 664,26 zł	pon, 25.03.19	pią, 19.04.19
217	**DROGI I CHODNIKI**	**335 284,72 zł**	**pon, 02.09.19**	**pią, 08.11.19**
218	Korytowanie i roboty ziemne	22 620,00 zł	pon, 02.09.19	pią, 20.09.19
219	Podbudowa pod drogi i chodniki	90 487,18 zł	czw, 05.09.19	śro, 25.09.19
220	Krawężniki i obrzeża	19 092,00 zł	pon, 16.09.19	pią, 11.10.19
221	Nawierzchnie chodników i dziedzińca pomiędzy budynkami B i C	86 757,24 zł	pon, 30.09.19	pią, 08.11.19
222	Nawierzchnie dróg	116 328,30 zł	pon, 30.09.19	pią, 08.11.19
223	**Nasadzenia**	7 822,78 zł	pon, 13.04.20	pią, 01.05.20
224	**Mała architektura**	15 609,76 zł	pon, 02.03.20	pią, 20.03.20
225	**BRANŻA SANITARNIA**	**3 196 225,23 zł**	**śro, 05.12.18**	**pią, 03.04.20**
226	**WOD-KAN**	**236 307,77 zł**	**pon, 11.02.19**	**pią, 20.09.19**
227	kanalizacja podposadzkowa	35 000,00 zł	pon, 11.02.19	pią, 01.03.19
228	poziomy kanalizacji	51 000,00 zł	pon, 13.05.19	pią, 12.07.19
229	piony kanalizacji	58 000,00 zł	pon, 15.04.19	pią, 26.07.19
230	przewody wodociągowe	42 000,00 zł	pon, 06.05.19	pią, 05.07.19
231	izolacje przewodów	15 000,00 zł	pon, 17.06.19	pią, 19.07.19
232	armatura	35 307,77 zł	pon, 22.07.19	pią, 20.09.19

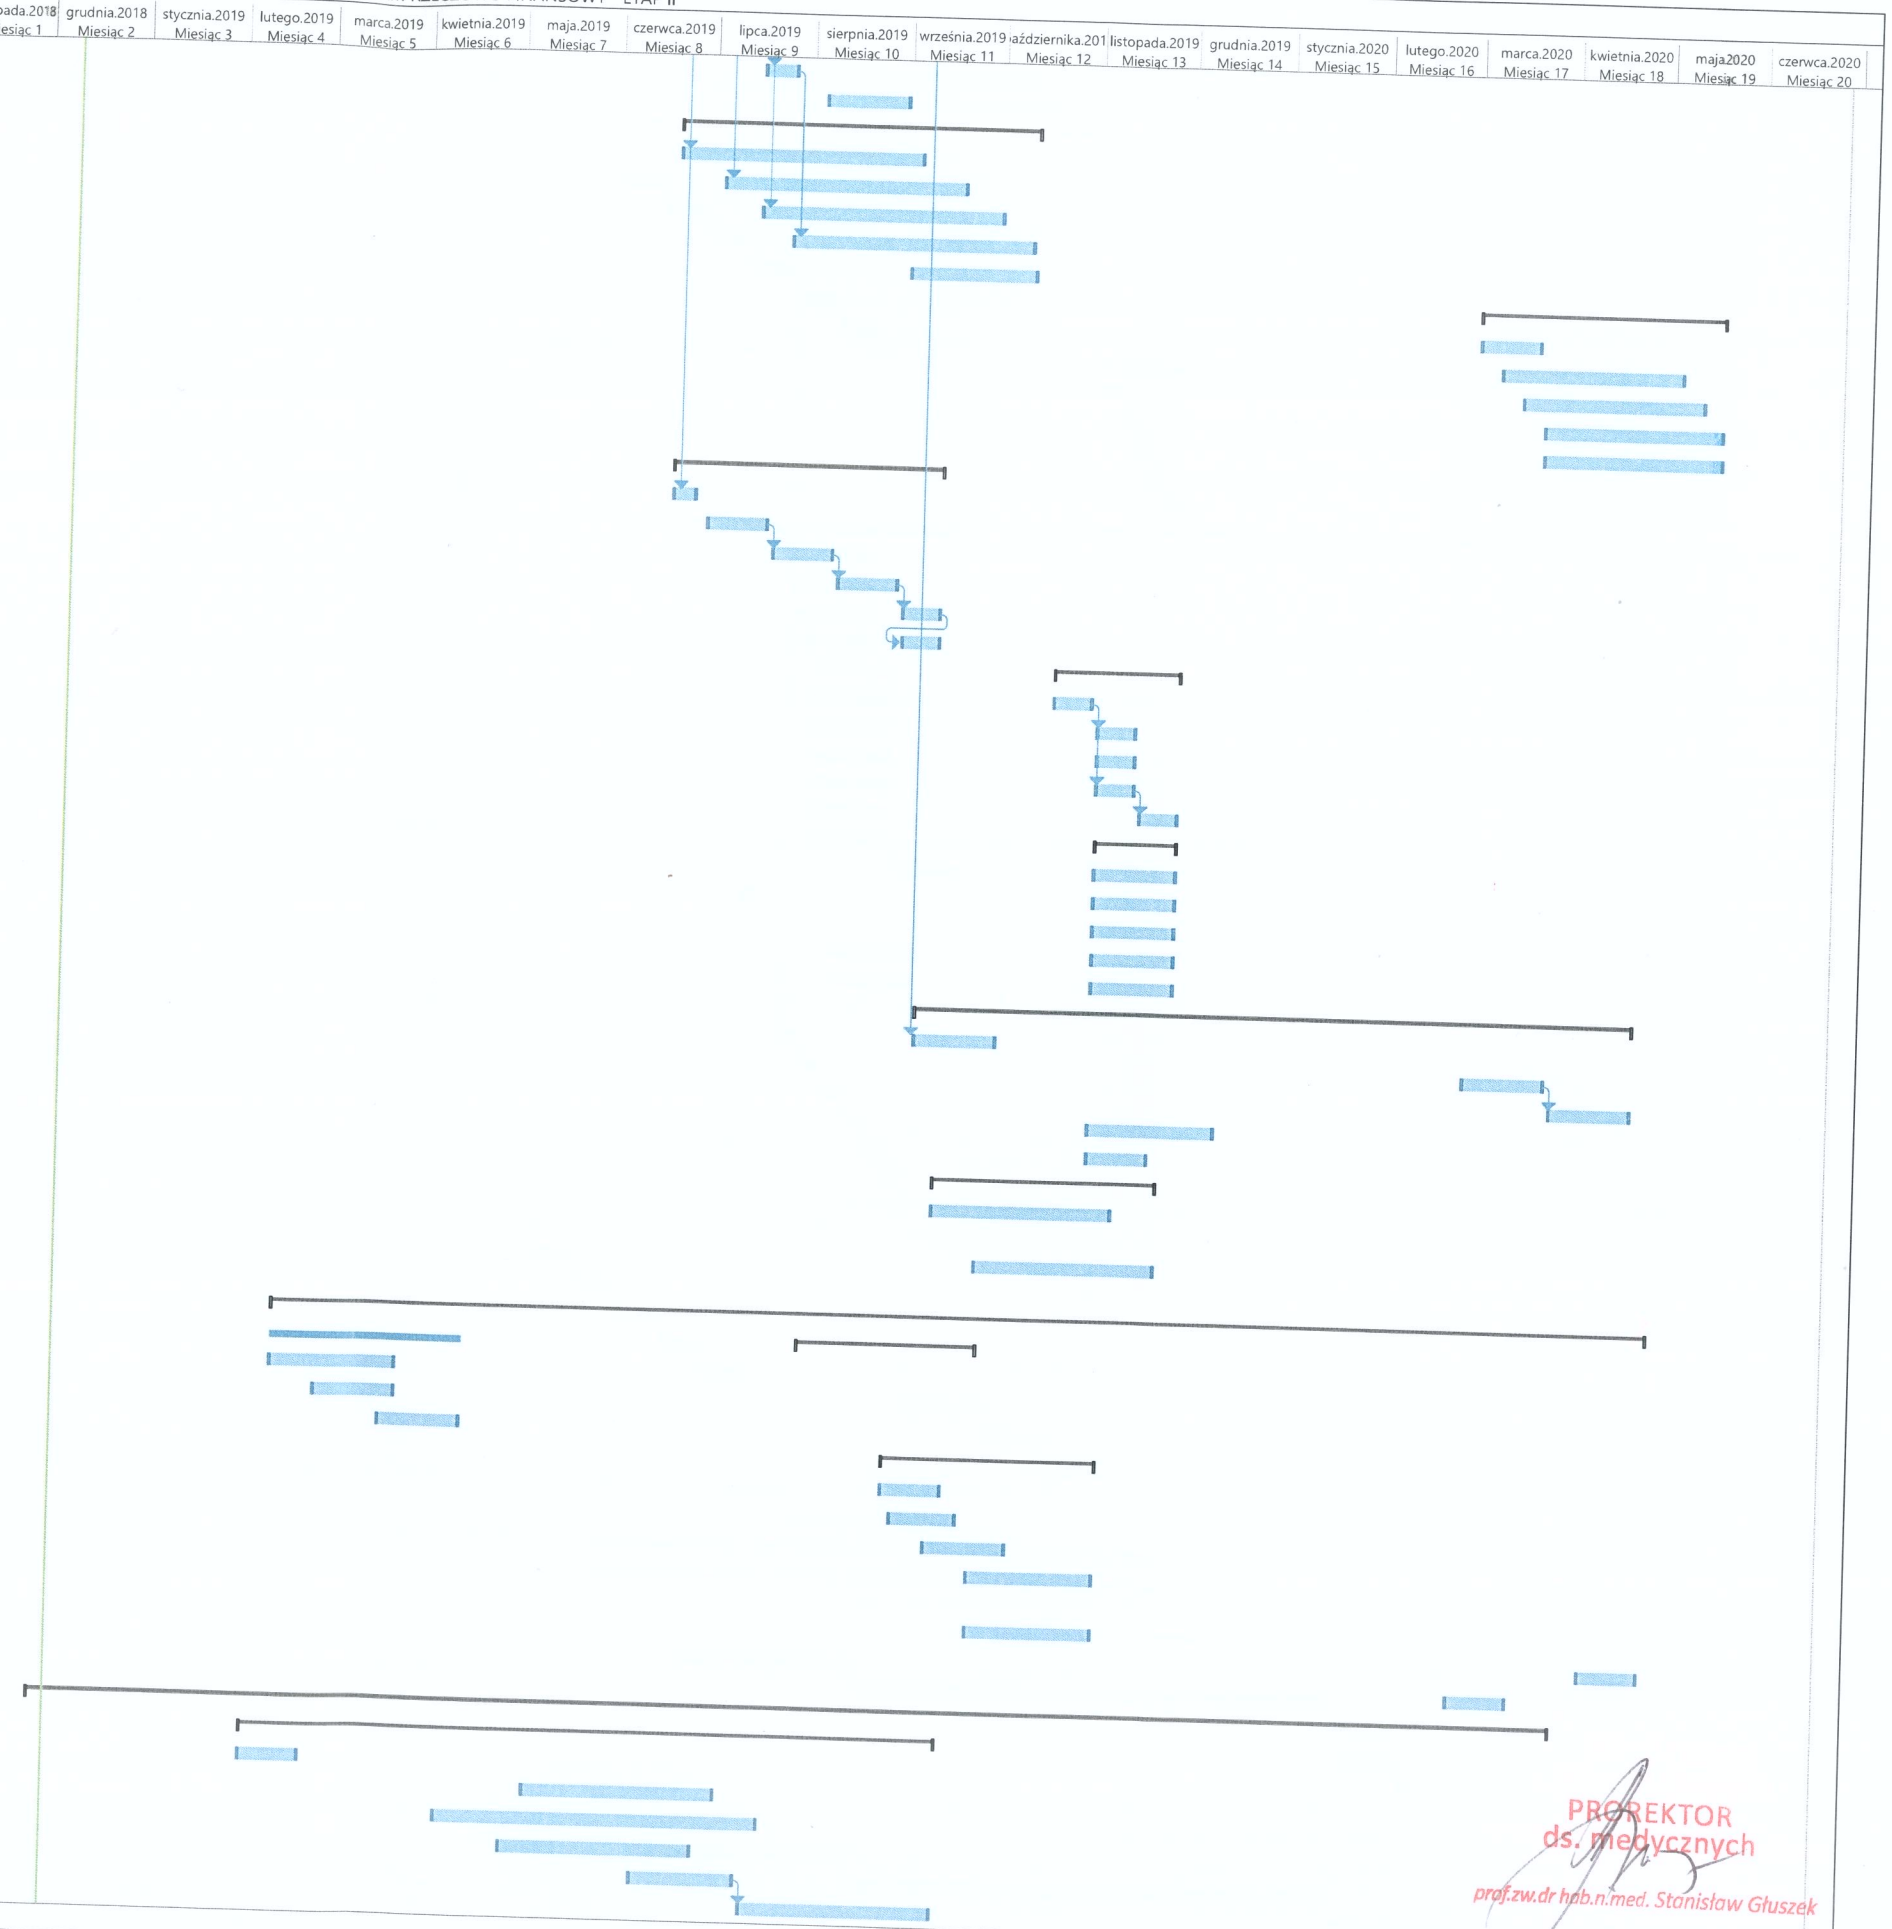

PROREKTOR
ds. medycznych
prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

Projekt: Etap II - NETTO

Zadanie · Podział · Punkt kontrolny · Podsumowanie · Podsumowanie projektu · Zadanie nieaktywne · Nieaktywny punkt kontrolny · Podsumowanie nieaktywne · Zadanie ręczne · Tylko z czasem trwania · Rzutowanie podsumowania ręcznego · Podsumowanie ręczne · Tylko z rozpoczęciem · Tylko z zakończeniem · Zadania zewnętrzne · Zewnętrzne punkty kontrolne · Termin ostateczny · Ręczne (postęp)

I.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
233	Sprężone powietrze Budynek C	19 977,17 zł	pon, 02.09.19	pią, 11.10.19
248	Sprężone powietrze Budynek B	40 095,06 zł	pon, 09.09.19	pią, 18.10.19
263	**WENTYLACJA**	**1 621 636,61 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 03.04.20**
264	**Kanały wentylacyjne**	**734 112,08 zł**	**pon, 03.06.19**	**pią, 23.08.19**
265	Poziom 0	122 352,00 zł	pon, 03.06.19	pią, 14.06.19
266	Poziom 1	122 352,00 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
267	Poziom 2	122 352,00 zł	pon, 01.07.19	pią, 12.07.19
268	Poziom 3	122 352,00 zł	pon, 15.07.19	pią, 26.07.19
269	Poziom Nadbudowa B	122 352,00 zł	pon, 29.07.19	pią, 09.08.19
270	Dach	122 352,08 zł	pon, 12.08.19	pią, 23.08.19
271	**Kratki wentylacyjne, anemostaty, klapy**	**101 385,20 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 03.04.20**
272	Poziom 0	20 277,04 zł	pon, 04.11.19	pią, 08.11.19
273	Poziom 1	20 277,04 zł	pon, 11.11.19	śro, 13.11.19
274	Poziom 2	20 277,04 zł	czw, 14.11.19	pon, 18.11.19
275	Poziom 3	20 277,04 zł	wto, 19.11.19	pią, 22.11.19
276	Poziom Nadbudowa B	20 277,04 zł	pon, 25.11.19	czw, 28.11.19
277	**Montaż urządzeń na dachu**	**483 817,42 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 03.04.20**
278	Montaż centrali wentylacyjnej N1/W1	19 957,08 zł	pon, 29.07.19	pią, 23.08.19
279	Montaż centrali wentylacyjnej N2/W2	28 519,57 zł	pon, 29.07.19	pią, 23.08.19
280	Montaż centrali wentylacyjnej N3/W3	18 414,56 zł	pon, 29.07.19	pią, 23.08.19
281	Montaż centrali wentylacyjnej N4/W4	18 414,56 zł	pon, 29.07.19	pią, 23.08.19
282	Montaż centrali wentylacyjnej N5/W5	19 721,93 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
283	Montaż centrali wentylacyjnej N6/W6	18 414,56 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
284	Montaż centrali wentylacyjnej N7/W7	19 439,43 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
285	Montaż centrali wentylacyjnej N8/W8	18 414,56 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
286	Montaż centrali wentylacyjnej N9/W9	22 683,10 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
287	Montaż centrali wentylacyjnej N10/W10	23 033,97 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
288	Montaż centrali wentylacyjnej N11/W11	22 614,77 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
289	Montaż automatyki do central wentylacyjnych	95 181,13 zł	pon, 02.09.19	pią, 20.09.19
290	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod cenrtale wentylacyjne i agregaty chłodnicze	18 008,20 zł	pon, 15.07.19	pią, 19.07.19
291	Wentylatory dachowe	106 000,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 06.09.19
292	Tłumiki	35 000,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 06.09.19
293	**Izolacja**	**302 321,91 zł**	**pon, 29.07.19**	**pią, 06.09.19**
294	Poziom 0	50 386,98 zł	pon, 29.07.19	pią, 02.08.19
295	Poziom 1	50 386,98 zł	pon, 05.08.19	pią, 09.08.19
296	Poziom 2	50 386,98 zł	pon, 12.08.19	pią, 16.08.19
297	Poziom 3	50 386,98 zł	pon, 19.08.19	pią, 23.08.19
298	Poziom Nadbudowa B	50 386,98 zł	pon, 26.08.19	pią, 30.08.19
299	Dach	50 387,01 zł	pon, 02.09.19	pią, 06.09.19
300	**OGRZEWANIE I WĘZEŁ CIEPLNY**	**431 204,32 zł**	**pon, 13.05.19**	**pią, 06.12.19**
301	**Instalacja c.o.**	**225 416,44 zł**	**pon, 13.05.19**	**pią, 08.11.19**
302	Rurociągi - Poziom 0	31 000,00 zł	pon, 13.05.19	pią, 24.05.19
303	Rurociągi - Poziom 1	31 000,00 zł	pon, 27.05.19	pią, 07.06.19
304	Rurociągi - Poziom 2	31 000,00 zł	pon, 10.06.19	pią, 21.06.19
305	Rurociągi - Poziom 3	31 000,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 05.07.19
306	Rurociągi - Nadbudowa B	34 000,00 zł	pon, 08.07.19	pią, 19.07.19
307	armatura	12 674,13 zł	pon, 09.09.19	pią, 04.10.19
308	izolacje	18 000,00 zł	pon, 07.10.19	pią, 25.10.19
309	grzejniki	36 742,31 zł	pon, 21.10.19	pią, 08.11.19
310	**Instalacja gazu**	**6 344,54 zł**	**pon, 15.07.19**	**pią, 02.08.19**
311	**Instalacja c.t.**	**29 718,38 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 27.09.19**
312	**Wymienikownia**	**148 723,92 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 06.12.19**
313	**Pomieszczenie techniczne**	**21 001,04 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 06.12.19**
314	**KLIMATYZACJA**	**610 945,86 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 06.03.20**
315	**Klimatyzacja i woda lodowa - Budynek C**	**272 066,88 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 21.02.20**
316	Ułożenie instalacji - rury	34 567,10 zł	pon, 01.07.19	pią, 23.08.19
317	Armatura	64 878,57 zł	pon, 26.08.19	pią, 24.01.20
318	Montaż jednostek klimatyzatorów	18 058,00 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
319	Agregat chłodniczy zewnętrzny	139 086,96 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
320	Urochomienie systemu chłodniczego wraz z wykonaniem próby i napełnieniem systemu czynnikiem chłodniczym	15 476,25 zł	pon, 17.02.20	pią, 21.02.20
321	**Klimatyzacja i woda lodowa - Budynek B**	**338 878,98 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 06.03.20**
322	Ułożenie instalacji - rury	39 805,35 zł	pon, 01.07.19	pią, 23.08.19
323	Armatura	22 063,84 zł	pon, 26.08.19	pią, 24.01.20
324	Izolacje	33 466,58 zł	pon, 27.01.20	pią, 06.03.20

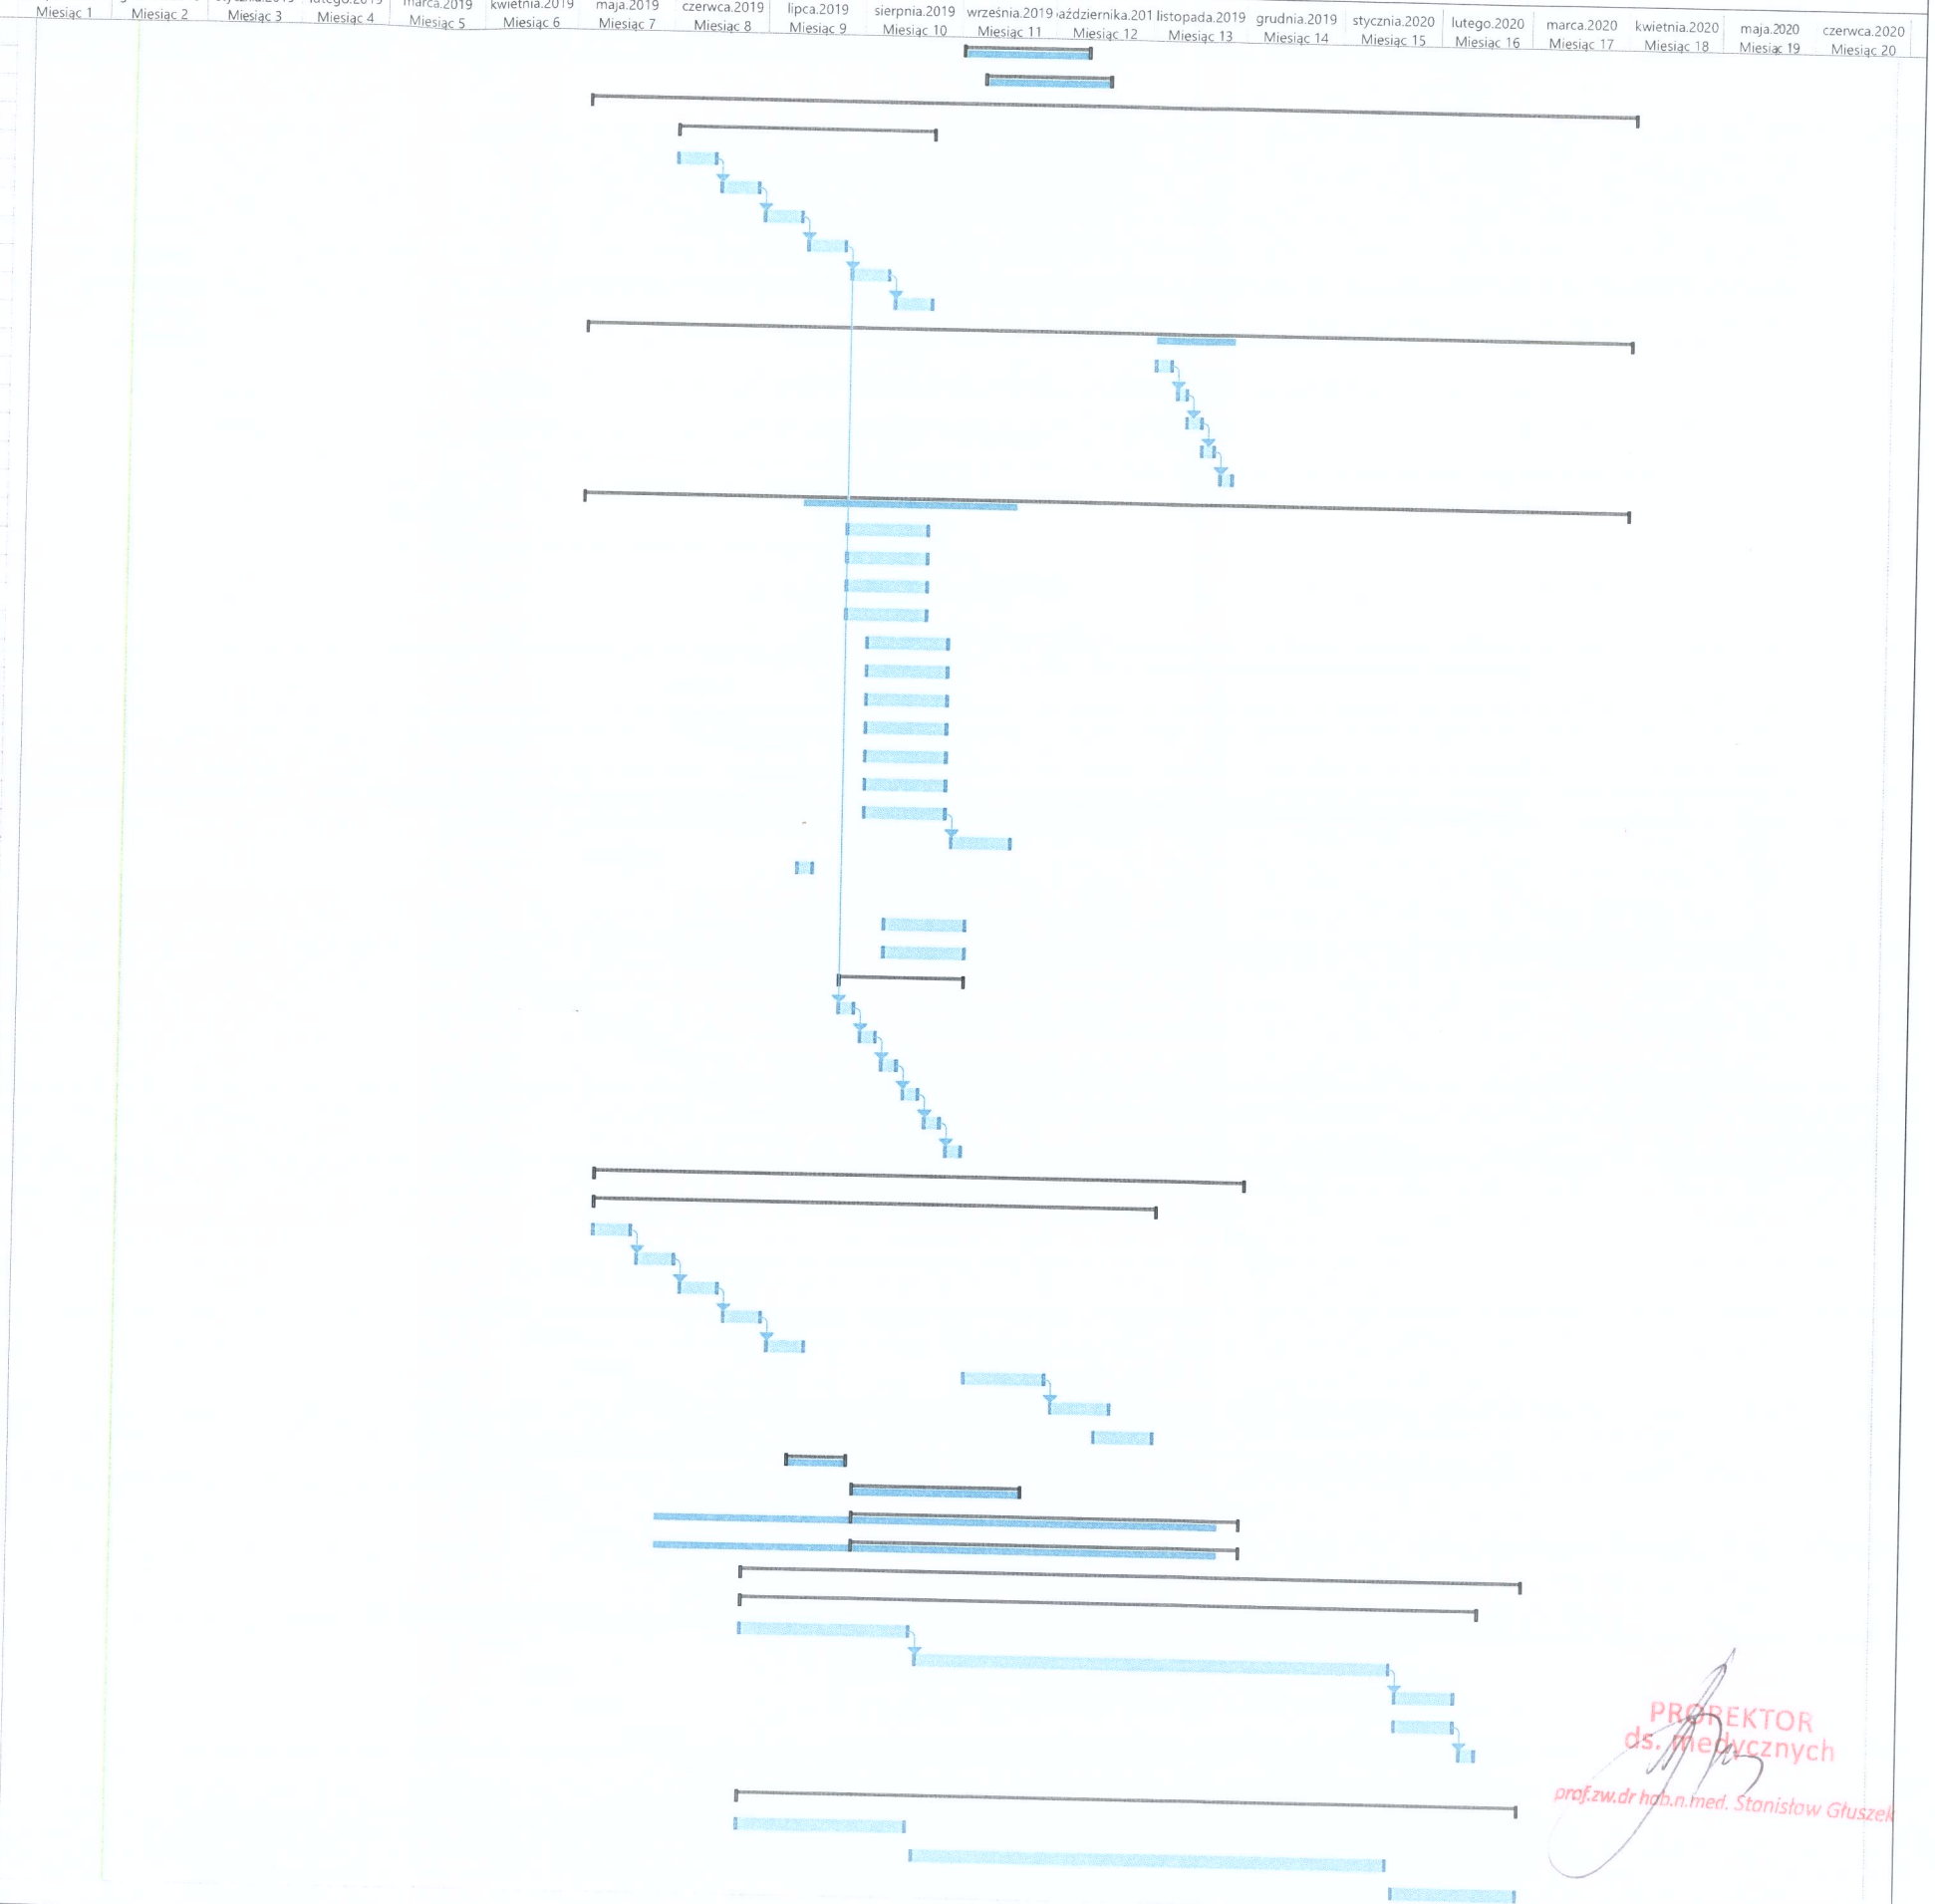

PROREKTOR ds. medycznych prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

ct: Etap II - NETTO

Zadanie · Podział · Punkt kontrolny · Podsumowanie · Podsumowanie projektu · Zadanie nieaktywne · Nieaktywny punkt kontrolny · Podsumowanie nieaktywne · Tylko z czasem trwania · Rzutowanie podsumowania ręcznego · Tylko z rozpoczęciem · Tylko z zakończeniem · Zewnętrzne punkty kontrolne · Termin ostateczny · Ręczne (postęp)

d.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
359	Montaż jednostek klimatyzatorów	14 859,90 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
360	Dostawa klimakonwektorów	85 664,10 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
361	Agregat chłodniczy zewnętrzny agregat wody lodowej z freecoolingiem [182kW] lub równoważne	127 542,96 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
362	Urochomienie systemu chłodniczego wraz z wykonaniem próby i napełnieniem systemu czynnikiem chłodniczym	15 476,25 zł	pon, 17.02.20	pią, 28.02.20
363	**INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE**	**178 691,24 zł**	**śro, 05.12.18**	**czw, 17.01.19**
364	**Kanalizacja deszczowa**	**149 901,58 zł**	**śro, 05.12.18**	**czw, 27.12.18**
365	Wykopy	80 648,20 zł	śro, 05.12.18	wto, 25.12.18
366	Zasypanie wykopów	7 256,82 zł	pią, 07.12.18	czw, 27.12.18
367	Studnie	42 887,62 zł	pon, 10.12.18	śro, 26.12.18
368	Rurociągi	19 108,94 zł	śro, 05.12.18	wto, 25.12.18
369	**Kanalizacja sanitarna**	**18 906,21 zł**	**pią, 28.12.18**	**pon, 07.01.19**
386	**Wodociąg zew.**	**9 883,45 zł**	**wto, 08.01.19**	**czw, 17.01.19**
408	**PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO**	**57 367,20 zł**	**pon, 07.01.19**	**pią, 18.01.19**
429	**BRANŻA ELEKTRYCZNA**	**2 656 188,97 zł**	**pon, 03.12.18**	**pią, 10.04.20**
430	**WLZ do budynku + WPOŻ + BK**	**259 608,08 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 04.10.19**
431	Ułożenie kabli w wykopie wraz z zasypką	76 704,89 zł	pon, 04.03.19	pią, 29.03.19
432	Montaż skrzynek i rozdzielnic	35 120,76 zł	pon, 18.03.19	pią, 29.03.19
433	Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 300kVA	147 782,43 zł	pon, 09.09.19	pią, 04.10.19
434	**Rozdzielnica główna RG**	**62 728,89 zł**	**pon, 02.09.19**	**pią, 11.10.19**
441	**Tablice bezpiecznikowe lokalne i UPS**	**180 921,82 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
442	Poziom 0	36 184,38 zł	pon, 03.06.19	pią, 21.06.19
443	Poziom 1	36 184,36 zł	pon, 03.06.19	pią, 21.06.19
444	Poziom 2	36 184,36 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
445	Poziom 3	36 184,36 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
446	Poziom Nadbudowa B	36 184,36 zł	pon, 04.03.19	pią, 28.02.20
447	**Oświetlenie zewnętrzne terenu**	**94 809,00 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 25.10.19**
448	Układanie okablowania	15 225,15 zł	pon, 06.05.19	pią, 31.05.19
449	Montaż latarń oświetleniowych	29 618,93 zł	pon, 14.10.19	pią, 25.10.19
450	Montaż opraw zewnętrznych w murkach i chodnikach	49 964,92 zł	pon, 14.10.19	pią, 25.10.19
451	**Instalacja oświetleniowa**	**604 040,34 zł**	**pon, 08.04.19**	**pią, 13.12.19**
452	Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 0	15 968,65 zł	pon, 08.04.19	pią, 19.04.19
453	Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 1	15 968,65 zł	pon, 22.04.19	wto, 07.05.19
454	Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 2	15 968,65 zł	śro, 08.05.19	czw, 23.05.19
455	Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 3	15 968,65 zł	pią, 24.05.19	pon, 10.06.19
456	Bruzdowanie i układanie przewodów Nadbudowa B	15 968,67 zł	wto, 11.06.19	pon, 24.06.19
457	Rozdzielnice	42 529,81 zł	wto, 25.06.19	pon, 22.07.19
458	Montaż opraw oświetleniowych Poziom 0	96 333,45 zł	pon, 11.11.19	pią, 15.11.19
459	Montaż opraw oświetleniowych Poziom 1	96 333,45 zł	pon, 18.11.19	pią, 22.11.19
460	Montaż opraw oświetleniowych Poziom 2	96 333,45 zł	pon, 25.11.19	pią, 29.11.19
461	Montaż opraw oświetleniowych Poziom 3	96 333,45 zł	pon, 02.12.19	pią, 06.12.19
462	Montaż opraw oświetleniowych Nadbudowa B	96 333,46 zł	pon, 09.12.19	pią, 13.12.19
463	**Trasy kablowe - koryta metalowe**	**47 779,25 zł**	**pon, 08.04.19**	**pon, 24.06.19**
464	Poziom 0	9 555,85 zł	pon, 08.04.19	pią, 19.04.19
465	Poziom 1	9 555,85 zł	pon, 22.04.19	wto, 07.05.19
466	Poziom 2	9 555,85 zł	śro, 08.05.19	czw, 23.05.19
467	Poziom 3	9 555,85 zł	pią, 24.05.19	pon, 10.06.19
468	Nadbudowa B	9 555,85 zł	wto, 11.06.19	pon, 24.06.19
469	**Instalacja siły + WLZ tablic lokalnych**	**272 145,29 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
470	Poziom 0	54 429,06 zł	pon, 08.04.19	pią, 19.04.19
471	Poziom 1	54 429,06 zł	pon, 22.04.19	wto, 07.05.19
472	Poziom 2	54 429,06 zł	śro, 08.05.19	czw, 23.05.19
473	Poziom 3	54 429,06 zł	pią, 24.05.19	pon, 10.06.19
474	Nadbudowa B	54 429,05 zł	wto, 11.06.19	pon, 24.06.19
475	**Instalacja okablowania strukturalnego - rozbudowa i nadbudowa**	**579 360,34 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
476	Poziom 0	102 484,56 zł	pon, 08.04.19	pią, 19.04.19
477	Poziom 1	102 484,57 zł	pon, 22.04.19	wto, 07.05.19
478	Poziom 2	102 484,57 zł	śro, 08.05.19	czw, 23.05.19
479	Poziom 3	102 484,57 zł	pią, 24.05.19	pon, 10.06.19
480	Nadbudowa B	102 484,57 zł	wto, 11.06.19	pon, 24.06.19
481	Uruchomienie , konserwacja całości systemu	66 937,50 zł	wto, 25.06.19	pon, 05.08.19
482	**Instalacja okablowania strukturalnego - przebudowa skrzydła A i B**	**156 107,78 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
483	Skrzydło A	78 053,89 zł	pon, 07.01.19	pią, 01.02.19
484	Skrzydło B	78 053,89 zł	pon, 07.01.19	pią, 15.02.19

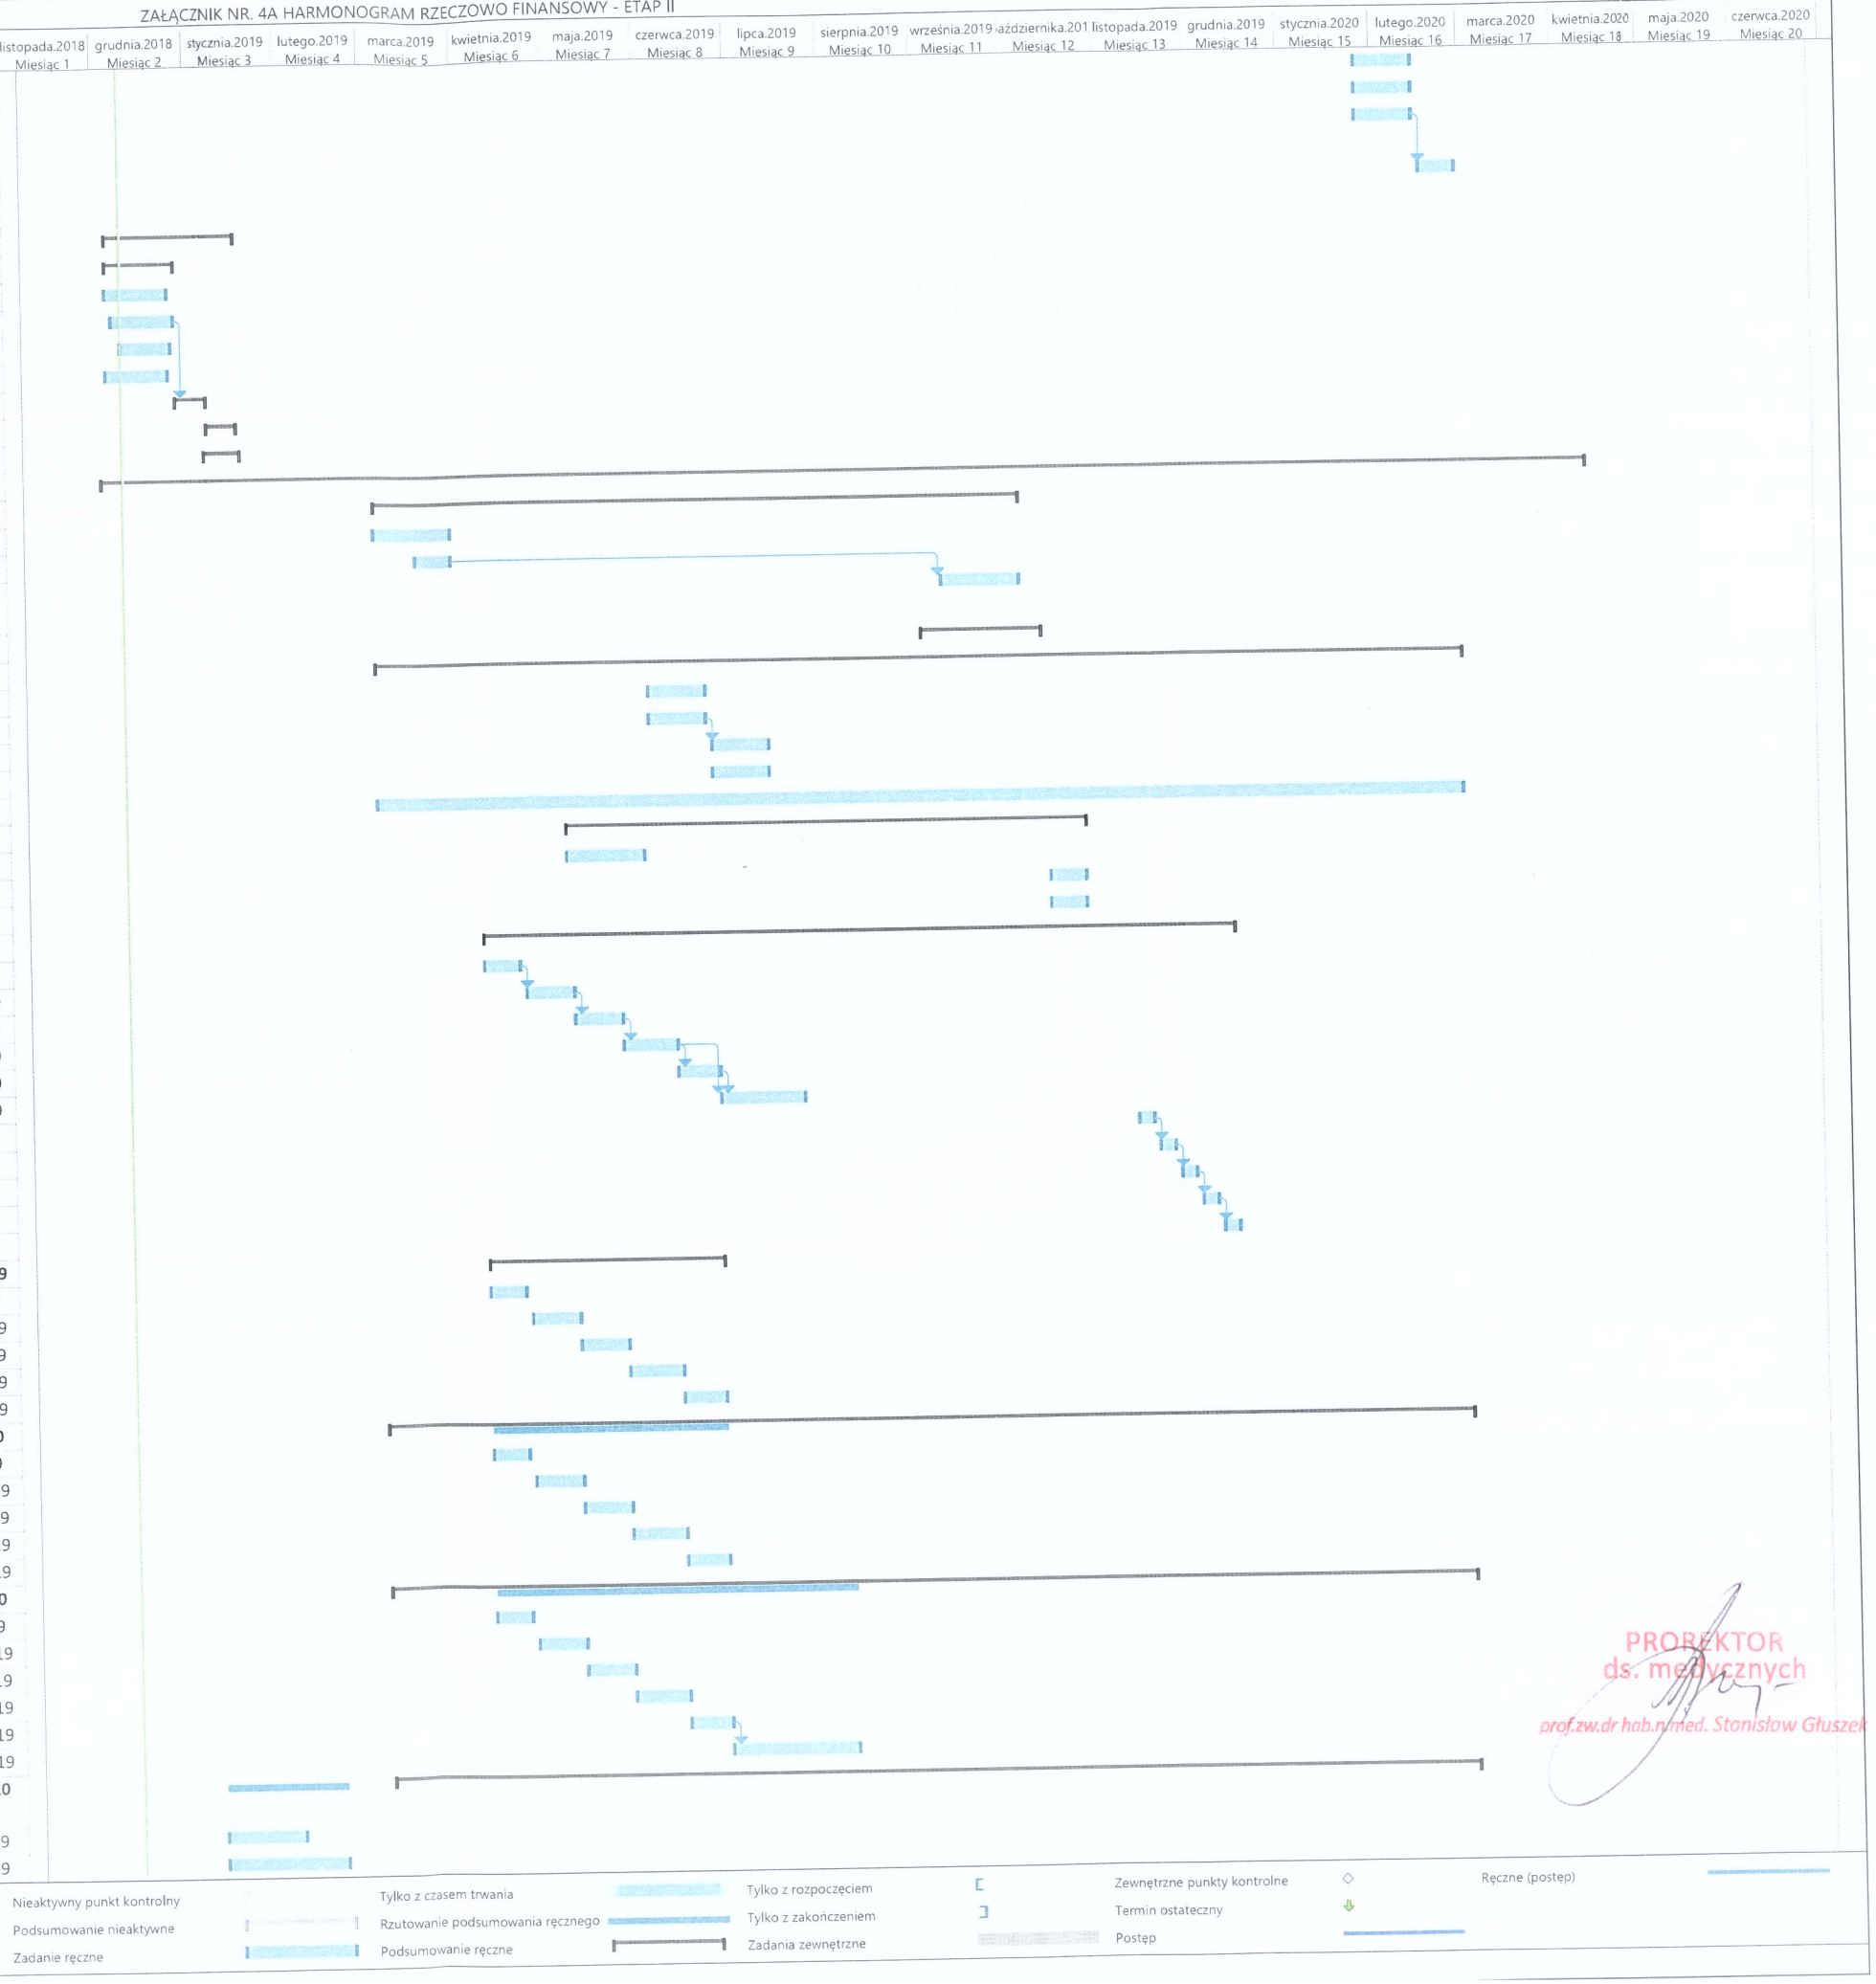

PROJEKTOR
ds. medycznych
prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
485	**Instalacja monitoringu CCTV - Alarmu - okablowanie**	**72 793,40 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
486	Poziom 0	14 558,68 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
487	Poziom 1	14 558,68 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
488	Poziom 2	14 558,68 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
489	Poziom 3	14 558,68 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
490	Nadbudowa B	14 558,68 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
491	**Instalacja monitoringu CCTV - Alarmu - urządzenia**	**180 758,94 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 25.10.19**
492	Poziom 0	36 151,78 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
493	Poziom 1	36 151,79 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
494	Poziom 2	36 151,79 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
495	Poziom 3	36 151,79 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
496	Nadbudowa B	36 151,79 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
497	**Oddymianie klatek schodowych - rozbudowa i nadbudowa**	**58 478,10 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
498	Skrzydło C	29 239,05 zł	pon, 02.09.19	pią, 22.11.19
499	Skrzydło B Nadbudowa	29 239,05 zł	pon, 02.09.19	pią, 22.11.19
500	**Oddymianie klatek schodowych - przebudowa skrzydła A i B**	**9 503,58 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 03.05.19**
521	**Instalacja odgromowa**	**46 271,74 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
522	Zwody poziome fundamentów	8 593,01 zł	pon, 17.12.18	pią, 15.02.19
523	Zwody pionowe	17 903,39 zł	pon, 18.02.19	pią, 14.06.19
524	Instalacja odgromowa na dachu	7 809,14 zł	pon, 19.08.19	pią, 06.09.19
525	Montaż iglic odgromowych	11 966,20 zł	pon, 09.09.19	pią, 20.09.19
526	**Instalacja przyzywowa**	**8 407,96 zł**	**pon, 07.10.19**	**pią, 01.11.19**
539	**Pomiary**	**15 305,22 zł**	**pon, 23.03.20**	**pią, 10.04.20**
545	**Przebudowa podziemnej linii optotelekomunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej**	**7 169,24 zł**	pon, 03.12.18	pią, 14.12.18
546	**WYPOSAŻENIE STAŁE**	**317 670,13 zł**	**pon, 23.03.20**	**pią, 26.06.20**
547	**1. BIAŁY MONTAŻ**	**163 650,28 zł**	**pon, 23.03.20**	**pią, 24.04.20**
548	Poziom 0	32 730,06 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
549	Poziom 1	32 730,06 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
550	Poziom 2	32 730,06 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
551	Poziom 3	32 730,06 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
552	Poziom Nadbudowa B	32 730,04 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
553	**2. AKCESORIA SANITARNE - dozowniki, pojemniki**	103 351,94 zł	**pon, 06.04.20**	**pią, 08.05.20**
554	Poziom 0	20 670,39 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
555	Poziom 1	20 670,39 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
556	Poziom 2	20 670,39 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
557	Poziom 3	20 670,39 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
558	Poziom Nadbudowa B	20 670,38 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
559	**3. WYPOSAŻENIE MEBLOWE**	**27 602,87 zł**	**pon, 06.04.20**	**pią, 26.06.20**
567	**4. ROLETY WEWNĘTRZNE**	**23 065,04 zł**	**pon, 04.05.20**	**pią, 19.06.20**

PROREKTOR
ds. medycznych
prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
Jolanta Mitręga

Firma Budowlana
23 ANNA - BUD Sp. z o. o.
Bilcza, ul. Bukowa 2 B 26-026 Morawica
tel./fax 41 311-75-50
NIP 657-291-18-69, REGON 260727798

ł. 3 - TABELA RYCZAŁTOWA ROBÓT ETAP II

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY ROBÓT

„I NADBUDOWA BUDYNKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGOWYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU UJK W KIELCACH"

ególnienie robót	wartość wg umowy netto (zł)	wartość wg umowy brutto (zł)	lis.18	gru.18	sty.19	lut.19	mar.19	kwi.19	maj.19	cze.19	lip.19	sie.19	wrz.19	paź.19	lis.19	gru.19	sty.20	lut.20	mar.20	kwi.20	maj.20	cze.20
- SUMA	**18 976 602,47 zł**	**23 341 221,04 zł**																				
A BUDOWLANA																						
UDOWY																					7 500,00 zł	
acja placu budowy	15 000,00 zł	18 450,00 zł		7 500,00 zł																		
nig drgan	35 000,00 zł	43 050,00 zł			7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł													
administracyjne związane z prowadzeniem budowy	480 388,50 zł	590 877,86 zł		26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	26 688,25 zł	
wa, montaż i praca żurawia wieżowego	450 000,00 zł	553 500,00 zł			75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł												
Y ROZBIÓRKOWE - BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO (SALA STYCZNA, MAGAZYN, SZATNIE, WC I ŁAZIENKA)																						
ka wraz z utylizacją gruzu budynku Sali gimnastycznej oraz wiaty kowej	76 693,85 zł	94 333,44 zł	76 693,85 zł																			
Y ROZBIÓRKOWE - KANAŁ WENTYLACYJNY WRAZ Z CZERPNIĄ OWĄ	7 801,51 zł	9 595,86 zł		7 801,51 zł																		
ÓRKA ISTNIEJĄCEGO DACHU W SKRZYDLE B	137 128,16 zł	168 667,64 zł					137 128,16 zł															
ÓRKA ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ SKRZYDŁA B	4 626,36 zł	5 690,42 zł					4 626,36 zł															
Y ZIEMNE																						
ĄNICZNE ŚCINANIE DRZEW I KRZEWÓW	8 000,00 zł	9 840,00 zł		8 000,00 zł																		
iczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 8 cm, ników, murów ogrodzeniowych	46 525,36 zł	57 226,19 zł		46 525,36 zł																		
anie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś A-D/1-do skrzydła	154 316,88 zł	189 809,76 zł		154 316,88 zł																		
anie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś D-H/1- 4	154 616,88 zł	190 178,76 zł			154 616,88 zł																	
wanie wykopów w gruncie kat. IV	33 192,56 zł	40 826,85 zł				33 192,56 zł																
MENTY																						
ły betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10	41 987,45 zł	51 644,56 zł			41 987,45 zł																	
stopy fundamentowe żelbetowe, Skrzydło C	360 987,45 zł	444 014,56 zł			360 987,45 zł																	
ndamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PŁYTA IKA	577 000,00 zł	709 710,00 zł			577 000,00 zł																	
żelbetowe piwnic	550 000,00 zł	676 500,00 zł				550 000,00 zł																
ropowa nad piwnicą Łącznika	256 111,97 zł	315 017,72 zł				256 111,97 zł																
CJE FUNDAMNETÓW I ŚCIAN PODZIEMIA	223 342,95 zł	274 711,83 zł				223 342,95 zł																
murowane - ZEWNĘTRZNE BUDYNKU																						
Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 0	35 007,16 zł	43 058,81 zł					35 007,16 zł															
Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 1	35 007,16 zł	43 058,81 zł						35 007,16 zł														
Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 2	35 007,16 zł	43 058,81 zł							35 007,16 zł													
Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 3	35 007,17 zł	43 058,82 zł								35 007,17 zł												
Ściany murowane ZEWNĘTRZNE - NADBUDOWY BUDYNKU B	63 666,25 zł	78 309,49 zł								63 666,25 zł												
ukcje żelbetowe monolityczne																						
Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 0	165 462,42 zł	203 518,78 zł					165 462,42 zł															
Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 1	165 462,43 zł	203 518,79 zł						165 462,43 zł														
Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 2	165 462,43 zł	203 518,79 zł							165 462,43 zł													
Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 3	165 462,43 zł	203 518,79 zł								165 462,43 zł												
Ściany , słupy, belki żelbetowe - Nadbudowa B	165 462,43 zł	203 518,79 zł							165 462,43 zł													
Płyta stropowa nad kondygnacją 0	126 813,80 zł	155 980,97 zł					126 813,80 zł															
Płyta stropowa nad kondygnacją 1	126 813,80 zł	155 980,97 zł						126 813,80 zł														
Płyta stropowa nad kondygnacją 2	126 813,80 zł	155 980,97 zł							126 813,80 zł													
Płyta stropowa nad kondygnacją 3	126 813,80 zł	155 980,97 zł								126 813,80 zł												
Płyta stropowa nad kondygnacją nadbudowy - budynek B	126 813,43 zł	155 980,52 zł							126 813,43 zł													
Y DZIAŁOWE																						
Ścianki działowe Poziom 0	64 952,50 zł	79 891,58 zł							64 952,50 zł													
Ścianki działowe Poziom 1	64 952,50 zł	79 891,58 zł							64 952,50 zł													
Ścianki działowe Poziom 2	64 952,50 zł	79 891,58 zł								64 952,50 zł												
Ścianki działowe Poziom 3	64 952,47 zł	79 891,54 zł									64 952,47 zł											
Ścianki działowe - BUDYNEK B NADBUDOWA	100 681,95 zł	123 838,80 zł									100 681,95 zł											
I DRZWI ZEWNĘTRZNE																						
Poziom 0	196 000,00 zł	241 080,00 zł							196 000,00 zł													
Poziom 1	196 000,00 zł	241 080,00 zł							196 000,00 zł													
Poziom 2	196 000,00 zł	241 080,00 zł								196 000,00 zł												
Poziom 3	196 000,00 zł	241 080,00 zł								196 000,00 zł												
Poziom Nadbudowa B	198 000,00 zł	243 540,00 zł								198 000,00 zł												
I DRZWI WEWNĘTRZNE																						
Poziom -1	11 447,11 zł	14 079,95 zł												11 447,11 zł								
Poziom 0	58 018,20 zł	71 362,39 zł												58 018,20 zł								
Poziom 1	58 018,20 zł	71 362,39 zł												58 018,20 zł								
Poziom 2	58 018,20 zł	71 362,39 zł														58 018,20 zł						
Poziom 3	58 018,20 zł	71 362,39 zł														65 049,00 zł						
Poziom Nadbudowa B	65 049,00 zł	80 010,27 zł																				
- POKRYCIE Budynek B																						
Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	111 354,07 zł	136 965,51 zł								111 354,07 zł												
Wykonanie papy nawierzchniowej	47 000,00 zł	57 810,00 zł									47 000,00 zł											
Obróbka papą kominków i attyk	13 000,00 zł	15 990,00 zł									13 000,00 zł											
Obróbki stalowe attyk i kominków	8 000,00 zł	9 840,00 zł										8 000,00 zł										
- POKRYCIE Budynek C																						
Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	96 619,98 zł	118 842,58 zł									96 619,98 zł											
Wykonanie papy nawierzchniowej	32 000,00 zł	39 360,00 zł										32 000,00 zł										
Obróbka papą kominków i attyk	9 000,00 zł	11 070,00 zł										9 000,00 zł										
Obróbki stalowe attyk i kominków	6 000,00 zł	7 380,00 zł										6 000,00 zł										
ONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU A																						
Ciśnieniowe czyszczenie i mycie dachu wodą zimną - silne czyszczenie	7 119,95 zł	8 757,54 zł					7 119,95 zł															
Dwukrotne malowanie grunto-emalią akrylową uprzednio oczyszczonej rzchni	29 602,35 zł	36 410,89 zł						29 602,35 zł														
ZADASZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	11 000,00 zł	13 530,00 zł											11 000,00 zł									
OBRÓBKA ZADASZENIA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ	17 529,70 zł	21 561,53 zł									17 529,70 zł											
cja - Skrzydło A																						
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja południowa	155 000,00 zł	190 650,00 zł					155 000,00 zł															
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja północna	155 000,00 zł	190 650,00 zł						155 000,00 zł														
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja zachodnia	40 000,00 zł	49 200,00 zł						40 000,00 zł														
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja wschodnia	40 000,00 zł	49 200,00 zł					40 000,00 zł															
Wykonanie tynku strukturalnego	45 000,00 zł	55 350,00 zł						45 000,00 zł														
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, zadaszenia nad wejściem do dla A	169 620,13 zł	208 632,76 zł					169 620,13 zł															
cja - SKRZYDŁO B																						
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja południowa	110 000,00 zł	135 300,00 zł								110 000,00 zł												
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja północna	110 000,00 zł	135 300,00 zł									110 000,00 zł											
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja zachodnia	43 000,00 zł	52 890,00 zł									43 000,00 zł											
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja wschodnia	43 000,00 zł	52 890,00 zł								43 000,00 zł												
Wykonanie tynku strukturalnego - Segment C	63 000,00 zł	77 490,00 zł									63 000,00 zł											
Podkonstrukcja pod elewację z blachy panelowej	100 000,00 zł	123 000,00 zł								100 000,00 zł												
Elewacja z blachy panelowej	114 078,34 zł	140 316,36 zł									114 078,34 zł											
acja - Skrzydło C																						
Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą	350 000,00 zł	430 500,00 zł									350 000,00 zł											
Wykonanie tynku strukturalnego	50 000,00 zł	61 500,00 zł									50 000,00 zł											
Montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod blachy cięto-ciegnionej	55 000,00 zł	67 650,00 zł									55 000,00 zł											
Montaż blachy cieto-ciagnionej	115 000,00 zł	141 450,00 zł											115 000,00 zł									
CI WEWNĘTRZNE																						
Tynki wewnętrzne - Poziom 0	61 885,54 zł	76 119,21 zł							61 885,54 zł													
Tynki wewnętrzne - Poziom 1	61 885,54 zł	76 119,21 zł								61 885,54 zł												
Tynki wewnętrzne - Poziom 2	61 885,54 zł	76 119,21 zł								61 885,54 zł												
Tynki wewnętrzne - Poziom 3	61 885,54 zł	76 119,21 zł										61 885,54 zł										
Tynki wewnętrzne - Nadbudowa B	61 885,54 zł	76 119,21 zł																				

PROREKTOR
ds. medycznych

| | | |

enikownia	148 723,92 zł	182 930,42 zł													148 723,92 zł								
szczenie techniczne	21 001,04 zł	25 831,28 zł													21 001,04 zł								
yzacja i woda lodowa - Budynek C																	34 567,10 zł						
Ułożenie instalacji - rury	34 567,10 zł	42 517,53 zł										64 878,57 zł											
Armatura	64 878,57 zł	79 800,64 zł														18 058,00 zł							
Montaż jednostek klimatyzatorów	18 058,00 zł	22 211,34 zł															139 086,96 zł						
Agregat chłodniczy zewnętrzny	139 086,96 zł	171 076,96 zł															15 476,25 zł						
Uruchomienie systemu chłodniczego wraz z wykonaniem próby	15 476,25 zł	19 035,79 zł																					
yzacja i woda lodowa - Budynek B												39 805,35 zł											
Ułożenie instalacji - rury	39 805,35 zł	48 960,58 zł														22 063,84 zł							
Armatura	22 063,84 zł	27 138,52 zł																33 466,58 zł					
Izolacje	33 466,58 zł	41 163,89 zł															14 859,90 zł						
Montaż jednostek klimatyzatorów	14 859,90 zł	18 277,68 zł															85 664,10 zł						
Dostawa klimakonwektorów	85 664,10 zł	105 366,84 zł															127 542,96 zł						
Agregat chłodniczy zewnętrzny agregat wody lodowej z freecoolingiem	127 542,96 zł	156 877,84 zł															15 476,25 zł						
Uruchomienie systemu chłodniczego wraz z wykonaniem próby	15 476,25 zł	19 035,79 zł																					
- Kanalizacja deszczowa																							
Wykopy	80 648,20 zł	99 197,29 zł		80 648,20 zł																			
Zasypanie wykopów	7 256,82 zł	8 925,89 zł		7 256,82 zł																			
Studnie	42 887,62 zł	52 751,77 zł		42 887,62 zł																			
Rurociągi	19 108,94 zł	23 504,00 zł		19 108,94 zł																			
Kanalizacja sanitarna	18 906,21 zł	23 254,64 zł			18 906,21 zł																		
Wodociąg zew.	9 883,45 zł	12 156,64 zł			9 883,45 zł																		
PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO	57 367,20 zł	70 561,66 zł			57 367,20 zł																		
ŻA ELEKTRYCZNA																							
do budynku + WPOŻ + BK																							
Ułożenie kabli w wykopie wraz z zasypką	76 704,89 zł	94 347,01 zł					76 704,89 zł																
Montaż skrzynek i rozdzielnic	35 120,76 zł	43 198,53 zł					35 120,76 zł																
Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do A	147 782,43 zł	181 772,39 zł												147 782,43 zł									
elnica główna RG	62 728,89 zł	77 156,53 zł												62 728,89 zł									
e bezpiecznikowe lokalne i UPS									36 184,38 zł														
Poziom 0	36 184,38 zł	44 506,79 zł							36 184,36 zł														
Poziom 1	36 184,36 zł	44 506,76 zł									36 184,36 zł												
Poziom 2	36 184,36 zł	44 506,76 zł									36 184,36 zł												
Poziom 3	36 184,36 zł	44 506,76 zł															36 184,36 zł						
Poziom Nadbudowa B	36 184,36 zł	44 506,76 zł																					
tlenie zewnętrzne terenu																							
Układanie okablowania	15 225,15 zł	18 726,93 zł							15 225,15 zł					29 618,93 zł									
Montaż latarń oświetleniowych	29 618,93 zł	36 431,28 zł												49 964,92 zł									
Montaż opraw zewnętrznych w murkach i chodnikach	49 964,92 zł	61 456,85 zł																					
acja oświetleniowa																							
Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 0	15 968,65 zł	19 641,44 zł						15 968,65 zł															
Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 1	15 968,65 zł	19 641,44 zł							15 968,65 zł														
Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 2	15 968,65 zł	19 641,44 zł								15 968,65 zł													
Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 3	15 968,67 zł	19 641,44 zł								15 968,67 zł													
Bruzdowanie i układanie przewodów Nadbudowa B	15 968,67 zł	19 641,46 zł										42 529,81 zł											
Rozdzielnice	42 529,81 zł	52 311,67 zł													96 333,45 zł								
Montaż opraw oświetleniowych Poziom 0	96 333,45 zł	118 490,14 zł													96 333,45 zł								
Montaż opraw oświetleniowych Poziom 1	96 333,45 zł	118 490,14 zł													96 333,45 zł								
Montaż opraw oświetleniowych Poziom 2	96 333,45 zł	118 490,14 zł														96 333,45 zł							
Montaż opraw oświetleniowych Poziom 3	96 333,45 zł	118 490,14 zł														96 333,46 zł							
Montaż opraw oświetleniowych Nadbudowa B	96 333,46 zł	118 490,16 zł																					
kablowe - koryta metalowe																							
Poziom 0	9 555,85 zł	11 753,70 zł						9 555,85 zł															
Poziom 1	9 555,85 zł	11 753,70 zł							9 555,85 zł														
Poziom 2	9 555,85 zł	11 753,70 zł							9 555,85 zł														
Poziom 3	9 555,85 zł	11 753,70 zł								9 555,85 zł													
Nadbudowa B	9 555,85 zł	11 753,70 zł								9 555,85 zł													
lacja siły + WLZ tablic lokalnych																							
Poziom 0	54 429,06 zł	66 947,74 zł						54 429,06 zł															
Poziom 1	54 429,06 zł	66 947,74 zł							54 429,06 zł														
Poziom 2	54 429,06 zł	66 947,74 zł							54 429,06 zł														
Poziom 3	54 429,06 zł	66 947,74 zł								54 429,06 zł													
Nadbudowa B	54 429,05 zł	66 947,73 zł								54 429,05 zł													
lacja okablowania strukturalnego - rozbudowa i nadbudowa																							
Poziom 0	102 484,56 zł	126 056,01 zł						102 484,56 zł															
Poziom 1	102 484,57 zł	126 056,02 zł							102 484,57 zł														
Poziom 2	102 484,57 zł	126 056,02 zł							102 484,57 zł														
Poziom 3	102 484,57 zł	126 056,02 zł								102 484,57 zł													
Nadbudowa B	102 484,57 zł	126 056,02 zł								102 484,57 zł													
Uruchomienie , konserwacja całości systemu	66 937,50 zł	82 333,13 zł										66 937,50 zł											
lacja okablowania strukturalnego - przebudowa skrzydła A i B																	78 053,89 zł						
Skrzydło A	78 053,89 zł	96 006,28 zł															78 053,89 zł						
Skrzydło B	78 053,89 zł	96 006,28 zł																					
lacja monitoringu CCTV - Alarmu - okablowanie																							
Poziom 0	14 558,68 zł	17 907,18 zł												14 558,68 zł									
Poziom 1	14 558,68 zł	17 907,18 zł												14 558,68 zł									
Poziom 2	14 558,68 zł	17 907,18 zł												14 558,68 zł									
Poziom 3	14 558,68 zł	17 907,18 zł												14 558,68 zł									
Nadbudowa B	14 558,68 zł	17 907,18 zł																					
lacja monitoringu CCTV - Alarmu - urządzenia																							
Poziom 0	36 151,78 zł	44 466,69 zł												36 151,78 zł									
Poziom 1	36 151,79 zł	44 466,70 zł												36 151,79 zł									
Poziom 2	36 151,79 zł	44 466,70 zł												36 151,79 zł									
Poziom 3	36 151,79 zł	44 466,70 zł												36 151,79 zł									
Nadbudowa B	36 151,79 zł	44 466,70 zł																					
ymianie klatek schodowych - rozbudowa i nadbudowa															29 239,05 zł								
Skrzydło C	29 239,05 zł	35 964,03 zł													29 239,05 zł								
Skrzydło B Nadbudowa	29 239,05 zł	35 964,03 zł																					
ymianie klatek schodowych - przebudowa skrzydła A i B	9 503,58 zł	11 689,40 zł							9 503,58 zł														
alacja odgromowa																							
dy poziome fundamentów	8 593,01 zł	10 569,40 zł				8 593,01 zł																	
dy pionowe	17 903,39 zł	22 021,17 zł								17 903,39 zł													
alacja odgromowa na dachu	7 809,14 zł	9 605,24 zł											7 809,14 zł										
taż iglic odgromowych	11 966,20 zł	14 718,43 zł											11 966,20 zł										
alacja przyzywowa	8 407,96 zł	10 341,79 zł													8 407,96 zł								
iary	15 305,22 zł	18 825,42 zł																15 305,22 zł					
- Przebudowa podziemnej linii optotelekomunikacyjnej Politechniki otokrzyskiej	7 169,24 zł	8 818,17 zł		7 169,24 zł																			
POSAŻENIE STAŁE																							
ŁY MONTAŻ																		32 730,06 zł					
Poziom 0	32 730,06 zł	40 257,97 zł																32 730,06 zł					
Poziom 1	32 730,06 zł	40 257,97 zł																32 730,06 zł					
Poziom 2	32 730,06 zł	40 257,97 zł																32 730,06 zł					
Poziom 3	32 730,04 zł	40 257,95 zł																32 730,04 zł					
Poziom Nadbudowa B																							
ESORIA SANITARNE - dozowniki, pojemniki																			20 670,39 zł				
Poziom 0	20 670,39 zł	25 424,58 zł																	20 670,39 zł				
Poziom 1	20 670,39 zł	25 424,58 zł																	20 670,39 zł				
Poziom 2	20 670,39 zł	25 424,58 zł																	20 670,39 zł				
Poziom 3	20 670,39 zł	25 424,58 zł																	20 670,38 zł				
Poziom Nadbudowa B	20 670,38 zł	25 424,57 zł																					27 602,87 zł
POSAŻENIE MEBLOWE	27 602,87 zł	33 951,53 zł																					23 065,04 zł
LETY WEWNĘTRZNE	23 065,04 zł	28 370,00 zł																					
			Wartość robót w rozbiciu na m-c (zł) netto	76 693,85 zł	407 902,82 zł	1 329 436,89 zł	1 179 928,74 zł	1 244 216,36 zł	915 676,37 zł	1 732 643,03 zł	2 532 673,49 zł	1 932 462,65 zł	1 255 549,38 zł	1 080 457,47 zł	976 147,89 zł	2 177 597,11 zł	465 387,67 zł	66 810,09 zł	651 653,91 zł	269 700,27 zł	223 510,28 zł	407 486,29 zł	50 697,91 zł	

Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający
Jolanta Mitręga

PROREKTOR
ds. medycznych
prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

Firma Budowlana
ANNA - BUD Sp. z o. o.
Bilcza, ul. Bukowa 2 B 26-026 Morawica
tel./fax 41 311 75 50

ZAŁĄCZNIK NR. 3 - TABELA RYCZAŁTOWA ROBÓT ETAP II

ZAKRES RZECZOWY I FINANSOWY ROBÓT

„ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGOWYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU UJK W KIELCACH"

Lp.	Wyszczególnienie robót	wartość wg umowy brutto (zł)	lis.18	gru.18	sty.19	lut.19	mar.19	kwi.19	maj.19	cze.19	lip.19	sie.19	wrz.19	paź.19	lis.19	gru.19	sty.20	lut.20	mar.20	kwi.20	maj.20	cze.20
	ETAP II - SUMA	23 341 221,04 zł																				
I	BRANŻA BUDOWLANA																					
I.1	PLAC BUDOWY																					
I.1.1	Organizacja placu budowy	18 450,00 zł		18 450,00 zł																		
I.1.2	Monitroniq drgań	43 050,00 zł							43 050,00 zł													
I.1.3	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 12.2018	32 826,55 zł		32 826,55 zł																		
I.1.4	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 01.2019	32 826,55 zł			32 826,55 zł																	
I.1.5	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 02.2019	32 826,55 zł				32 826,55 zł																
I.1.6	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 03.2019	32 826,55 zł					32 826,55 zł															
I.1.7	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 04.2019	32 826,55 zł						32 826,55 zł														
I.1.8	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 05.2019	32 826,55 zł							32 826,55 zł													
I.1.9	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 06.2019	32 826,55 zł								32 826,55 zł												
I.1.10	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 07.2019	32 826,55 zł									32 826,55 zł											
I.1.11	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 08.2019	32 826,55 zł										32 826,55 zł										
I.1.12	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 09.2019	32 826,55 zł											32 826,55 zł									
I.1.13	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 10.2019	32 826,55 zł												32 826,55 zł								
I.1.14	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 11.2019	32 826,55 zł													32 826,55 zł							
I.1.15	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 12.2019	32 826,55 zł														32 826,55 zł						
I.1.16	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 01.2020	32 826,55 zł															32 826,55 zł					
I.1.17	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 02.2020	32 826,55 zł																32 826,55 zł				
I.1.18	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 03.2020	32 826,55 zł																	32 826,55 zł			
I.1.19	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 04.2020	32 826,55 zł																		32 826,55 zł		
I.1.20	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 05.2020	32 826,51 zł																			32 826,51 zł	
I.1.21	Dzierżawa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c Luty 2019	92 250,00 zł				92 250,00 zł																
I.1.22	Dzierżawa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c Marzec 2019	92 250,00 zł					92 250,00 zł															
I.1.23	Dzierżawa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c Kwiecień 2019	92 250,00 zł						92 250,00 zł														
I.1.24	Dzierżawa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c Maj 2019	92 250,00 zł							92 250,00 zł													
I.1.25	Dzierżawa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c Czerwiec 2019	92 250,00 zł								92 250,00 zł												
I.1.26	Dzierżawa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c Lipiec 2019	92 250,00 zł									92 250,00 zł											
I.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO (SALA GIMNASTYCZNA, MAGAZYN, SZATNIE, WC I ŁAZIENKA)																					
I.2.1	Rozbiórka wraz z utylizacją gruzu budynku Sali gimnastycznej oraz wiaty śmietnikowej	94 333,44 zł		94 333,44 zł																		
I.2.2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KANAŁ WENTYLACYJNY WRAZ Z CZERPNIĄ TERENOWA	9 595,86 zł		9 595,86 zł																		
I.2.3	ROZBIÓRKA ISTNIEJACEGO DACHU W SKRZYDLE B	168 667,64 zł						168 667,64 zł														
I.2.4	ROZBIÓRKA ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ SKRZYDŁA B	5 690,42 zł					5 690,42 zł															
I.3	ROBOTY ZIEMNE																					
I.3.1	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW I KRZEWÓW	9 840,00 zł		9 840,00 zł																		
I.3.2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 8 cm, krawężników, murów ogrodzeniowych	57 226,19 zł		57 226,19 zł																		
I.3.3	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś A-D/1-do skrzydła A i B	189 809,76 zł		189 809,76 zł																		
I.3.4	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś D-H/1- 4	190 809,76 zł			190 809,76 zł																	
I.3.5	Zasypywanie wykopów w gruncie kat. IV	40 195,80 zł				40 195,80 zł																
I.4	FUNDAMENTY																					
I.4.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10	51 644,56 zł				51 644,56 zł																
I.4.2	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, Skrzydło C	444 014,56 zł				444 014,56 zł																
I.4.3	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PŁYTA ŁĄCZNIKA	709 710,00 zł			709 710,00 zł																	
I.4.4	Ściany żelbetowe piwnic	676 500,00 zł				676 500,00 zł																
I.4.5	Płyta stropowa nad piwnicą Łącznika	315 017,72 zł					315 017,72 zł															
I.4.6	IZOLACJE FUNDAMNETÓW I ŚCIAN PODZIEMIA	274 711,83 zł				274 711,83 zł																
I.5	Ściany murowane - ZEWNĘTRZNE BUDYNKU																					
I.5.1	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 0	43 058,81 zł						43 058,81 zł														
I.5.2	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 1	43 058,81 zł							43 058,81 zł													
I.5.3	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 2	43 058,81 zł								43 058,81 zł												
I.5.4	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 3	43 058,82 zł								43 058,82 zł												
I.5.5	Ściany murowane ZEWNĘTRZNE - NADBUDOWY BUDYNKU B	78 309,49 zł								78 309,49 zł												
I.6	Konstrukcje żelbetowe monolityczne																					
I.6.1	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 0	203 518,78 zł					203 518,78 zł															
I.6.2	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 1	203 518,79 zł						203 518,79 zł														
I.6.3	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 2	203 518,79 zł							203 518,79 zł													
I.6.4	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 3	203 518,79 zł								203 518,79 zł												
I.6.5	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Nadbudowa B	203 518,79 zł							203 518,79 zł													
I.6.6	Płyta stropowa nad kondygnacją 0	155 980,97 zł					155 980,97 zł															
I.6.7	Płyta stropowa nad kondygnacją 1	155 980,97 zł						155 980,97 zł														
I.6.8	Płyta stropowa nad kondygnacją 2	155 980,97 zł							155 980,97 zł													
I.6.9	Płyta stropowa nad kondygnacją 3	155 980,97 zł								155 980,97 zł												
I.6.10	Płyta stropowa nad kondygnacją nadbudowy - budynek B	155 980,52 zł							155 980,52 zł													
I.7	ŚCIANY DZIAŁOWE																					
I.7.1	Ścianki działowe Poziom 0	79 891,58 zł							79 891,58 zł													
I.7.2	Ścianki działowe Poziom 1	79 891,58 zł							79 891,58 zł													
I.7.3	Ścianki działowe Poziom 2	79 891,58 zł								79 891,58 zł												
I.7.4	Ścianki działowe Poziom 3	79 891,54 zł									79 891,54 zł											
I.7.5	Ścianki działowe - BUDYNEK B NADBUDOWA	123 838,80 zł									123 838,80 zł											
I.8	OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE																					
I.8.1	Poziom 0	241 080,00 zł								241 080,00 zł												
I.8.2	Poziom 1	241 080,00 zł								241 080,00 zł												
I.8.3	Poziom 2	241 080,00 zł									241 080,00 zł											
I.8.4	Poziom 3	241 080,00 zł									241 080,00 zł											
I.8.5	Poziom Nadbudowa B	243 540,00 zł									243 540,00 zł											
I.9	OKNA I DRZWI WEWNĘTRZNE																					
I.9.1	Poziom -1	14 079,95 zł												14 079,95 zł								
I.9.2	Poziom 0	71 362,39 zł												71 362,39 zł								
I.9.3	Poziom 1	71 362,39 zł												71 362,39 zł								
I.9.4	Poziom 2	71 362,39 zł												71 362,39 zł								
I.9.5	Poziom 3	71 362,39 zł													71 362,39 zł							
I.9.6	Poziom Nadbudowa B	80 010,27 zł													80 010,27 zł							
I.10	DACH - POKRYCIE Budynek B																					
I.10.1	Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	136 965,51 zł									136 965,51 zł											
I.10.2	Wykonanie papy nawierzchniowej	57 810,00 zł									57 810,00 zł											
I.10.3	Obróbka papą kominków i attyk	15 990,00 zł										15 990,00 zł										
I.10.4	Obróbki stalowe attyk i kominków	9 840,00 zł										9 840,00 zł										
I.11	DACH - POKRYCIE Budynek C																					
I.11.1	Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	118 842,58 zł									118 842,58 zł											
I.11.2	Wykonanie papy nawierzchniowej	39 360,00 zł										39 360,00 zł										
I.11.3	Obróbka papą kominków i attyk	11 070,00 zł										11 070,00 zł										
I.11.4	Obróbki stalowe attyk i kominków	7 380,00 zł										7 380,00 zł										
I.12	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU A																					
I.12.1	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie dachu wodą zimną - silne zanieczyszczenie	8 757,54 zł						8 757,54 zł														
I.12.2	Dwukrotne malowanie grunto-emalią akrylową uprzednio oczyszczonej powierzchni	36 410,89 zł						36 410,89 zł														
I.12.3	ZADASZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	13 530,00 zł											13 530,00 zł									
I.12.4	OBRÓBKA ZADASZENIA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ	21 561,53 zł									21 561,53 zł											

| | | |

lacja - Montaż urządzeń na dachu																							
Montaż centrali wentylacyjnej N1/W1	24 547,21 zł											24 547,21 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N2/W2	35 079,07 zł											35 079,07 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N3/W3	22 649,91 zł											22 649,91 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N4/W4	22 649,91 zł											22 649,91 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N5/W5	24 257,97 zł											24 257,97 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N6/W6	22 649,91 zł											22 649,91 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N7/W7	23 910,50 zł											23 910,50 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N8/W8	22 649,91 zł											22 649,91 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N9/W9	27 900,21 zł											27 900,21 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N10/W10	28 331,78 zł											28 331,78 zł											
Montaż centrali wentylacyjnej N11/W11	27 816,17 zł											27 816,17 zł											
Montaż automatyki do central wentylacyjnych	117 072,79 zł												117 072,79 zł										
Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod cenrtale wentylacyjne i y chłodnicze	22 150,09 zł										22 150,09 zł												
Wentylatory dachowe	130 380,00 zł												130 380,00 zł										
Tłumiki	43 050,00 zł												43 050,00 zł										
acja - Izolacja kanałów																							
Poziom 0	61 975,99 zł											61 975,99 zł											
Poziom 1	61 975,99 zł											61 975,99 zł											
Poziom 2	61 975,99 zł											61 975,99 zł											
Poziom 3	61 975,99 zł											61 975,99 zł											
Poziom Nadbudowa B	61 975,99 zł											61 975,99 zł											
Dach	61 976,03 zł												61 976,03 zł										
ja c.o.																							
Rurociągi - Poziom 0	38 130,00 zł										38 130,00 zł												
Rurociągi - Poziom 1	38 130,00 zł										41 820,00 zł												
Rurociągi - Poziom 2	38 130,00 zł								38 130,00 zł														
Rurociągi - Poziom 3	38 130,00 zł								38 130,00 zł														
Rurociągi - Nadbudowa B	41 820,00 zł																						
rmatura	15 589,18 zł													15 589,18 zł									
olacje	22 140,00 zł													22 140,00 zł									
rzejniki	45 193,04 zł														45 193,04 zł								
a gazu	7 803,78 zł											7 803,78 zł											
a c.t.	36 553,61 zł												36 553,61 zł										
kownia	182 930,42 zł															182 930,42 zł							
czenie techniczne	25 831,28 zł															25 831,28 zł							
acja i woda lodowa - Budynek C																							
łożenie instalacji - rury	42 517,53 zł																42 517,53 zł						
rmatura	79 800,64 zł											79 800,64 zł											
ontaż jednostek klimatyzatorów	22 211,34 zł															22 211,34 zł							
gregat chłodniczy zewnętrzny	171 076,96 zł																171 076,96 zł						
rochomienie systemu chłodniczego wraz z wykonaniem próby	19 035,79 zł																19 035,79 zł						
acja i woda lodowa - Budynek B																							
łożenie instalacji - rury	48 960,58 zł											48 960,58 zł											
rmatura	27 138,52 zł															27 138,52 zł							
olacje	41 163,89 zł																41 163,89 zł						
ontaż jednostek klimatyzatorów	18 277,68 zł																18 277,68 zł						
stawa klimakonwektorów	105 366,84 zł																105 366,84 zł						
gregat chłodniczy zewnętrzny agregat wody lodowej z freecoolingiem	156 877,84 zł																156 877,84 zł						
uchomienie systemu chłodniczego wraz z wykonaniem próby	19 035,79 zł																19 035,79 zł						
nalizacja deszczowa																							
ykopy	99 197,28 zł		99 197,28 zł																				
sypanie wykopów	8 925,89 zł		8 925,89 zł																				
dnie	52 751,77 zł		52 751,77 zł																				
rociągi	23 504,00 zł		23 504,00 zł																				
nalizacja sanitarna	23 254,64 zł			23 254,64 zł																			
docią zew.	12 156,64 zł			12 156,64 zł																			
ZEBUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO	70 561,66 zł			70 561,66 zł																			
ELEKTRYCZNA																							
udynku + WPOŻ + BK																							
enie kabli w wykopie wraz z zasypką	94 347,01 zł																						
aż skrzynek i rozdzielnic	43 198,53 zł										94 347,01 zł												
aż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 300kVA	181 772,39 zł										43 198,53 zł												
ca główna RG	77 156,53 zł													181 772,39 zł									
zpiecznikowe lokalne i UPS														77 156,53 zł									
om 0	44 506,79 zł																						
om 1	44 506,76 zł												44 506,79 zł										
om 2	44 506,76 zł												44 506,76 zł										
om 3	44 506,76 zł											44 506,76 zł											
om Nadbudowa B	44 506,76 zł											44 506,76 zł											
e zewnętrzne terenu																							
lanie okablowania	18 726,93 zł																						
aż latarń oświetleniowych	36 431,28 zł																44 506,76 zł						
aż opraw zewnętrznych w murkach i chodnikach	61 456,85 zł										18 726,93 zł												
oświetleniowa														36 431,28 zł									
owanie i układanie przewodów Poziom 0	19 641,44 zł													61 456,85 zł									
owanie i układanie przewodów Poziom 1	19 641,44 zł										19 641,44 zł												
owanie i układanie przewodów Poziom 2	19 641,44 zł											19 641,44 zł											
owanie i układanie przewodów Poziom 3	19 641,44 zł											19 641,44 zł											
owanie i układanie przewodów Nadbudowa B	19 641,46 zł												19 641,46 zł										
zielnice	52 311,67 zł													52 311,67 zł									
ż opraw oświetleniowych Poziom 0	118 490,14 zł														118 490,14 zł								
ż opraw oświetleniowych Poziom 1	118 490,14 zł														118 490,14 zł								
ż opraw oświetleniowych Poziom 2	118 490,14 zł														118 490,14 zł								
ż opraw oświetleniowych Poziom 3	118 490,14 zł															118 490,14 zł							
ż opraw oświetleniowych Nadbudowa B	118 490,16 zł															118 490,16 zł							
owe - koryta metalowe																							
n 0	11 753,70 zł										11 753,70 zł												
n 1	11 753,70 zł											11 753,70 zł											
n 2	11 753,70 zł												11 753,70 zł										
n 3	11 753,70 zł												11 753,70 zł										
dowa B	11 753,70 zł																						
ły + WLZ tablic lokalnych																							
n 0	66 947,74 zł										66 947,74 zł												
n 1	66 947,74 zł											66 947,74 zł											
n 2	66 947,74 zł												66 947,74 zł										
n 3	66 947,74 zł												66 947,74 zł										
dowa B	66 947,73 zł																						
kablowania strukturalnego - rozbudowa i nadbudowa																							
n 0	126 056,01 zł										126 056,01 zł												
n 1	126 056,02 zł											126 056,02 zł											
n 2	126 056,02 zł												126 056,02 zł										
n 3	126 056,02 zł												126 056,02 zł										
dowa B	126 056,02 zł																						
mienie , konserwacja całości systemu	82 333,13 zł																						

Instalacja okablowania strukturalnego - przebudowa skrzydła A i B																		96 006,28 zł					
Skrzydło A	96 006,28 zł																	96 006,28 zł					
Skrzydło B	96 006,28 zł																						
Instalacja monitoringu CCTV - Alarmu - okablowanie													17 907,18 zł										
Poziom 0	17 907,18 zł												17 907,18 zł										
Poziom 1	17 907,18 zł												17 907,18 zł										
Poziom 2	17 907,18 zł												17 907,18 zł										
Poziom 3	17 907,18 zł												17 907,18 zł										
Nadbudowa B																							
Instalacja monitoringu CCTV - Alarmu - urządzenia	44 466,69 zł												44 466,69 zł										
Poziom 0	44 466,70 zł												44 466,70 zł										
Poziom 1	44 466,70 zł												44 466,70 zł										
Poziom 2	44 466,70 zł												44 466,70 zł										
Poziom 3	44 466,70 zł												44 466,70 zł										
Nadbudowa B																							
Oddymianie klatek schodowych - rozbudowa i nadbudowa	35 964,03 zł													35 964,03 zł									
Skrzydło C	35 964,03 zł													35 964,03 zł									
Skrzydło B Nadbudowa	11 689,40 zł								11 689,40 zł														
Oddymianie klatek schodowych - przebudowa skrzydła A i B																							
Instalacja odgromowa	10 569,40 zł				10 569,40 zł																		
Zwody poziome fundamentów	22 021,17 zł									22 021,17 zł													
Zwody pionowe	9 605,24 zł											9 605,24 zł											
Instalacja odgromowa na dachu	14 718,43 zł											14 718,43 zł											
Montaż iglic odgromowych	10 341,79 zł													10 341,79 zł									
Instalacja przyzywowa	18 825,42 zł																			18 825,42 zł			
Pomiary																							
Sieci - Przebudowa podziemnej linii optotelekomunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej	8 818,17 zł		8 818,17 zł																				
WYPOSAŻENIE STAŁE																				40 257,97 zł			
BIAŁY MONTAŻ	40 257,97 zł																			40 257,97 zł			
Poziom 0	40 257,97 zł																			40 257,97 zł			
Poziom 1	40 257,97 zł																			40 257,97 zł			
Poziom 2	40 257,97 zł																			40 257,95 zł			
Poziom 3	40 257,95 zł																						
Poziom Nadbudowa B																					25 424,58 zł		
AKCESORIA SANITARNE - dozowniki, pojemniki	25 424,58 zł																				25 424,58 zł		
Poziom 0	25 424,58 zł																				25 424,58 zł		
Poziom 1	25 424,58 zł																				25 424,58 zł		
Poziom 2	25 424,58 zł																				25 424,57 zł		
Poziom 3	25 424,57 zł																					33 951,53 zł	
Poziom Nadbudowa B	33 951,53 zł																					28 370,00 zł	
WYPOSAŻENIE MEBLOWE	28 370,00 zł																						
ROLETY WEWNĘTRZNE																							
Wartość robót w rozbiciu na m-c (zł) brutto		**- zł**	**605 278,91 zł**	**1 039 319,25 zł**	**1 622 712,70 zł**	**1 167 827,10 zł**	**1 448 379,18 zł**	**1 978 630,93 zł**	**2 224 252,67 zł**	**3 248 540,04 zł**	**2 042 842,65 zł**	**1 086 935,85 zł**	**1 485 566,51 zł**	**2 773 843,41 zł**	**572 426,84 zł**	**82 176,41 zł**	**801 534,30 zł**	**331 731,33 zł**	**274 917,63 zł**	**491 983,10 zł**	**62 321,53 zł**		

SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji
inż. Wojciech Kundera

PROREKTOR
ds. medycznych

ZAŁĄCZNIK NR. 4A HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY - ETAP II

	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
	ETAP II	**23 341 221,04 zł**	**czw, 08.11.18**	**pią, 26.06.20**
	BRANŻA BUDOWLANA	**15 752 017,33 zł**	**czw, 08.11.18**	**czw, 28.05.20**
	PLAC BUDOWY	**1 205 877,86 zł**	**czw, 08.11.18**	**czw, 28.05.20**
4	Organizacja placu budowy	18 450,00 zł	czw, 08.11.18	pią, 14.12.18
5	Monitoring drgań	43 050,00 zł	pon, 07.01.19	pią, 31.05.19
6	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 12.2018	32 826,55 zł	sob, 01.12.18	pon, 31.12.18
7	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 1.2019	32 826,55 zł	wto, 01.01.19	śro, 30.01.19
8	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 2.2019	32 826,55 zł	pią, 01.02.19	czw, 28.02.19
9	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 3.2019	32 826,55 zł	pią, 01.03.19	czw, 28.03.19
10	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 4.2019	32 826,55 zł	pon, 01.04.19	pią, 26.04.19
11	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 5.2019	32 826,55 zł	śro, 01.05.19	wto, 28.05.19
12	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 6.2019	32 826,55 zł	sob, 01.06.19	czw, 27.06.19
13	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 7.2019	32 826,55 zł	pon, 01.07.19	pią, 26.07.19
14	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 8.2019	32 826,55 zł	czw, 01.08.19	śro, 28.08.19
15	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 9.2019	32 826,55 zł	nie, 01.09.19	czw, 26.09.19
16	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 10.2019	32 826,55 zł	wto, 01.10.19	pon, 28.10.19
17	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 11.2019	32 826,55 zł	pią, 01.11.19	czw, 28.11.19
18	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 12.2019	32 826,55 zł	nie, 01.12.19	czw, 26.12.19
19	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 1.2020	32 826,55 zł	śro, 01.01.20	wto, 28.01.20
20	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 2.2020	32 826,55 zł	sob, 01.02.20	czw, 27.02.20
21	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 3.2020	32 826,55 zł	nie, 01.03.20	czw, 26.03.20
22	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 4.2020	32 826,55 zł	śro, 01.04.20	wto, 28.04.20
23	Opłaty administracyjne związane z prowadzeniem budowy za m-c 5.2020	32 826,51 zł	pią, 01.05.20	czw, 28.05.20
24	Dzierżąwa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c 2.2019	92 250,00 zł	pon, 07.01.19	sob, 29.06.19
25	Dzierżąwa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c 3.2019	92 250,00 zł	pon, 07.01.19	sob, 29.06.19
26	Dzierżąwa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c 4.2019	92 250,00 zł	pon, 07.01.19	sob, 29.06.19
27	Dzierżąwa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c 5.2019	92 250,00 zł	pon, 07.01.19	sob, 29.06.19
28	Dzierżąwa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c 6.2019	92 250,00 zł	pon, 07.01.19	sob, 29.06.19
29	Dzierżąwa, montaż i praca żurawia wieżowego w m-c 7.2019	92 250,00 zł	pon, 07.01.19	sob, 29.06.19
30	**ROBOTY ROZBIÓRKOWE**	**278 287,36 zł**	**śro, 21.11.18**	**wto, 30.04.19**
31	Rozbiórka wraz z utylizacją gruzu budynku Sali gimnastycznej oraz wiaty śmietnikowej	94 333,44 zł	śro, 21.11.18	pią, 21.12.18
32	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - KANAŁ WENTYLACYJNY WRAZ Z CZERPNIĄ TERENOWĄ	9 595,86 zł	pon, 03.12.18	pią, 14.12.18
34	ROZBIÓRKA ISTNIEJACEGO DACHU W SKRZYDLE B	168 667,64 zł	pon, 04.03.19	wto, 30.04.19
36	ROZBIÓRKA ŚCIANY KLATKI SCHODOWEJ SKRZYDŁA B	5 690,42 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19
38	**ROBOTY ZIEMNE**	**487 881,51 zł**	**pon, 26.11.18**	**pią, 22.02.19**
39	MECHANICZNE ŚCINANIE DRZEW I KRZEWÓW	9 840,00 zł	pon, 17.12.18	pią, 28.12.18
40	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej o wys. 8 cm, krawężników, murów ogrodzeniowych	57 226,19 zł	pon, 03.12.18	pią, 14.12.18
41	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś A-D/1-do skrzydła A i B	189 809,76 zł	pon, 26.11.18	pią, 07.12.18
42	Wykonanie wykopów koparkami podsiębiernymi Skrzydło C oś D-H/1- 4	190 809,76 zł	pon, 03.12.18	pią, 11.01.19
43	Zasypywanie wykopów w gruncie kat. IV	40 195,80 zł	pon, 14.01.19	pią, 22.02.19
44	**FUNDAMENTY**	**2 471 598,67 zł**	**śro, 05.12.18**	**pią, 15.03.19**
45	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C8/10	51 644,56 zł	śro, 05.12.18	pią, 22.02.19
46	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, Skrzydło C	444 014,56 zł	pon, 07.01.19	pią, 22.02.19
47	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - PŁYTA ŁĄCZNIKA	709 710,00 zł	pon, 17.12.18	pią, 11.01.19
48	Ściany żelbetowe piwnic	676 500,00 zł	pon, 14.01.19	czw, 14.02.19
49	Płyta stropowa nad piwnicą łącznika	315 017,72 zł	pon, 04.02.19	pią, 15.03.19
50	IZOLACJE FUNDAMNETÓW I ŚCIAN PODZIEMIA	274 711,83 zł	pon, 04.02.19	pią, 15.02.19
52	**KONSTRUKCJE NADZIEMIA WYKONYWANE KOMPLEKSOWO**	**4 078 847,94 zł**	**pon, 04.03.19**	**śro, 13.11.19**
53	**Ściany murowane - ZEWNĘTRZNE BUDYNKU**	**250 544,74 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.06.19**
54	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 0	43 058,81 zł	pon, 04.03.19	pon, 15.04.19
55	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 1	43 058,81 zł	pon, 29.04.19	pią, 10.05.19
56	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 2	43 058,81 zł	pon, 20.05.19	pon, 03.06.19
57	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Poziom 3	43 058,82 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
58	Ściany budynków wielokondygnacyjnych - Nadbudowa B	78 309,49 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
59	**Konstrukcje żelbetowe monolityczne**	**1 797 498,34 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.06.19**
60	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 0	203 518,78 zł	pon, 04.03.19	pią, 22.03.19
61	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 1	203 518,79 zł	pon, 01.04.19	pią, 19.04.19
62	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 2	203 518,79 zł	pon, 29.04.19	pią, 17.05.19
63	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Poziom 3	203 518,79 zł	pon, 27.05.19	pią, 14.06.19
64	Ściany , słupy, belki żelbetowe - Nadbudowa B	203 518,79 zł	pon, 15.04.19	pią, 24.05.19
65	Płyta stropowa nad kondygnacją 0	155 980,97 zł	pon, 25.03.19	pią, 29.03.19
66	Płyta stropowa nad kondygnacją 1	155 980,97 zł	pon, 22.04.19	pią, 26.04.19
67	Płyta stropowa nad kondygnacją 2	155 980,97 zł	pon, 20.05.19	sob, 25.05.19
68	Płyta stropowa nad kondygnacją 3	155 980,97 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19

PROJEKTOR medycznych mgr inż. Stanisław Głuszek

II.9	Instalacja okablowania strukturalnego - przebudowa skrzydła A i B			

ZAŁĄCZNIK NR. 4A HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY - ETAP II

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
69	Płyta stropowa nad kondygnacją nadbudowy - budynek B	155 980,52 zł	pon, 13.05.19	pią, 24.05.19
70	**ŚCIANY DZIAŁOWE**	**443 405,08 zł**	**pon, 22.04.19**	**pią, 26.07.19**
71	Ścianki działowe Poziom 0	79 891,58 zł	pon, 22.04.19	pią, 03.05.19
72	Ścianki działowe Poziom 1	79 891,58 zł	pon, 20.05.19	pią, 31.05.19
73	Ścianki działowe Poziom 2	79 891,58 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
74	Ścianki działowe Poziom 3	79 891,54 zł	pon, 15.07.19	pią, 26.07.19
75	Ścianki działowe Nadbudowa B	123 838,80 zł	pon, 15.07.19	pią, 26.07.19
76	**OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE**	**1 207 860,00 zł**	**pon, 27.05.19**	**pią, 19.07.19**
77	Poziom 0	241 080,00 zł	pon, 27.05.19	pią, 07.06.19
78	Poziom 1	241 080,00 zł	pon, 03.06.19	pią, 14.06.19
79	Poziom 2	241 080,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 05.07.19
80	Poziom 3	241 080,00 zł	pon, 01.07.19	pią, 12.07.19
81	Poziom Nadbudowa B	243 540,00 zł	pon, 08.07.19	pią, 19.07.19
82	**OKNA I DRZWI WEWNĘTRZNE**	379 539,78 zł	**pon, 07.10.19**	**śro, 13.11.19**
83	Poziom -1	14 079,95 zł	pon, 07.10.19	pią, 11.10.19
84	Poziom 0	71 362,39 zł	śro, 09.10.19	pią, 18.10.19
85	Poziom 1	71 362,39 zł	pon, 14.10.19	śro, 23.10.19
86	Poziom 2	71 362,39 zł	pon, 21.10.19	śro, 30.10.19
87	Poziom 3	71 362,39 zł	pon, 28.10.19	śro, 06.11.19
88	Poziom Nadbudowa B	80 010,27 zł	pon, 04.11.19	śro, 13.11.19
89	**DACH - POKRYCIE Budynek B**	220 605,51 zł	**pon, 01.07.19**	**pią, 23.08.19**
90	Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	136 965,51 zł	pon, 01.07.19	pią, 19.07.19
91	Wykonanie papy nawierzchniowej	57 810,00 zł	pon, 15.07.19	pią, 26.07.19
92	Obróbka papą kominków i attyk	15 990,00 zł	pon, 29.07.19	pią, 09.08.19
93	Obróbki stalowe attyk i kominków	9 840,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 23.08.19
94	**DACH - POKRYCIE Budynek C**	**176 652,58 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 30.08.19**
95	Wykonanie izolacji cieplnej oraz papy podkładowej	118 842,58 zł	pon, 01.07.19	pią, 19.07.19
96	Wykonanie papy nawierzchniowej	39 360,00 zł	pon, 22.07.19	pią, 09.08.19
97	Obróbka papą kominków i attyk	11 070,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 23.08.19
98	Obróbki stalowe attyk i kominków	7 380,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 30.08.19
99	**REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU A**	**45 168,43 zł**	**pon, 01.04.19**	**pon, 29.04.19**
100	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie dachu wodą zimną - silne zanieczyszczenie	8 757,54 zł	pon, 01.04.19	pią, 12.04.19
101	Dwukrotne malowanie grunto-emalią akrylową uprzednio oczyszczonej powierzchni - praca na wysokości 10-20 m	36 410,89 zł	pią, 12.04.19	pon, 29.04.19
102	ZADASZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO	13 530,00 zł	pon, 09.09.19	pią, 27.09.19
104	OBRÓBKA ZADASZENIA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ SKRZYDŁA B wg. rys. A-89	21 561,53 zł	pon, 01.07.19	pią, 26.07.19
106	**Elewacja - Skrzydło A**	**743 682,76 zł**	**pon, 25.03.19**	**pią, 10.05.19**
107	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja południowa	190 650,00 zł	pon, 25.03.19	pią, 12.04.19
108	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja północna	190 650,00 zł	pon, 22.04.19	pią, 10.05.19
109	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja zachodnia	49 200,00 zł	pon, 22.04.19	pią, 10.05.19
110	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja wschodnia	49 200,00 zł	pon, 25.03.19	pią, 12.04.19
111	Wykonanie tynku strukturalnego	55 350,00 zł	pon, 29.04.19	pią, 10.05.19
112	Konstrukcja podparć, zawieszeń i osłon zadaszenia nad wejściem do Skrzydła A	208 632,76 zł	pon, 25.03.19	pią, 12.04.19
113	**Elewacja - SKRZYDŁO B**	717 186,36 zł	**pon, 17.06.19**	**pią, 16.08.19**
114	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja południowa	135 300,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
115	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja północna	135 300,00 zł	pon, 22.07.19	pią, 09.08.19
116	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja zachodnia	52 890,00 zł	pon, 29.07.19	pią, 16.08.19
117	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Elewacja wschodnia	52 890,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
118	Wykonanie tynku strukturalnego - Segment C	77 490,00 zł	pon, 22.07.19	pią, 09.08.19
119	Podkonstrukcja pod elewację z blachy panelowej	123 000,00 zł	pon, 17.06.19	pią, 12.07.19
120	Elewacja z blachy panelowej	140 316,36 zł	pon, 22.07.19	pią, 16.08.19
121	**Elewacja - Skrzydło C**	**701 100,00 zł**	**czw, 27.06.19**	**pią, 20.09.19**
122	Wykonanie ocieplenia wraz z warstwą zbrojącą - Segment C	430 500,00 zł	pon, 01.07.19	pią, 26.07.19
123	Wykonanie tynku strukturalnego - Segment C	61 500,00 zł	pon, 05.08.19	pią, 16.08.19
124	Montaż konstrukcji stalowej wsporczej pod blachy cięto-cięgnionej	67 650,00 zł	czw, 27.06.19	śro, 03.07.19
125	Montaż blachy cieto-ciagnionej	141 450,00 zł	pon, 02.09.19	pią, 20.09.19
126	**PRACE WYKOŃCZENIOWE**	**3 932 840,43 zł**	**pon, 20.05.19**	**wto, 19.05.20**
127	**TYNKI WEWNĘTRZNE**	**380 596,05 zł**	**pon, 20.05.19**	**pią, 09.08.19**
128	Tynki wewnętrzne - Poziom 0	76 119,21 zł	pon, 20.05.19	pią, 31.05.19
129	Tynki wewnętrzne - Poziom 1	76 119,21 zł	pon, 03.06.19	pią, 14.06.19
130	Tynki wewnętrzne - Poziom 2	76 119,21 zł	pon, 24.06.19	pią, 05.07.19
131	Tynki wewnętrzne - Poziom 3	76 119,21 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
132	Tynki wewnętrzne - Nadbudowa B	76 119,21 zł	pon, 29.07.19	pią, 09.08.19
133	**OBLICOWANIA ŚCIAN Z PŁYTEK**	**293 116,67 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 13.09.19**
134	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Poziom 0	58 623,31 zł	pon, 01.07.19	pią, 19.07.19
135	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Poziom 1	58 623,34 zł	pon, 22.07.19	pią, 09.08.19
136	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Poziom 2	58 623,34 zł	pon, 12.08.19	pią, 30.08.19
137	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Poziom 3	58 623,34 zł	pon, 02.09.19	pią, 13.09.19

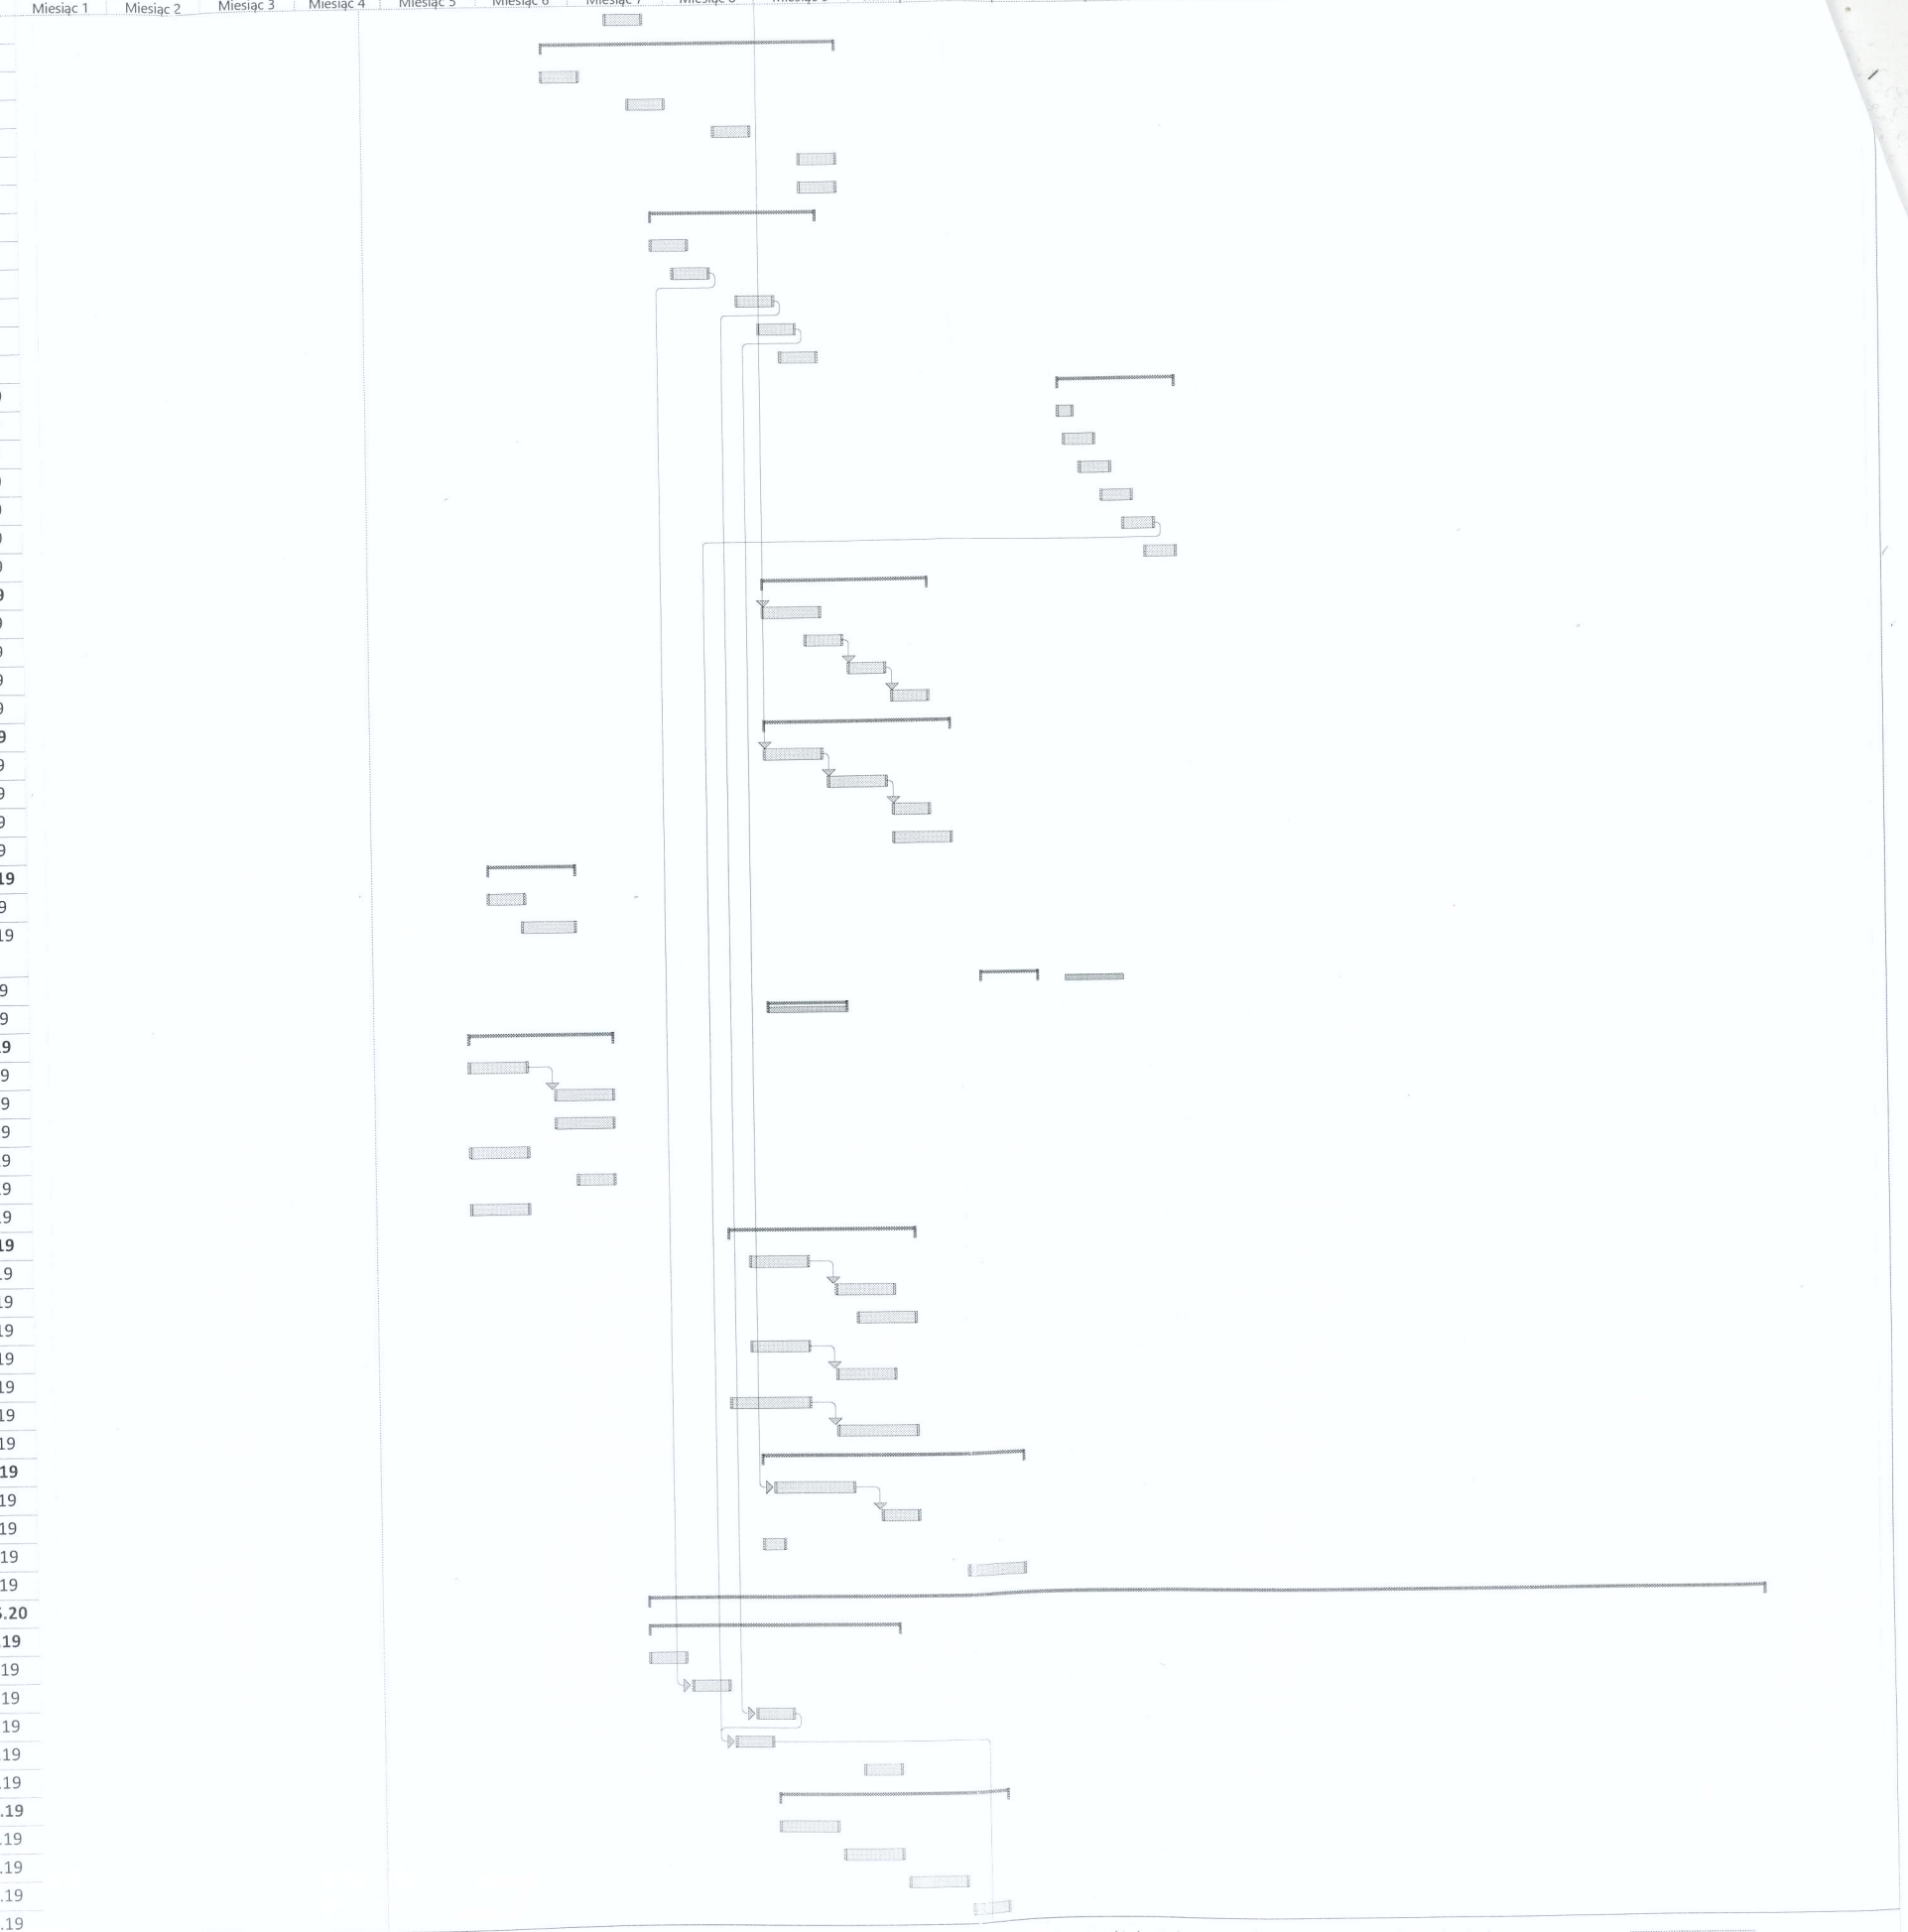

Projekt: Etap II - NETTO

Zadanie · Podział · Punkt kontrolny · Podsumowanie · Podsumowanie projektu · Zadanie nieaktywne · Nieaktywny punkt kontrolny · Podsumowanie nieaktywne · Zadanie ręczne · Tylko z czasem trwania · Rzutowanie podsumowania ręcznego · Podsumowanie ręczne · Tylko z rozpoczęciem · Tylko z zakończeniem · Zadania zewnętrzne · Zewnętrzne punkty kontrolne · Termin ostateczny · Postęp · Ręczne (postęp)

do użytku medycznych

	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
	Licowanie ścian płytkami gresowymi - Nadbudowa B	58 623,34 zł	pon, 02.09.19	pią, 13.09.19
	Posadzki cementowe	**445 633,65 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 04.10.19**
140	Poziom -1	18 450,00 zł	pon, 01.07.19	pią, 05.07.19
141	Poziom 0	56 112,60 zł	pon, 08.07.19	śro, 17.07.19
142	Poziom 1	56 112,60 zł	pon, 29.07.19	śro, 07.08.19
143	Poziom 2	56 112,60 zł	pon, 12.08.19	śro, 21.08.19
144	Poziom 3	56 112,67 zł	pon, 26.08.19	śro, 04.09.19
145	Podłoga techniczna Nadbudowy B	202 733,18 zł	pon, 09.09.19	pią, 04.10.19
146	**ŚCIANKI DZIAŁOWE W TECHNOLOGIACH SUCHYCH**	**238 497,33 zł**	**pon, 22.07.19**	**sob, 30.11.19**
147	Poziom 0	47 699,46 zł	pon, 22.07.19	pon, 16.09.19
148	Poziom 1	47 699,46 zł	pon, 16.09.19	śro, 30.10.19
149	Poziom 2	47 699,46 zł	pon, 16.09.19	śro, 30.10.19
150	Poziom 3	47 699,46 zł	śro, 30.10.19	sob, 30.11.19
151	Poziom Nadbudowa B	47 699,49 zł	śro, 30.10.19	sob, 30.11.19
152	**ROBOTY MALARSKIE**	**403 014,63 zł**	**pon, 02.03.20**	**wto, 19.05.20**
153	Poziom 0	80 602,95 zł	pon, 02.03.20	pią, 20.03.20
154	Poziom 1	80 602,92 zł	pon, 09.03.20	wto, 05.05.20
155	Poziom 2	80 602,92 zł	pon, 16.03.20	wto, 12.05.20
156	Poziom 3	80 602,92 zł	pon, 23.03.20	wto, 19.05.20
157	Poziom Nadbudowa B	80 602,92 zł	pon, 23.03.20	wto, 19.05.20
158	**POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH**	**220 915,43 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 15.11.19**
159	Poziom -1	15 498,00 zł	pon, 05.08.19	pią, 09.08.19
160	Poziom 0	41 082,00 zł	pon, 19.08.19	pią, 06.09.19
161	Poziom 1	41 082,00 zł	pon, 16.09.19	pią, 04.10.19
162	Poziom 2	41 082,00 zł	pon, 30.09.19	pią, 18.10.19
163	Poziom 3	41 082,00 zł	pon, 28.10.19	pią, 08.11.19
164	Poziom Nadbudowa B	41 089,43 zł	pon, 04.11.19	pią, 15.11.19
165	**POSADZKI Z WYKŁADZINY PCV**	**271 538,98 zł**	**pon, 21.10.19**	**pią, 29.11.19**
166	Poziom 0	54 307,78 zł	pon, 21.10.19	pią, 01.11.19
167	Poziom 1	54 307,80 zł	pon, 04.11.19	pią, 15.11.19
168	Poziom 2	54 307,80 zł	pon, 04.11.19	pią, 15.11.19
169	Poziom 3	54 307,80 zł	pon, 04.11.19	pią, 15.11.19
170	Poziom Nadbudowa B	54 307,80 zł	pon, 18.11.19	pią, 29.11.19
171	**SUFITY PODWIESZANE**	**658 249,71 zł**	**pon, 04.11.19**	**pią, 29.11.19**
172	Poziom 0	131 649,94 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
173	Poziom 1	131 649,94 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
174	Poziom 2	131 649,94 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
175	Poziom 3	131 649,94 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
176	Poziom Nadbudowa B	131 649,95 zł	pon, 04.11.19	pią, 29.11.19
177	**INNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE**	**357 815,98 zł**	**pon, 09.09.19**	**pią, 24.04.20**
178	Parapety wew.	40 481,69 zł	pon, 09.09.19	pią, 04.10.19
179	Balustrady wewnętrzne KS-1	157 937,94 zł	pon, 02.03.20	pią, 27.03.20
180	Wycieraczki do obuwia wewnętrzne	21 975,83 zł	pon, 30.03.20	pią, 24.04.20
181	Półki, lady i nakrywy wewnętrzne	93 858,29 zł	pon, 04.11.19	pią, 13.12.19
182	Obróbka ścian lacobelem	43 562,23 zł	pon, 04.11.19	pią, 22.11.19
183	**DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGÓW OSOBOWYCH**	**663 462,00 zł**	**pon, 16.09.19**	**pon, 25.11.19**
184	Dostawa i montaż windy o wymiarach kabiny 1500x2700x2300	370 166,04 zł	pon, 16.09.19	pon, 11.11.19
185	Dostawa i montaż windy o wymiarach kabiny 1500x2500x2300	293 295,96 zł	pon, 30.09.19	pon, 25.11.19
186	**ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU**	**657 196,39 zł**	**pon, 18.02.19**	**pią, 01.05.20**
187	**OGRODZENIE**	**215 974,16 zł**	**pon, 05.08.19**	**pon, 30.09.19**
188	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia	65 838,19 zł	pon, 18.02.19	pią, 29.03.19
189	Ściana żelbetowa - fundamnet ogrodzenia	116 108,93 zł	pon, 04.03.19	pią, 29.03.19
190	Ogrodzenie systemowe	34 027,04 zł	pon, 25.03.19	pią, 19.04.19
191	**DROGI I CHODNIKI**	**412 400,21 zł**	**pon, 02.09.19**	**pią, 08.11.19**
192	Korytowanie i roboty ziemne	27 822,60 zł	pon, 02.09.19	pią, 20.09.19
193	Podbudowa pod drogi i chodniki	111 299,23 zł	czw, 05.09.19	śro, 25.09.19
194	Krawężniki i obrzeża	23 483,16 zł	pon, 16.09.19	pią, 11.10.19
195	Nawierzchnie chodników i dziedzińca pomiędzy budynkami B i C	106 711,41 zł	pon, 30.09.19	pią, 08.11.19
196	Nawierzchnie dróg	143 083,81 zł	pon, 30.09.19	pią, 08.11.19
197	**Nasadzenia**	9 622,02 zł	pon, 13.04.20	pią, 01.05.20
198	**Mała architektura**	19 200,00 zł	pon, 02.03.20	pią, 20.03.20
199	**BRANŻA SANITARNIA**	**3 931 357,06 zł**	**śro, 05.12.18**	**pią, 03.04.20**
200	**WOD-KAN**	**290 658,56 zł**	**pon, 11.02.19**	**pią, 20.09.19**
201	kanalizacja podposadzkowa	43 050,00 zł	pon, 11.02.19	pią, 01.03.19
202	poziomy kanalizacji	62 730,00 zł	pon, 13.05.19	pią, 12.07.19
203	piony kanalizacji	71 340,00 zł	pon, 15.04.19	pią, 26.07.19
204	przewody wodociągowe	51 660,00 zł	pon, 06.05.19	pią, 05.07.19

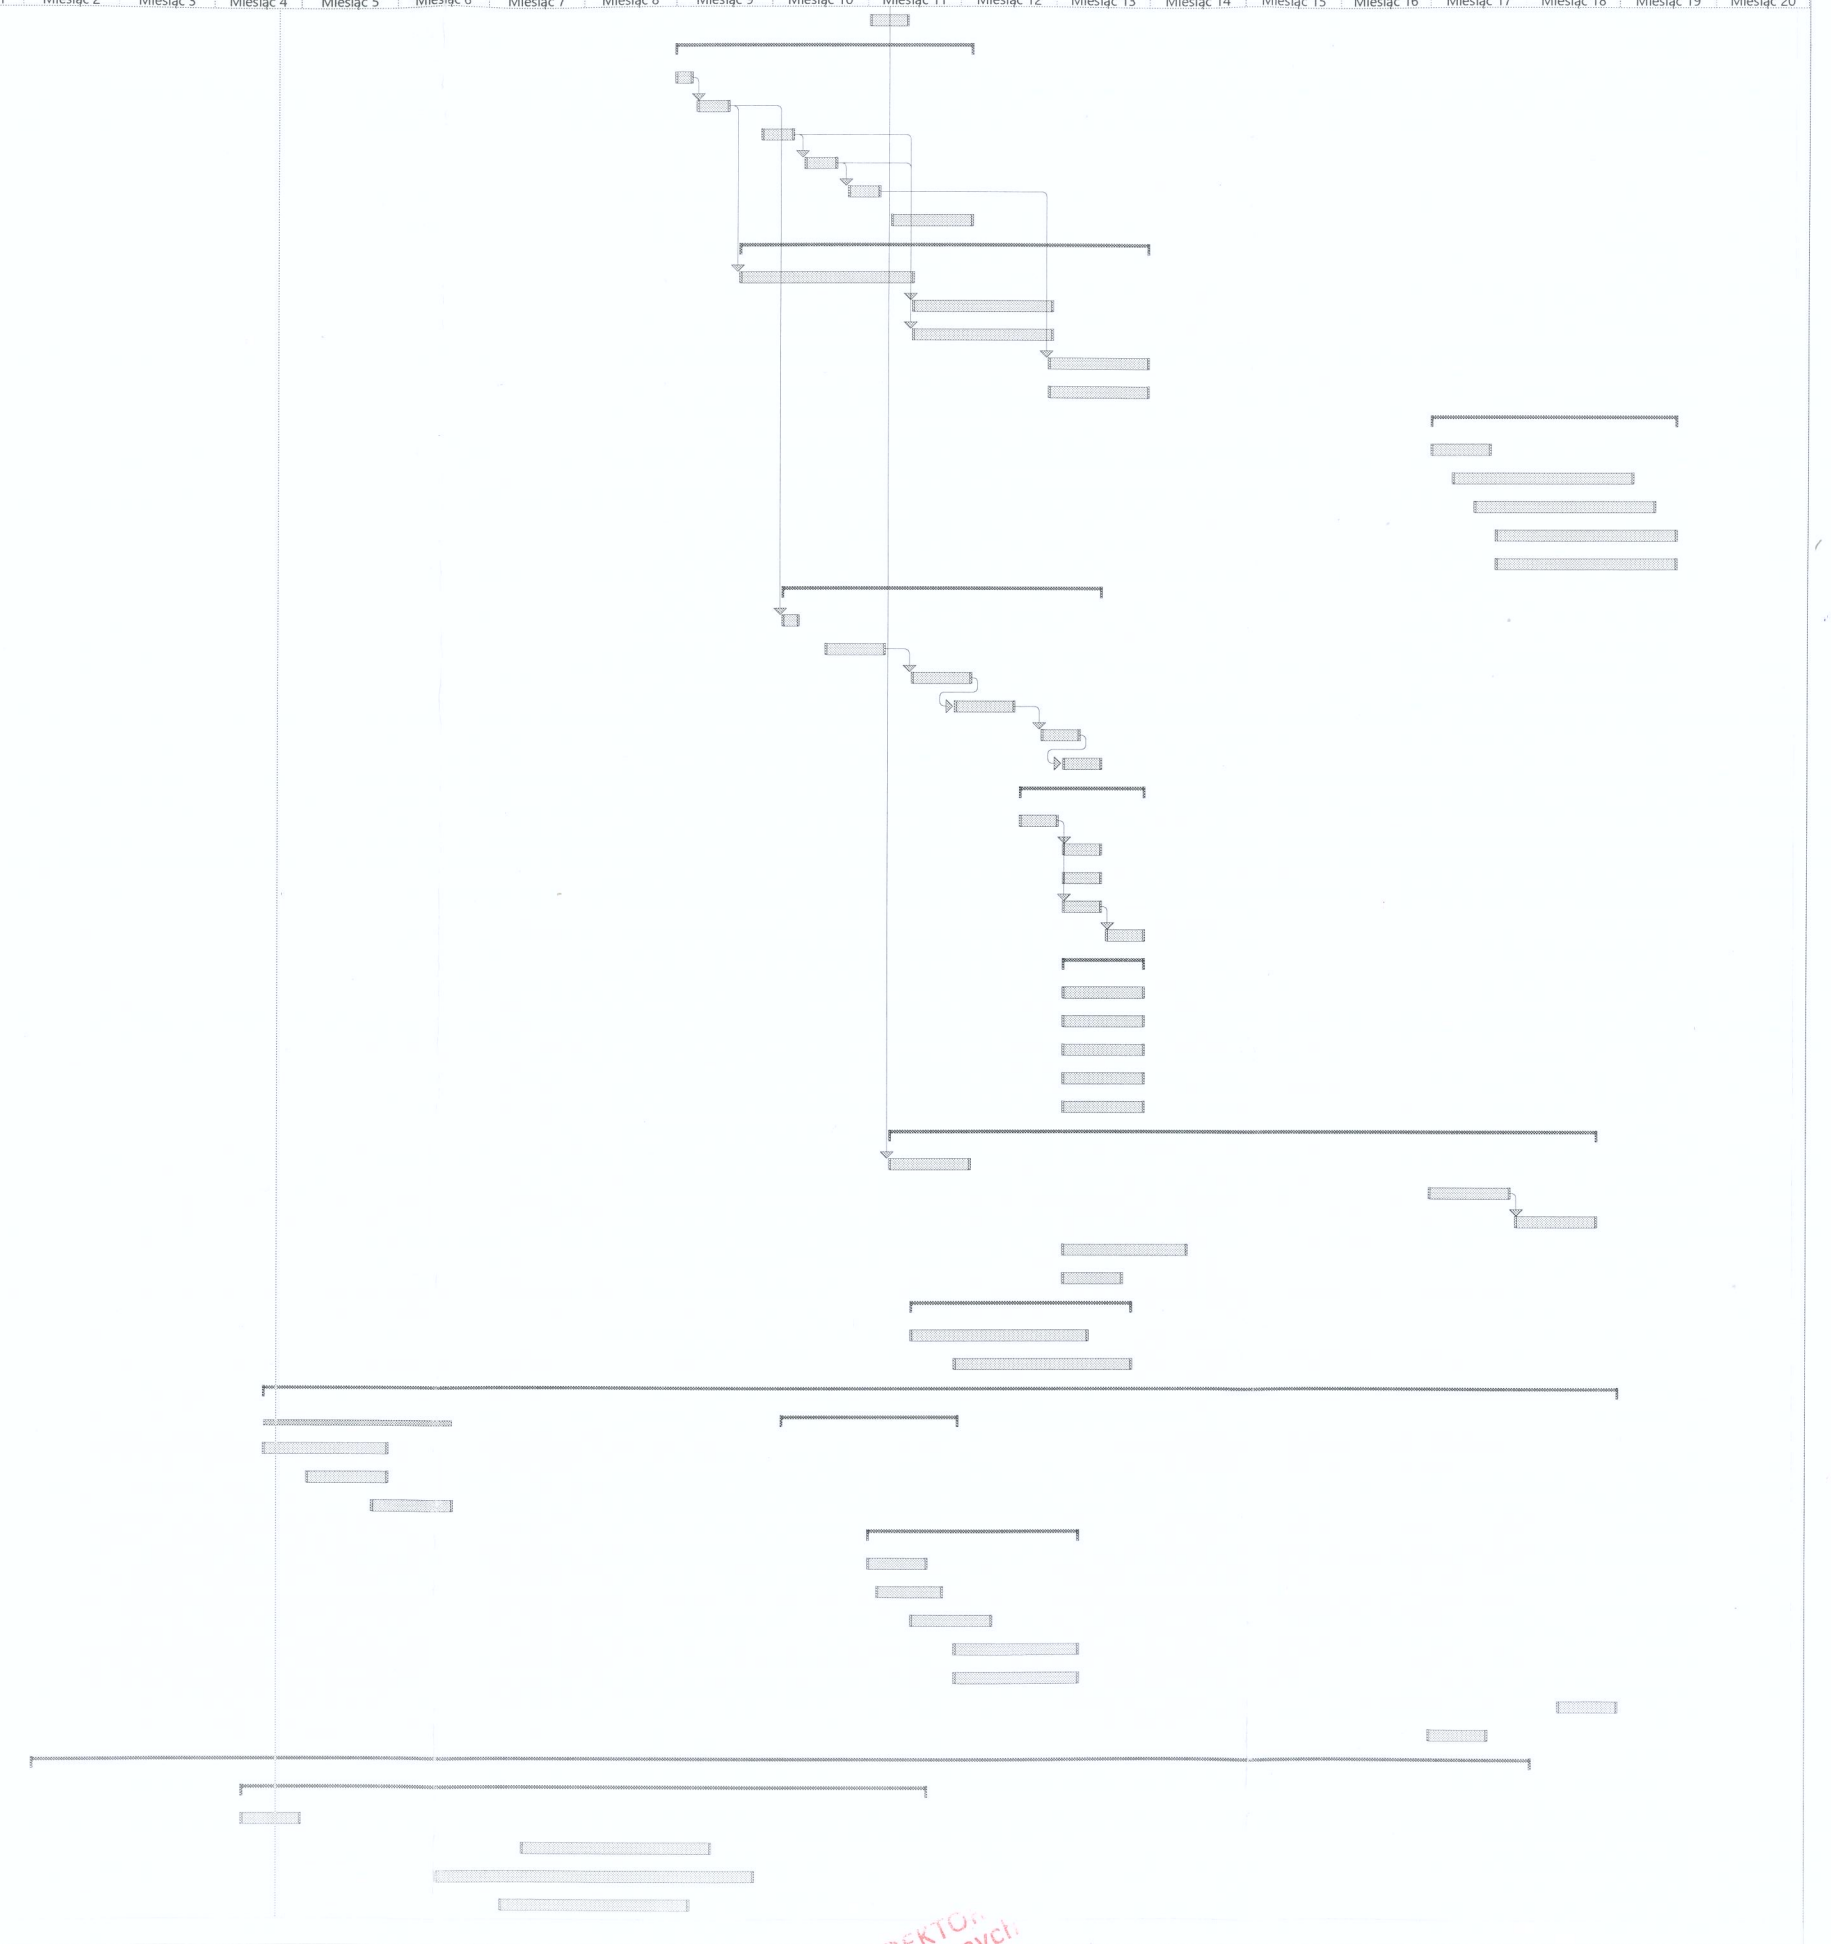

Projekt: Etap II - NETTO

Zadanie · Podział · Punkt kontrolny · Podsumowanie · Podsumowanie projektu · Zadanie nieaktywne · Nieaktywny punkt kontrolny · Podsumowanie nieaktywne · Zadanie ręczne · Tylko z czasem trwania · Rzutowanie podsumowania ręcznego · Podsumowanie ręczne · Tylko z rozpoczęciem · Tylko z zakończeniem · Zadania zewnętrzne · Zewnętrzne punkty kontrolne · Termin ostateczny · Postęp · Ręczne (postęp)

PROJEKTOWANIE mgr inż. Stanisław Gliszek

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
205	izolacje przewodów	18 450,00 zł	pon, 17.06.19	pią, 19.07.19
206	armatura	43 428,56 zł	pon, 22.07.19	pią, 20.09.19
207	Sprężone powietrze Budynek C	24 571,92 zł	pon, 02.09.19	pią, 11.10.19
209	Sprężone powietrze Budynek B	49 316,92 zł	pon, 09.09.19	pią, 18.10.19
211	**WENTYLACJA**	**1 994 613,07 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 03.04.20**
212	**Kanały wentylacyjne**	**902 957,86 zł**	**pon, 03.06.19**	**pią, 23.08.19**
213	Poziom 0	150 492,96 zł	pon, 03.06.19	pią, 14.06.19
214	Poziom 1	150 492,96 zł	pon, 17.06.19	pią, 28.06.19
215	Poziom 2	150 492,96 zł	pon, 01.07.19	pią, 12.07.19
216	Poziom 3	150 492,96 zł	pon, 15.07.19	pią, 26.07.19
217	Poziom Nadbudowa B	150 492,96 zł	pon, 29.07.19	pią, 09.08.19
218	Dach	150 493,06 zł	pon, 12.08.19	pią, 23.08.19
219	**Kratki wentylacyjne, anemostaty, klapy**	**124 703,80 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 03.04.20**
220	Poziom 0	24 940,76 zł	pon, 04.11.19	pią, 08.11.19
221	Poziom 1	24 940,76 zł	pon, 11.11.19	śro, 13.11.19
222	Poziom 2	24 940,76 zł	czw, 14.11.19	pon, 18.11.19
223	Poziom 3	24 940,76 zł	wto, 19.11.19	pią, 22.11.19
224	Poziom Nadbudowa B	24 940,76 zł	pon, 25.11.19	czw, 28.11.19
225	**Montaż urządzeń na dachu**	**595 095,43 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 03.04.20**
226	Montaż centrali wentylacyjnej N1/W1	24 547,21 zł	pon, 29.07.19	pią, 23.08.19
227	Montaż centrali wentylacyjnej N2/W2	35 079,07 zł	pon, 29.07.19	pią, 23.08.19
228	Montaż centrali wentylacyjnej N3/W3	22 649,91 zł	pon, 29.07.19	pią, 23.08.19
229	Montaż centrali wentylacyjnej N4/W4	22 649,91 zł	pon, 29.07.19	pią, 23.08.19
230	Montaż centrali wentylacyjnej N5/W5	24 257,97 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
231	Montaż centrali wentylacyjnej N6/W6	22 649,91 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
232	Montaż centrali wentylacyjnej N7/W7	23 910,50 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
233	Montaż centrali wentylacyjnej N8/W8	22 649,91 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
234	Montaż centrali wentylacyjnej N9/W9	27 900,21 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
235	Montaż centrali wentylacyjnej N10/W10	28 331,78 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
236	Montaż centrali wentylacyjnej N11/W11	27 816,17 zł	pon, 05.08.19	pią, 30.08.19
237	Montaż automatyki do central wentylacyjnych	117 072,79 zł	pon, 02.09.19	pią, 20.09.19
238	Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod cenrtale wentylacyjne i agregaty chłodnicze	22 150,09 zł	pon, 15.07.19	pią, 19.07.19
239	Wentylatory dachowe	130 380,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 06.09.19
240	Tłumiki	43 050,00 zł	pon, 12.08.19	pią, 06.09.19
241	**Izolacja**	**371 855,98 zł**	**pon, 29.07.19**	**pią, 06.09.19**
242	Poziom 0	61 975,99 zł	pon, 29.07.19	pią, 02.08.19
243	Poziom 1	61 975,99 zł	pon, 05.08.19	pią, 09.08.19
244	Poziom 2	61 975,99 zł	pon, 12.08.19	pią, 16.08.19
245	Poziom 3	61 975,99 zł	pon, 19.08.19	pią, 23.08.19
246	Poziom Nadbudowa B	61 975,99 zł	pon, 26.08.19	pią, 30.08.19
247	Dach	61 976,03 zł	pon, 02.09.19	pią, 06.09.19
248	**OGRZEWANIE I WĘZEŁ CIEPLNY**	**530 381,31 zł**	**pon, 13.05.19**	**pią, 06.12.19**
249	**Instalacja c.o.**	**277 262,22 zł**	**pon, 13.05.19**	**pią, 08.11.19**
250	Rurociągi - Poziom 0	38 130,00 zł	pon, 13.05.19	pią, 24.05.19
251	Rurociągi - Poziom 1	38 130,00 zł	pon, 27.05.19	pią, 07.06.19
252	Rurociągi - Poziom 2	38 130,00 zł	pon, 10.06.19	pią, 21.06.19
253	Rurociągi - Poziom 3	38 130,00 zł	pon, 24.06.19	pią, 05.07.19
254	Rurociągi - Nadbudowa B	41 820,00 zł	pon, 08.07.19	pią, 19.07.19
255	armatura	15 589,18 zł	pon, 09.09.19	pią, 04.10.19
256	izolacje	22 140,00 zł	pon, 07.10.19	pią, 25.10.19
257	grzejniki	45 193,04 zł	pon, 21.10.19	pią, 08.11.19
258	**Instalacja gazu**	**7 803,78 zł**	**pon, 15.07.19**	**pią, 02.08.19**
260	**Instalacja c.t.**	**36 553,61 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 27.09.19**
262	**Wymienikownia**	**182 930,42 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 06.12.19**
264	**Pomieszczenie techniczne**	**25 831,28 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 06.12.19**
266	**KLIMATYZACJA**	**751 463,40 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 06.03.20**
267	**Klimatyzacja i woda lodowa - Budynek C**	**334 642,26 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 21.02.20**
268	Ułożenie instalacji - rury	42 517,53 zł	pon, 01.07.19	pią, 23.08.19
269	Armatura	79 800,64 zł	pon, 26.08.19	pią, 24.01.20
270	Montaż jednostek klimatyzatorów	22 211,34 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
271	Agregat chłodniczy zewnętrzny	171 076,96 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
272	Urochomienie systemu chłodniczego wraz z wykonaniem próby i napełnieniem systemu czynnikiem chłodniczym	19 035,79 zł	pon, 17.02.20	pią, 21.02.20
273	**Klimatyzacja i woda lodowa - Budynek B**	**416 821,14 zł**	**pon, 01.07.19**	**pią, 06.03.20**
274	Ułożenie instalacji - rury	48 960,58 zł	pon, 01.07.19	pią, 23.08.19
275	Armatura	27 138,52 zł	pon, 26.08.19	pią, 24.01.20
276	Izolacje	41 163,89 zł	pon, 27.01.20	pią, 06.03.20

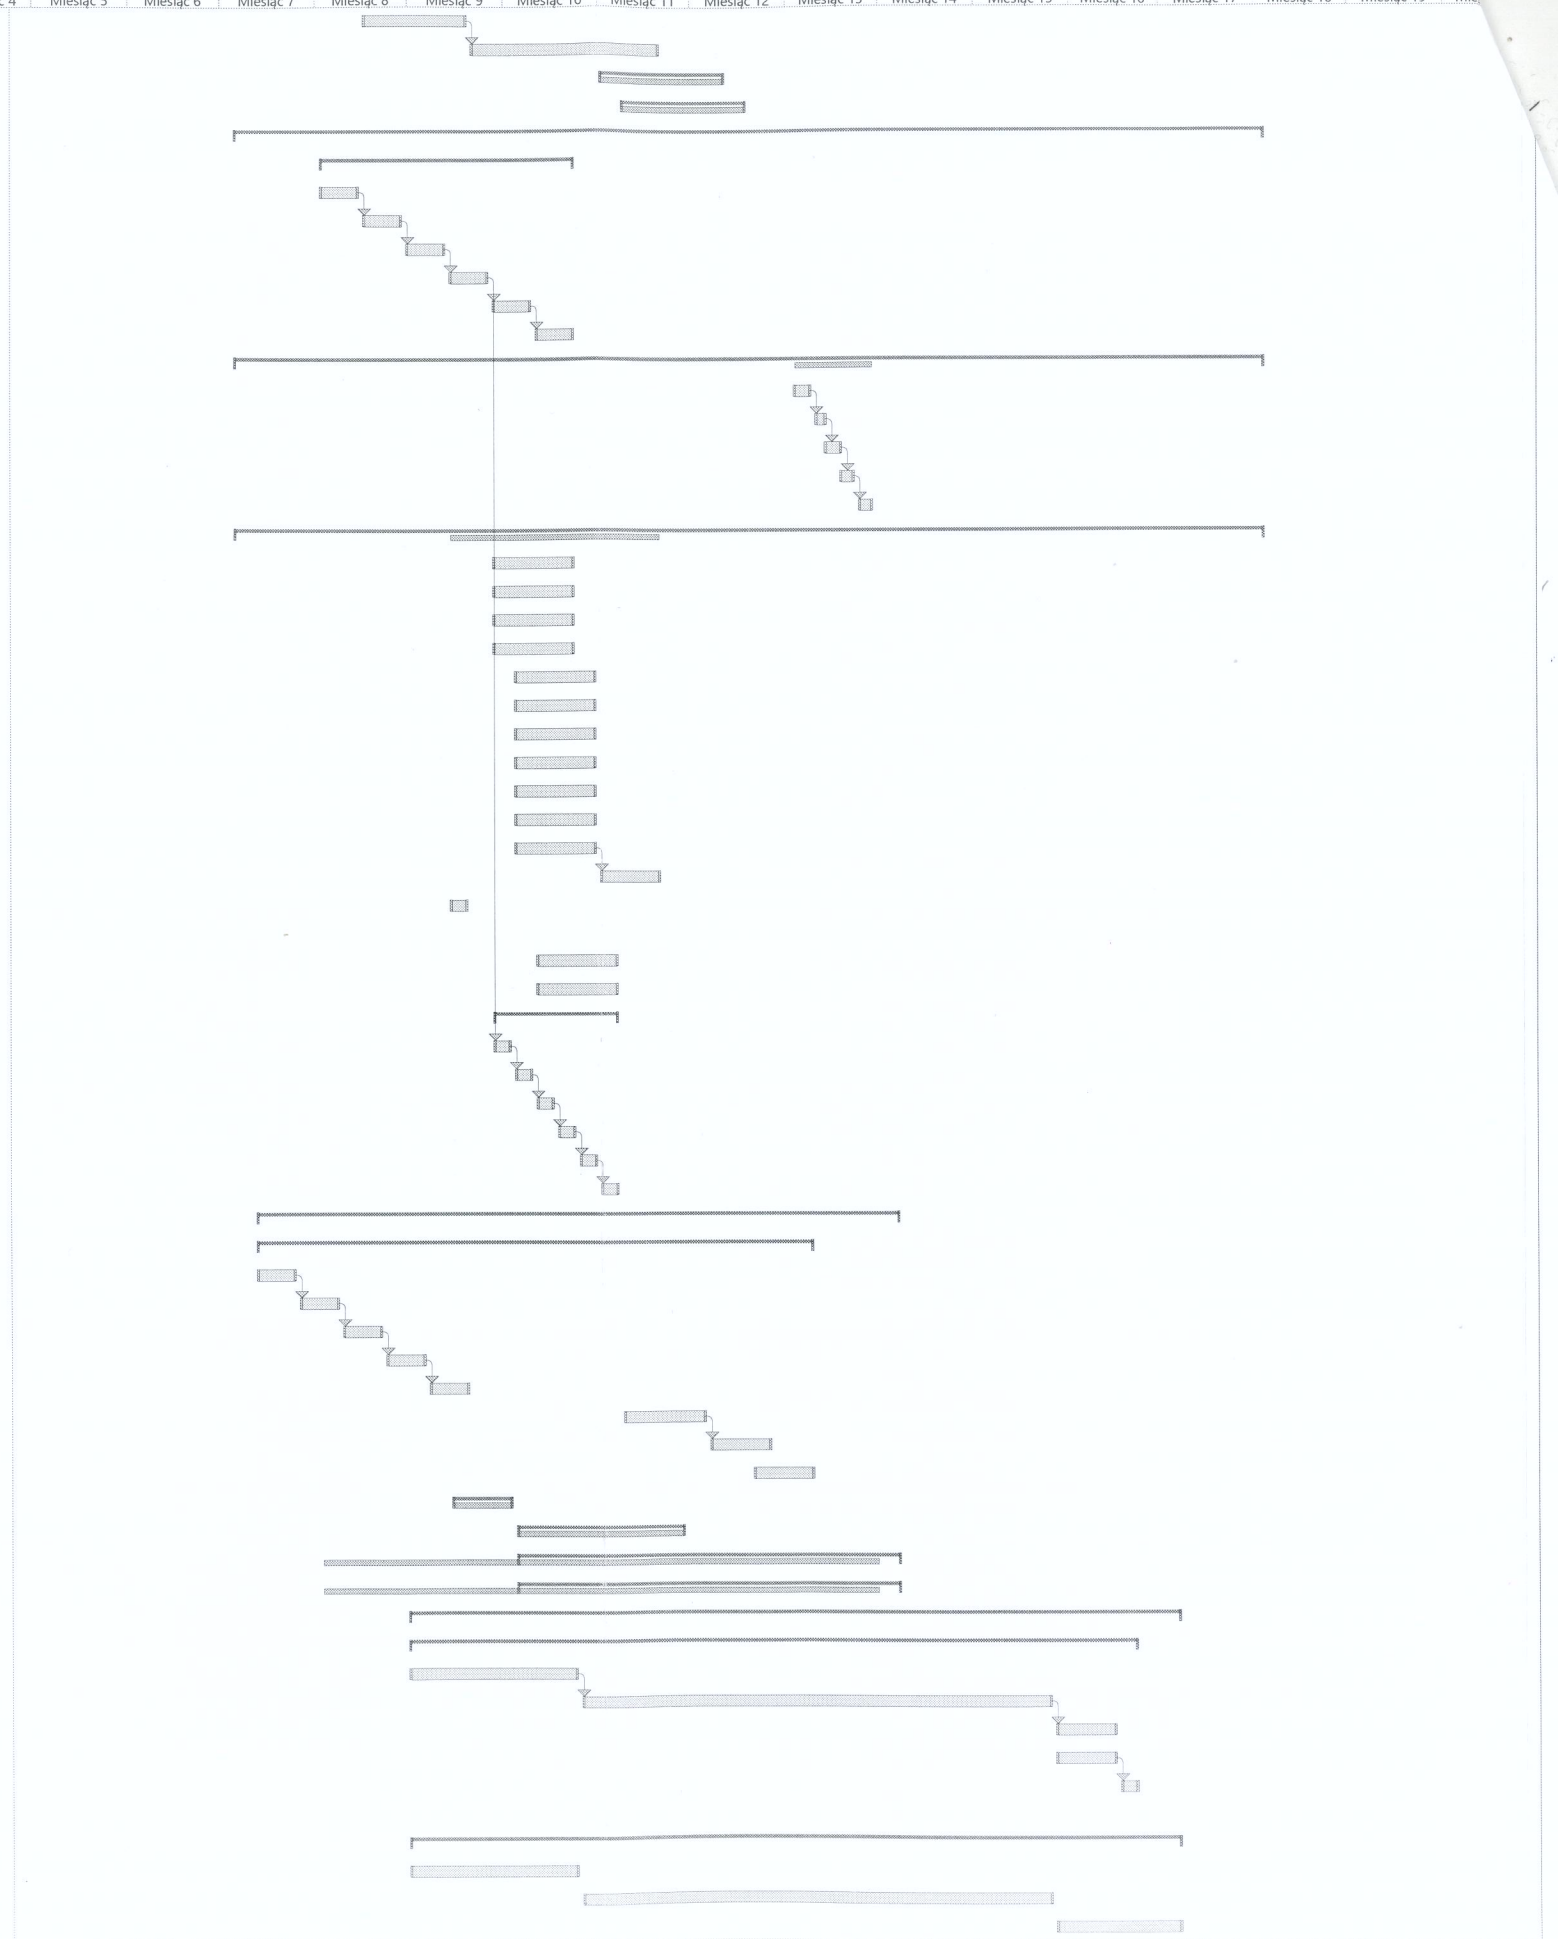

PROJEKTOR ds. medycznych prof.zw.dr hab.n.med. Stanisław Głuszek

	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
	Montaż jednostek klimatyzatorów	18 277,68 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
	Dostawa klimakonwektorów	105 366,84 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
9	Agregat chłodniczy zewnętrzny agregat wody lodowej z freecoolingiem [182kW] lub równoważne	156 877,84 zł	pon, 27.01.20	pią, 14.02.20
280	Urochomienie systemu chłodniczego wraz z wykonaniem próby i napełnieniem systemu czynnikiem chłodniczym	19 035,79 zł	pon, 17.02.20	pią, 28.02.20
281	**INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE**	**219 790,22 zł**	**śro, 05.12.18**	**czw, 17.01.19**
282	**Kanalizacja deszczowa**	**184 378,94 zł**	**śro, 05.12.18**	**czw, 27.12.18**
283	Wykopy	99 197,28 zł	śro, 05.12.18	wto, 25.12.18
284	Zasypanie wykopów	8 925,89 zł	pią, 07.12.18	czw, 27.12.18
285	Studnie	52 751,77 zł	pon, 10.12.18	śro, 26.12.18
286	Rurociągi	23 504,00 zł	śro, 05.12.18	wto, 25.12.18
287	**Kanalizacja sanitarna**	23 254,64 zł	**pią, 28.12.18**	**pon, 07.01.19**
289	**Wodociąg zew.**	12 156,64 zł	**wto, 08.01.19**	**czw, 17.01.19**
291	**PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO**	70 561,66 zł	**pon, 07.01.19**	**pią, 18.01.19**
293	**BRANŻA ELEKTRYCZNA**	**3 267 112,40 zł**	**pon, 03.12.18**	**pią, 10.04.20**
294	**WLZ do budynku + WPOŻ + BK**	**319 317,93 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 04.10.19**
295	Ułożenie kabli w wykopie wraz z zasypką	94 347,01 zł	pon, 04.03.19	pią, 29.03.19
296	Montaż skrzynek i rozdzielnic	43 198,53 zł	pon, 18.03.19	pią, 29.03.19
297	Montaż agregatów spalinowo-elektrycznych trójfazowych o mocy do 300kVA	181 772,39 zł	pon, 09.09.19	pią, 04.10.19
298	**Rozdzielnica główna RG**	77 156,53 zł	**pon, 02.09.19**	**pią, 11.10.19**
300	**Tablice bezpiecznikowe lokalne i UPS**	**222 533,83 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
301	Poziom 0	44 506,79 zł	pon, 03.06.19	pią, 21.06.19
302	Poziom 1	44 506,76 zł	pon, 03.06.19	pią, 21.06.19
303	Poziom 2	44 506,76 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
304	Poziom 3	44 506,76 zł	pon, 24.06.19	pią, 12.07.19
305	Poziom Nadbudowa B	44 506,76 zł	pon, 04.03.19	pią, 28.02.20
306	**Oświetlenie zewnętrzne terenu**	**116 615,06 zł**	**pon, 06.05.19**	**pią, 25.10.19**
307	Układanie okablowania	18 726,93 zł	pon, 06.05.19	pią, 31.05.19
308	Montaż latarń oświetleniowych	36 431,28 zł	pon, 14.10.19	pią, 25.10.19
309	Montaż opraw zewnętrznych w murkach i chodnikach	61 456,85 zł	pon, 14.10.19	pią, 25.10.19
310	**Instalacja oświetleniowa**	**742 969,61 zł**	**pon, 08.04.19**	**pią, 13.12.19**
311	Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 0	19 641,44 zł	pon, 08.04.19	pią, 19.04.19
312	Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 1	19 641,44 zł	pon, 22.04.19	wto, 07.05.19
313	Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 2	19 641,44 zł	śro, 08.05.19	czw, 23.05.19
314	Bruzdowanie i układanie przewodów Poziom 3	19 641,44 zł	pią, 24.05.19	pon, 10.06.19
315	Bruzdowanie i układanie przewodów Nadbudowa B	19 641,46 zł	wto, 11.06.19	pon, 24.06.19
316	Rozdzielnice	52 311,67 zł	wto, 25.06.19	pon, 22.07.19
317	Montaż opraw oświetleniowych Poziom 0	118 490,14 zł	pon, 11.11.19	pią, 15.11.19
318	Montaż opraw oświetleniowych Poziom 1	118 490,14 zł	pon, 18.11.19	pią, 22.11.19
319	Montaż opraw oświetleniowych Poziom 2	118 490,14 zł	pon, 25.11.19	pią, 29.11.19
320	Montaż opraw oświetleniowych Poziom 3	118 490,14 zł	pon, 02.12.19	pią, 06.12.19
321	Montaż opraw oświetleniowych Nadbudowa B	118 490,16 zł	pon, 09.12.19	pią, 13.12.19
322	**Trasy kablowe - koryta metalowe**	**58 768,50 zł**	**pon, 08.04.19**	**pon, 24.06.19**
323	Poziom 0	11 753,70 zł	pon, 08.04.19	pią, 19.04.19
324	Poziom 1	11 753,70 zł	pon, 22.04.19	wto, 07.05.19
325	Poziom 2	11 753,70 zł	śro, 08.05.19	czw, 23.05.19
326	Poziom 3	11 753,70 zł	pią, 24.05.19	pon, 10.06.19
327	Nadbudowa B	11 753,70 zł	wto, 11.06.19	pon, 24.06.19
328	**Instalacja siły + WLZ tablic lokalnych**	**334 738,69 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
329	Poziom 0	66 947,74 zł	pon, 08.04.19	pią, 19.04.19
330	Poziom 1	66 947,74 zł	pon, 22.04.19	wto, 07.05.19
331	Poziom 2	66 947,74 zł	śro, 08.05.19	czw, 23.05.19
332	Poziom 3	66 947,74 zł	pią, 24.05.19	pon, 10.06.19
333	Nadbudowa B	66 947,73 zł	wto, 11.06.19	pon, 24.06.19
334	**Instalacja okablowania strukturalnego - rozbudowa i nadbudowa**	**712 613,22 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
335	Poziom 0	126 056,01 zł	pon, 08.04.19	pią, 19.04.19
336	Poziom 1	126 056,02 zł	pon, 22.04.19	wto, 07.05.19
337	Poziom 2	126 056,02 zł	śro, 08.05.19	czw, 23.05.19
338	Poziom 3	126 056,02 zł	pią, 24.05.19	pon, 10.06.19
339	Nadbudowa B	126 056,02 zł	wto, 11.06.19	pon, 24.06.19
340	Uruchomienie , konserwacja całości systemu	82 333,13 zł	wto, 25.06.19	pon, 05.08.19
341	**Instalacja okablowania strukturalnego - przebudowa skrzydła A i B**	**192 012,56 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
342	Skrzydło A	96 006,28 zł	pon, 07.01.19	pią, 01.02.19
343	Skrzydło B	96 006,28 zł	pon, 07.01.19	pią, 15.02.19
344	**Instalacja monitoringu CCTV - Alarmu - okablowanie**	**89 535,90 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
345	Poziom 0	17 907,18 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
346	Poziom 1	17 907,18 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19

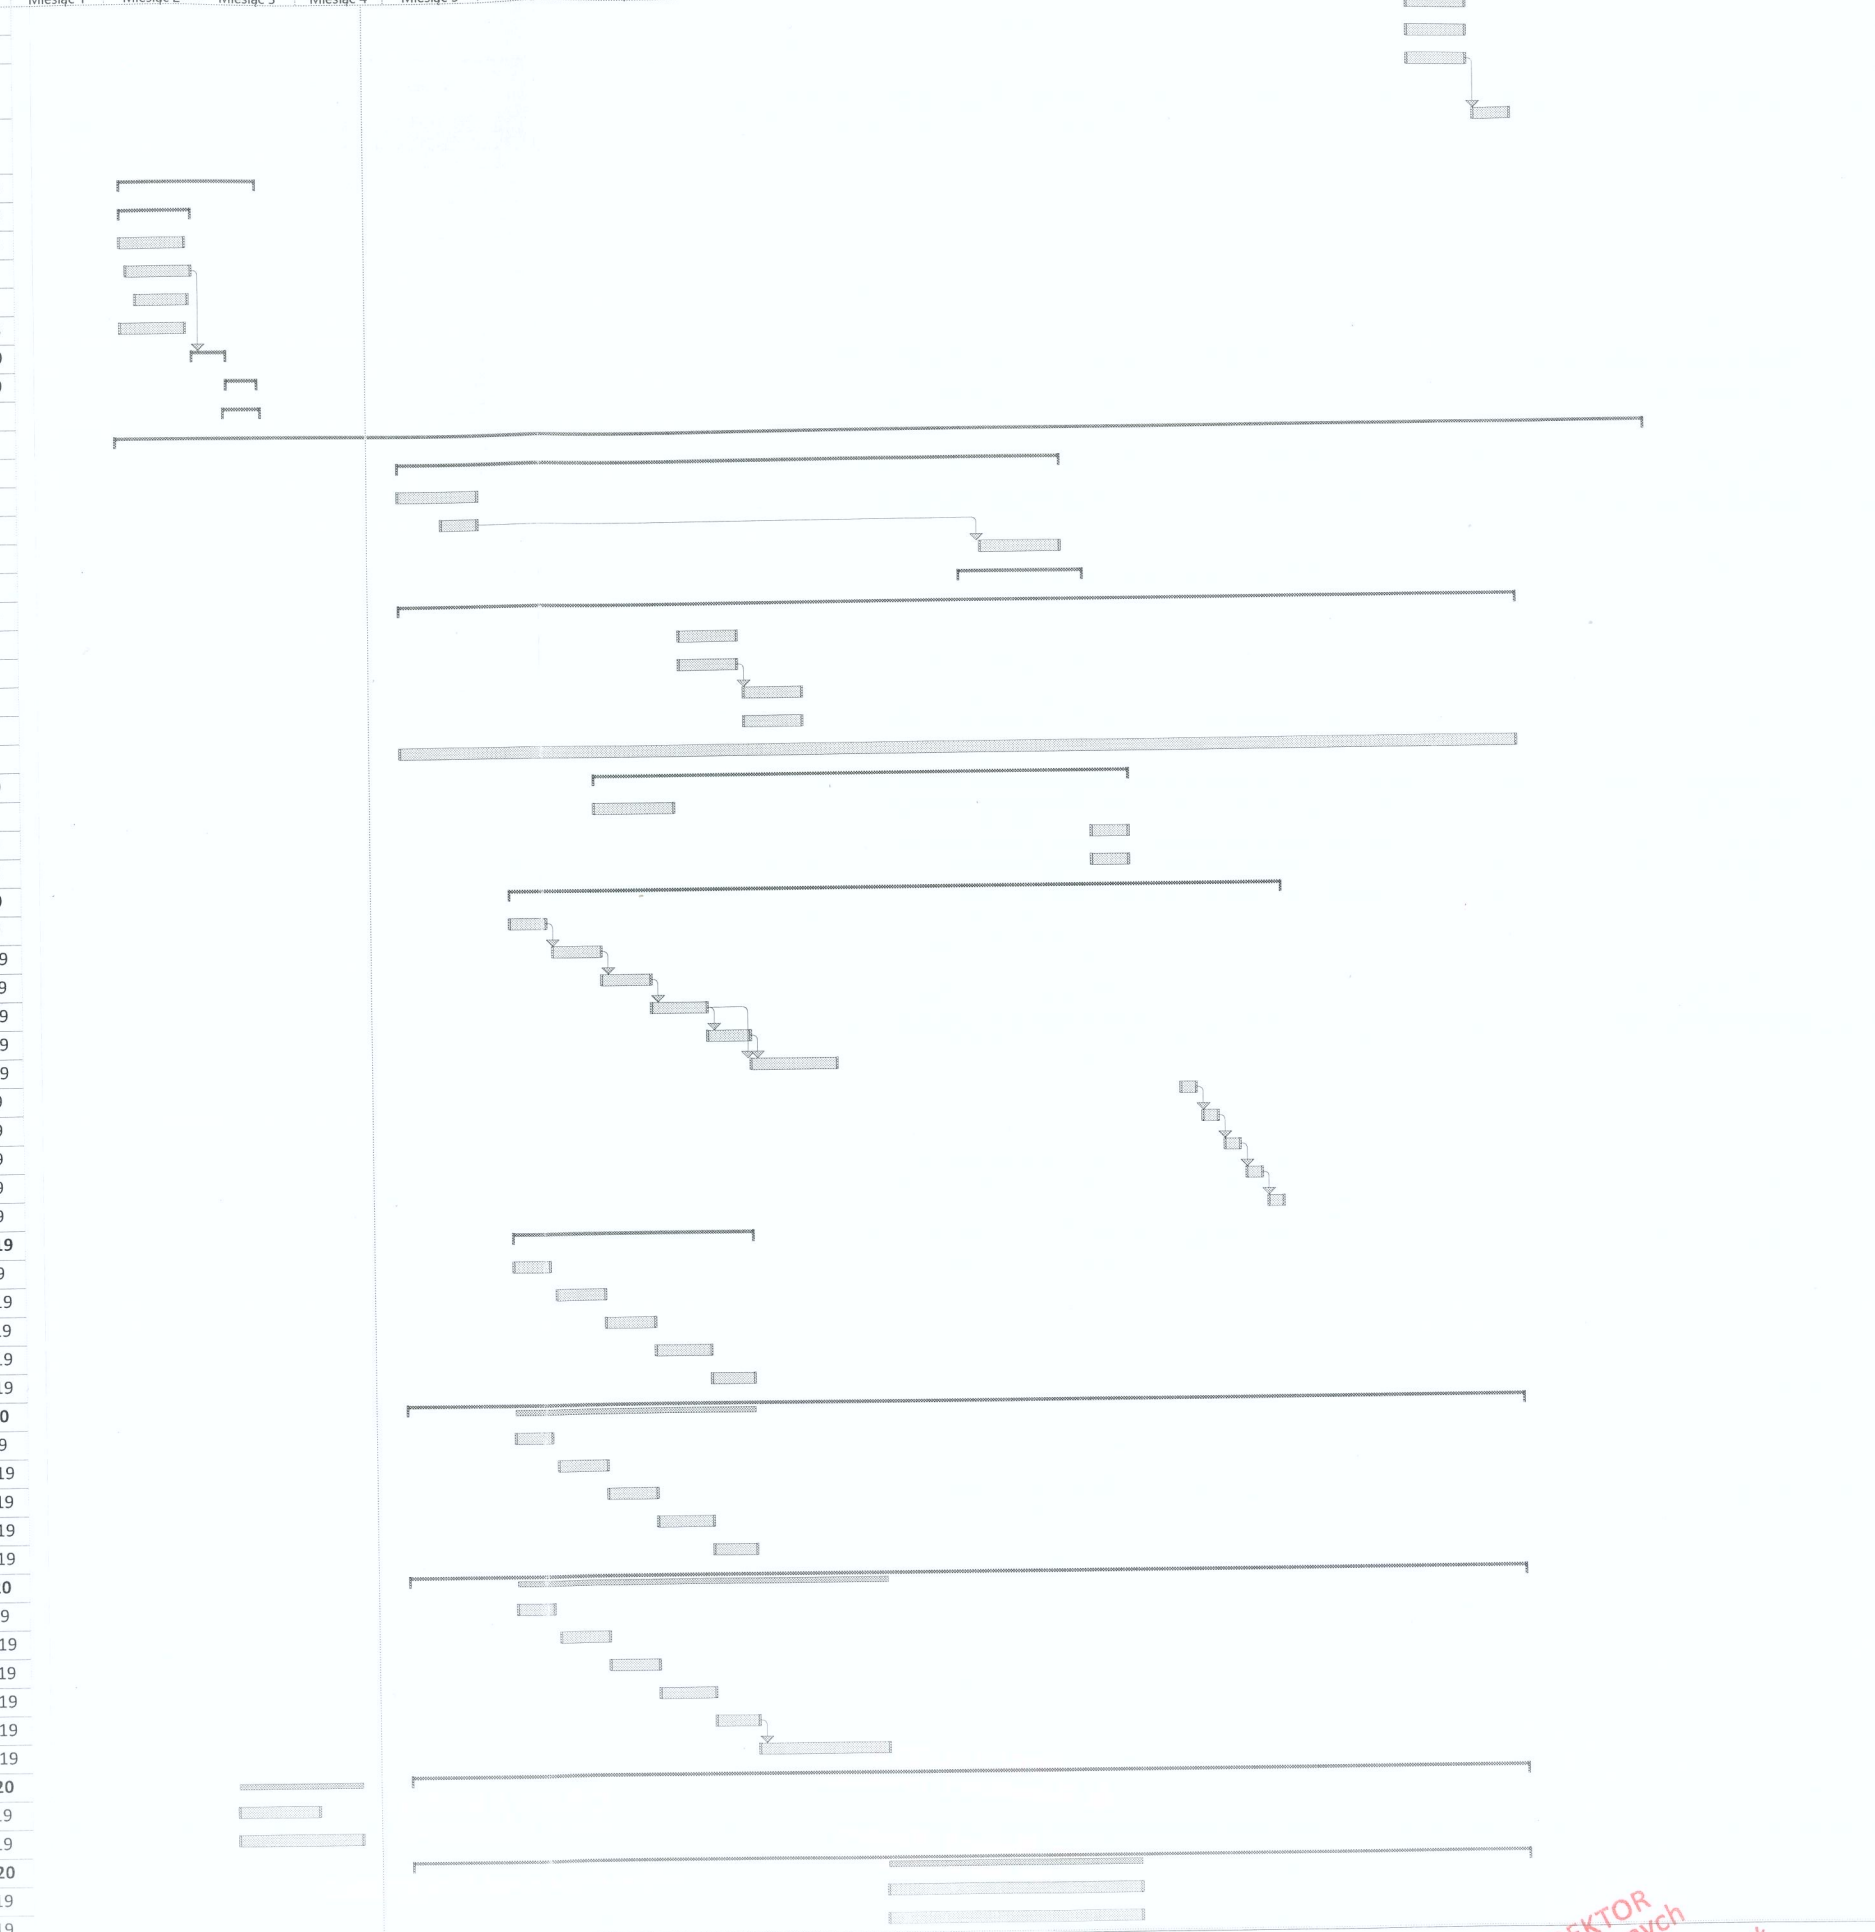

PROREKTOR ds. medycznych dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Id.	Nazwa zadania	Koszt	Rozpoczęcie	Zakończenie
347	Poziom 2	17 907,18 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
348	Poziom 3	17 907,18 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
349	Nadbudowa B	17 907,18 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
350	**Instalacja monitoringu CCTV - Alarmu - urządzenia**	**222 333,49 zł**	**pon, 05.08.19**	**pią, 25.10.19**
351	Poziom 0	44 466,69 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
352	Poziom 1	44 466,70 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
353	Poziom 2	44 466,70 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
354	Poziom 3	44 466,70 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
355	Nadbudowa B	44 466,70 zł	pon, 05.08.19	pią, 25.10.19
356	**Oddymianie klatek schodowych - rozbudowa i nadbudowa**	**71 928,06 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
357	Skrzydło C	35 964,03 zł	pon, 02.09.19	pią, 22.11.19
358	Skrzydło B Nadbudowa	35 964,03 zł	pon, 02.09.19	pią, 22.11.19
359	**Oddymianie klatek schodowych - przebudowa skrzydła A i B**	11 689,40 zł	**pon, 04.03.19**	**pią, 03.05.19**
361	**Instalacja odgromowa**	**56 914,24 zł**	**pon, 04.03.19**	**pią, 28.02.20**
362	Zwody poziome fundamentów	10 569,40 zł	pon, 17.12.18	pią, 15.02.19
363	Zwody pionowe	22 021,17 zł	pon, 18.02.19	pią, 14.06.19
364	Instalacja odgromowa na dachu	9 605,24 zł	pon, 19.08.19	pią, 06.09.19
365	Montaż iglic odgromowych	14 718,43 zł	pon, 09.09.19	pią, 20.09.19
366	**Instalacja przyzywowa**	10 341,79 zł	**pon, 07.10.19**	**pią, 01.11.19**
368	**Pomiary**	18 825,42 zł	**pon, 23.03.20**	**pią, 10.04.20**
370	**Przebudowa podziemnej linii optotelekomunikacyjnej Politechniki Świętokrzyskiej**	8 818,17 zł	pon, 03.12.18	pią, 14.12.18
371	**WYPOSAŻENIE STAŁE**	**390 734,25 zł**	**pon, 23.03.20**	**pią, 26.06.20**
372	**1. BIAŁY MONTAŻ**	**201 289,83 zł**	**pon, 23.03.20**	**pią, 24.04.20**
373	Poziom 0	40 257,97 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
374	Poziom 1	40 257,97 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
375	Poziom 2	40 257,97 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
376	Poziom 3	40 257,97 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
377	Poziom Nadbudowa B	40 257,95 zł	pon, 23.03.20	pią, 24.04.20
378	**2. AKCESORIA SANITARNE - dozowniki, pojemniki**	127 122,89 zł	**pon, 06.04.20**	**pią, 08.05.20**
379	Poziom 0	25 424,58 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
380	Poziom 1	25 424,58 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
381	Poziom 2	25 424,58 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
382	Poziom 3	25 424,58 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
383	Poziom Nadbudowa B	25 424,57 zł	pon, 06.04.20	pią, 08.05.20
384	**3. WYPOSAŻENIE MEBLOWE**	33 951,53 zł	**pon, 06.04.20**	**pią, 26.06.20**
386	**4. ROLETY WEWNĘTRZNE**	28 370,00 zł	**pon, 04.05.20**	**pią, 19.06.20**

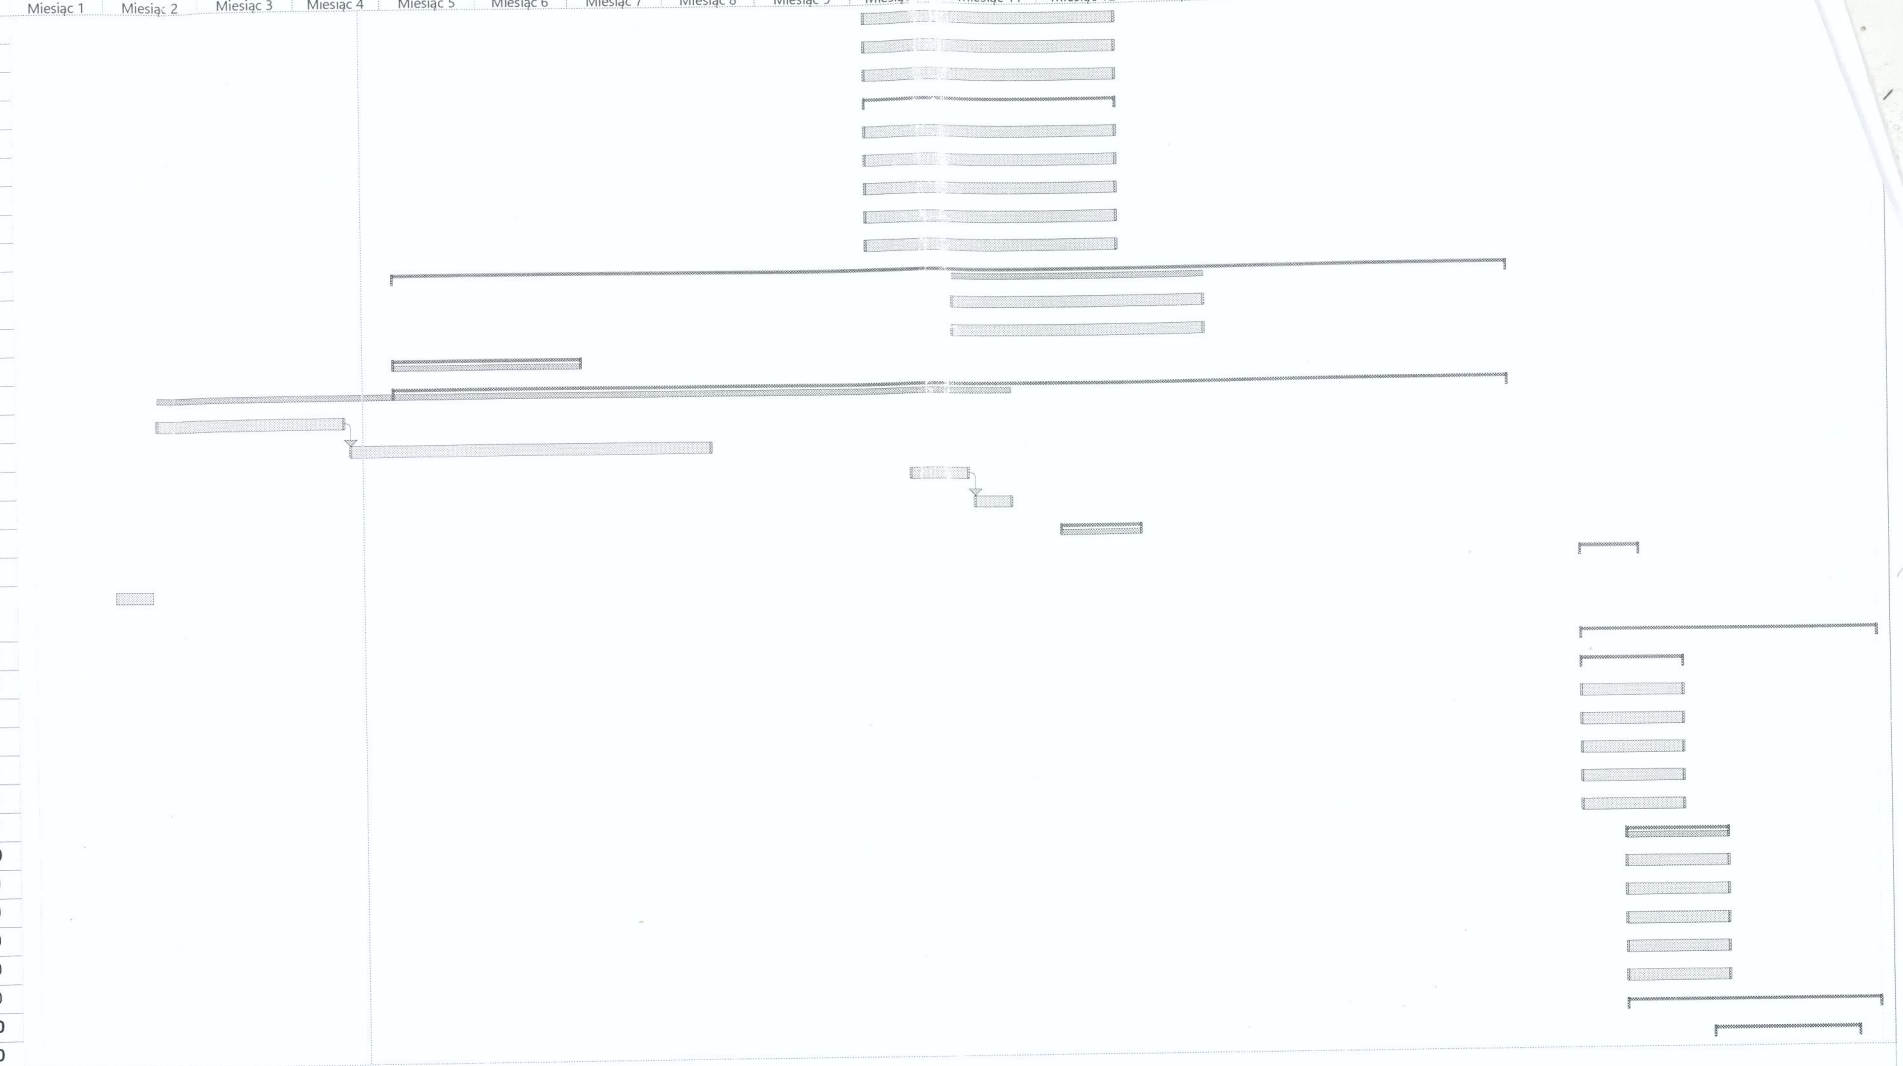

SPECJALISTA
ds. Remontów i Inwestycji
inż. Wojciech Kundera
upr. bud. KL-105/86

PROJEKTOR
ds. medycznych
prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
